PORTARIA Nº 6.905, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017.

Nomeia Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear as pessoas abaixo relacionadas, sob a presidência da primeira, para constituírem a **Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações** realizadas pelo Departamento de Compras, da Prefeitura Municipal de Capanema, para o período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

Roselia Kriger Becker Pagani
Roseli Strozak Marcon
Valdeci Alves dos Santos

Art. 2º Apresente portaria entrará em vigor na data de 01/01/2018, ficando nessa data revogada a Portaria nº 6.568/2017

Gabinete da Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 30 dias do mês de novembro de 2017.

Anérico Bellé
Prefeito Municipal

Pub. Jornal: [illegible]
Data: [illegible]
Edição [illegible] Página: [illegible]

Capanema - PR, 23 de julho de 2018

Assunto: Tomada de Preços

DE: Clésio Nowicki
PARA: Americo Bellé

Senhor Prefeito:

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente Autorização para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.

Justifica-se o presente certame para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.

Os valores máximos de cada item foram definidos através de Planilha Orçamentária confeccionada pelo Engenheiro Civil, e anexada a esse Projeto Básico.

O custo total máximo estimado para esta aquisição é de R$ 387.001,82(Trezentos e Oitenta e Sete Mil e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos).

Respeitosamente,

Clésio Nowicki
Secretário Municipal de Viação,
Obras e Serviços Urbanos

PROJETO BÁSICO

1. ORGÃO INTERESSADO

1.1. Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos.

2.OBJETO:

2.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO

3.RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

3.1.Clésio Nowicki - Secretário Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos

4.JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO

4.1.Justifica-se o presente certame para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.

4.2. Os valores máximos de cada item foram definidos através de Planilha Orçamentária confeccionada pelo Engenheiro Civil, e anexada a esse Projeto Básico.

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:

Item	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR	1,00	UN	387.001,82	387.001,82

Valor Total Máximo Estimado: R$ 387.001,82 (Trezentos e oitenta e sete mil, um real e oitenta e dois centavos)

6. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE ENTREGA DO OBJETO

6.1. A empresa vencedora terá o prazo de 6(seis)meses para execução da obra de EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, o período de vigência será de 12 (doze) meses.

6.2. O prazo de execução dos serviços terá início **10° (décimo) dia a partir da Ordem de Início da Obra, deverá respeitar o cronograma físico-financeiro previsto no projeto básico.**

7. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS

7.1. A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, será acompanhada, controlada, fiscalizada, gerenciada e avaliada por Rubens Luis Rolando Souza, Engenheiro Civil.

Capanema- PR, 23 de julho de 2018

Clésio Nowicki
Secretário Municipal de Viação,
Obras e Serviços Urbanos

Grau de Sigilo

#PÚBLICO

CONTRATO DE REPASSE Nº 856605/2017/MCIDADES/CAIXA

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO URBANO.

Por este Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas, têm, entre si, justo e acordado o Contrato de Repasse de recursos orçamentários da União, em conformidade com este Contrato de Repasse e com a seguinte regulamentação, Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e suas alterações, Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, e suas alterações, Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016, Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, Diretrizes Operacionais do Gestor do Programa para o exercício, Contrato de Prestação de Serviços (CPS) firmado entre o Gestor do Programa e a Caixa Econômica Federal e demais normas que regulamentam a espécie, as quais os contratantes se sujeitam, desde já, na forma ajustada a seguir:

SIGNATÁRIOS

I – CONTRATANTE – A União Federal, por intermédio do Gestor do Programa Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969 e constituída pelo Decreto nº 66.303, de 6 de março de 1970, regida pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.973, de 28 de março de 2013, publicado no DOU de 01/04/2013, e retificação publicada no DOU de 05/04/2013, e alterado pelo Decreto nº 8.199, de 26 de fevereiro de 2014, publicado no DOU de 27/02/2014, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasília-DF, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de Mandatária da União, nos termos dos instrumentos supracitados, neste ato representada por EZIO LUIZ LENA, RG nº 5.802.879-7, expedido por SSP/PR, CPF nº 500.032.590-72, residente e domiciliado em Cascavel - PR, conforme procuração lavrada em notas do 2º Ofício° do Tabelionato de Notas e Protesto de Brasília/DF, no livro 3260-P, fls 078/079, em 10/05/2017 e substabelecimento lavrado em notas do 4º Ofício do Tabelionato de Notas

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

de Cascavel/PR, no livro 26-S, fls 094/097, em 22/06/2017, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE.

II – CONTRATADO – MUNICÍPIO DE CAPANEMA, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo respectivo Prefeito Municipal, Senhor AMÉRICO BELLÉ, portador do RG nº 1.391.770 expedido por SSP/PR, e CPF nº 240.595.879-15, residente e domiciliado em Capanema - PR, doravante denominado simplesmente CONTRATADO.

CONDIÇÕES GERAIS

I - OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE
Pavimentação com Pedras Irregulares em Vias Publicas Urbanas.

II - MUNICÍPIO(S)BENEFICIÁRIO(S)
Capanema - PR.

III - CONTRATAÇÃO SOB LIMINAR
(x) Não () Sim
Apenas no caso de contratação sob liminar, aplica-se a Cláusula Décima Sétima desse Contrato de Repasse – Condições Gerais.

IV – CONTRATAÇÃO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA
( ) Não (x) Sim
Documentação: Área de Intervenção, Técnica de Engenharia e Licença Ambiental.
Prazo para entrega da documentação pelo CONTRATADO: 08 (oito) meses.
Prazo para análise pela CAIXA após apresentação da documentação: 01 (um) mês.

V - DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Recursos do Repasse da União R$ 245.850,00 (duzentos e quarenta e cinco mil e oitocentos e cinquenta reais).
Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA R$ 4.150,00 (quatro mil e cento e cinquenta reais).
Recursos do Investimento (Repasse + Contrapartida) R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
Nota de Empenho nº 2017NE803701, emitida em 08/12/2017, no valor de R$ 245.850,00 (duzentos e quarenta e cinco mil e citocentos e cinquenta reais), Unidade Gestora 175004, Gestão 00001.
Programa de Trabalho: 1545120541D730041.
Natureza da Despesa: 444042.
Conta Vinculada do CONTRATADO: agência nº 1256, conta nº 006.00647240-5.

VI - PRAZOS
Data da Assinatura do Contrato de Repasse: 21/12/2017.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Término da Vigência Contratual: 21 de Outubro de 2021.
Prestação de Contas: até 60 (sessenta) dias após o término da vigência contratual ou conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro.
Arquivamento: 10 anos contados da apresentação da prestação de contas pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA ou do decurso do prazo para apresentação da prestação de contas.

VII - FORO
Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado do Paraná.

VIII - ENDEREÇOS
Endereço para entrega de correspondências ao CONTRATADO: Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - CEP 85760-000 - Capanema - PR.
Endereço para entrega de correspondências à CONTRATANTE: Cascavel - PR.

ENDEREÇOS ELETRÔNICOS:
Endereço eletrônico do CONTRATADO: planejamento.orso@capanema.pr.gov.br.
Endereço eletrônico do CONTRATANTE: sr2608pr@caixa.gov.br.

Pelo presente instrumento, as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PLANO DE TRABALHO E DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA

1 – O Plano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV) é parte integrante do presente Contrato de Repasse, independente de transcrição.

1.1 – A eficácia deste Instrumento está condicionada à apresentação pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA de toda a documentação relacionada no item IV das Condições Gerais deste Contrato, bem como à análise favorável pela CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no mesmo item.

1.1.1 - O prazo fixado para atendimento da condição suspensiva poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período:

1.1.2 – O CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA, desde já e por este Instrumento, reconhece e dá sua anuência que o não atendimento das exigências no prazo fixado ou a não aprovação da documentação pela CONTRATANTE implicará a rescisão de pleno direito do presente Contrato de Repasse, independente de notificação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CLÁUSULASEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

2 – Como forma mútua de cooperação na execução do objeto do Contrato de Repasse, são obrigações das partes:

2.1 – DA CONTRATANTE

I. analisar e aceitar a documentação técnica, institucional e jurídica das propostas selecionadas;
II. celebrar o Contrato de Repasse, após atendimento dos requisitos pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, e publicar seu extrato, no Diário Oficial da União (DOU), e respectivas alterações, se for o caso;
III. acompanhar e atestar a execução físico-financeira do objeto previsto no Plano de Trabalho, com os correspondentes registros nos sistemas da União, utilizando-se para tanto dos recursos humanos e tecnológicos da CONTRATANTE;
IV. transferir ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA os recursos financeiros, na forma do cronograma de desembolso aprovado, observado o disposto na Cláusula Quinta deste Instrumento;
V. comunicar a assinatura e liberação de recursos ao Poder Legislativo na forma disposta na legislação;
VI. monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a execução do presente instrumento;
VII. analisar eventuais solicitações de reprogramação dos Projetos Técnicos, submetendo-as, quando for o caso, ao Gestor do Programa, mediante o pagamento de taxa de reanálise;
VIII. verificar a realização do procedimento licitatório pelo CONTRATADO, atendo-se à documentação no que tange: a contemporaneidade do certame, aos preços do licitante vencedor e sua compatibilidade com os preços de referência, ao respectivo enquadramento do objeto ajustado com o efetivamente licitado, ao fornecimento de declaração expressa firmada por representante legal do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis, ou registro no SICONV que a substitua;
IX. aferir a execução do objeto pactuado, conforme pactuado no Plano de Trabalho, por meio da verificação da compatibilidade entre estes e o efetivamente executado, assim como verificar a regular aplicação das parcelas de recursos, de acordo com o disposto na Cláusula Quinta;
X. verificar a existência da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, quando se tratar de obras e serviços de engenharia;
XI. designar, em 10 dias contados da assinatura do instrumento, os servidores ou empregados responsáveis pelo seu acompanhamento;
XII. divulgar em sítio eletrônico institucional as informações referentes a valores devolvidos, bem como a causa da devolução, nos casos de não execução total do objeto pactuado, extinção ou rescisão do instrumento;
XIII. fornecer, quando requisitadas pelos órgãos de controle externo e nos limites de sua competência específica, informações relativas ao Contrato de Repasse independente de autorização judicial;

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

XIV. notificar previamente o CONTRATADO a inscrição como inadimplente no SICONV, quando detectadas impropriedades ou irregularidades no acompanhamento da execução do objeto do instrumento, devendo ser incluída no aviso a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, e o Poder Legislativo do órgão responsável pelo instrumento;

XV. notificar o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA quando não apresentada a Prestação de Contas dos recursos aplicados, ou quando constatada a má aplicação dos recursos públicos transferidos, instaurando, se for o caso, a competente Tomada de Contas Especial;

XVI. receber e analisar a prestação de contas encaminhada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, bem como notificá-lo quando da não apresentação no prazo fixado e ainda quando constatada a má aplicação dos recursos, instaurando, se for o caso, a correspondente Tomada de Contas Especial;

XVII. solicitar à instituição financeira albergante da conta vinculada a devolução imediata dos saldos remanescentes dessa conta específica do instrumento para a conta única do Tesouro Nacional, nos casos aplicáveis.

XVIII. assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação ou de ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade;

XIX. realizar tempestivamente no SICONV os atos e os procedimentos relativos ao acompanhamento da execução do objeto, registrando no SICONV os atos que por sua natureza não possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-os atualizados.

2.2 – DO CONTRATADO

I. consignar no Orçamento do exercício corrente ou, em lei que autorize sua inclusão, os recursos necessários para executar o objeto do Contrato de Repasse e, no caso de investimento que extrapole o exercício, consignar no Plano Plurianual os recursos para atender às despesas em exercícios futuros que, anualmente constarão do seu Orçamento;

II. observar as condições para recebimento de recursos da União e para inscrição em restos a pagar estabelecidas pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;

III. comprometer-se, nos casos em que couber a instituição da contribuição de melhoria, nos termos do Código Tributário Nacional, a não efetuar cobrança que resulte em montante superior à contrapartida aportada ao Contrato de Repasse;

IV. definir o regime de execução, direto ou indireto, do objeto do Contrato de Repasse;

V. elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado e apresentar toda documentação jurídica, técnica e institucional necessária à celebração do Contrato de Repasse, de acordo com os normativos do programa, bem como apresentar documentos de titularidade dominial da área de intervenção, licenças e aprovações de projetos emitidos pelo órgão ambiental competente e concessionárias de serviços públicos, conforme o caso, nos termos da legislação aplicável;

VI. executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no Contrato de Repasse, observando prazos e custos, designando profissional habilitado e com experiência necessária ao acompanhamento e controle das obras e serviços com a respectiva ART da prestação de serviços de fiscalização a serem realizados.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

VII. Apresentar ao CONTRATANTE declaração de capacidade técnica, indicando o servidor ou servidores que acompanharão a obra ou serviço de engenharia.

VIII. assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas, ações e atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do benefício pela população beneficiária, quando detectados pela CONTRATANTE ou pelos órgãos de controle;

IX. selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Gestor do Programa, podendo estabelecer outras que busquem refletir situações de vulnerabilidade econômica e social, informando à CONTRATANTE sempre que houver alterações;

X. realizar o processo licitatório, sob sua inteira responsabilidade, quando optar pelo regime de execução indireta, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações ou da Lei 12.462, de 04 de agosto de 2011 e sua regulamentação, e demais normas pertinentes à matéria, assegurando a correção dos procedimentos legais, a suficiência do projeto básico, da planilha orçamentária discriminativa do percentual de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) utilizado e o respectivo detalhamento de sua composição;

XI. apresentar declaração expressa firmada por representante legal do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, ou registro no SICONV que a substitua, atestando o atendimento das disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório;

XII. exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o CTEF – Contrato de Execução e/ou Fornecimento de Obras, Serviços ou Equipamentos.

XIII. estimular a participação dos beneficiários finais na elaboração e implementação do objeto do Contrato de Repasse, bem como na manutenção do patrimônio gerado por estes investimentos;

XIV. no caso dos Estados, Municípios e Distrito Federal, notificar os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no município ou Distrito Federal quando ocorrer a liberação de recursos financeiros pela CONTRATANTE, em conformidade com a Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, facultada a notificação por meio eletrônico;

XV. operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos decorrentes do Contrato de Repasse, após sua execução, de forma a possibilitar a sua funcionalidade;

XVI. prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados à consecução do objeto no prazo fixado no Contrato de Repasse;

XVII. fornecer à CONTRATANTE, a qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliação do processo;

XVIII. prever no edital de licitação e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado;

XIX. realizar tempestivamente no SICONV os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, licitação, acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de tomada de contas especial do Contrato de Repasse e registrar

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

no SICONV os atos que por sua natureza não possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-os atualizados;

XX. instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do CTEF ou gestão financeira do Contrato de Repasse, comunicando tal fato à CONTRATANTE;

XXI. registrar no SICONV o extrato do edital de licitação, o preço estimado pela Administração para a execução do serviço e a proposta de preço total ofertada por cada licitante com o seu respectivo CNPJ, o termo de homologação e adjudicação, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART dos projetos, dos executores e da fiscalização de obras, e os boletins de medições;

XXII. manter um canal de comunicação efetivo, ao qual se dará ampla publicidade, para o recebimento pela União de manifestações dos cidadãos relacionados ao convênio, possibilitando o registro de sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias;

XXIII. incluir nas placas e adesivos indicativos das obras, quando o objeto do instrumento se referir à execução de obras de engenharia, informação sobre canal para o registro de denúncias, reclamações e elogios, conforme previsto no "Manual de Uso da Marca do Governo Federal - Obras" da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;

XXIV. ao tomar ciência de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciência aos órgãos de controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar os Ministérios Público Federal e Estadual e a Advocacia Geral da União.

XXV. adotar o disposto nas Leis nº 10.048, de 08 de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e no Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, relativamente à promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida;

XXVI. compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de preservação ambiental municipal, estadual ou federal, conforme o caso;

XXVII. prever no edital de licitação as composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI que integram o orçamento do projeto básico da obra e/ou serviço, em cumprimento ao art. 7º, §2º, inciso II, da Lei 8.666/93 c/c a Súmula nº 258 do Tribunal de Contas da União;

XXVIII. nos casos de transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, observar o disposto no Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013, e suas alterações, nas licitações que realizar, no caso de contratação de obras ou serviços de engenharia, bem como apresentar à CONTRATANTE declaração firmada pelo representante legal do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA acerca do atendimento ao disposto no referido Decreto;

XXIX. utilizar, para aquisição de bens e serviços comuns, a modalidade pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, preferencialmente a sua forma eletrônica, devendo ser justificada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a impossibilidade de sua utilização;

XXX. apresentar declaração expressa ou fornecer declaração emitida pela empresa vencedora da licitação, atestando que esta não possui em seu quadro societário

servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalização dessa obrigação;

XXXI. registrar no SICONV as atas e as informações sobre os participantes e respectivas propostas das licitações, bem como as informações referentes às dispensas e inexigibilidades;

XXXII. inserir, quando da celebração de contratos com terceiros para execução do objeto do Contrato de Repasse, cláusula que obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis;

XXXIII. atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Público, em atendimento ao disposto na Portaria CGU nº 516, de 15 de março de 2010;

XXXIV. consultar no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Público, sendo vedada a participação na licitação ou contratação de empresa que consta como impedida ou suspensa;

XXXV. consultar no Cadastro Nacional de Condenações Civis a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, no que tange a registro de ato de improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça;

XXXVI. apresentar à CONTRATANTE relatório de execução do empreendimento contendo informações sobre a execução físico-financeira do Contrato de Repasse, bem como da integralização da contrapartida, em periodicidade compatível com o cronograma de desembolso estabelecido;

XXXVII. responsabilizar-se pela conclusão do empreendimento quando o objeto do Contrato de Repasse prever apenas sua execução parcial e for etapa de empreendimento maior, a fim de assegurar sua funcionalidade;

XXXVIII. divulgar, em qualquer ação promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do Contrato de Repasse, o nome do Programa, a origem do recurso, o valor do repasse e o nome do CONTRATANTE e do Gestor do Programa, como entes participantes, obrigando-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a comunicar expressamente à CAIXA a data, forma e local onde ocorrerá a ação promocional, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;

XXXIX. comprometer-se a utilizar a assinatura do Gestor do Programa acompanhada da marca do Governo Federal nas publicações decorrentes do Contrato de Repasse, observadas as limitações impostas pela Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;

XL. responder solidariamente, os entes consorciados, no caso da execução do objeto contratual por consórcios públicos;

XLI. aplicar, no SICONV, os recursos creditados na conta vinculada ao Contrato de Repasse em caderneta de poupança, se o prazo previsto para sua utilização for igual

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

ou superior a um mês, e realizar os pagamentos de despesas do Contrato de Repasse também por intermédio do SICONV, observadas as disposições contidas na Cláusula Sétima deste Instrumento;

XLII. autorizar o CONTRATANTE ou sua mandatária para que solicitem junto à instituição financeira albergante da conta vinculada, a transferência dos recursos financeiros por ele repassados, bem como os seus rendimentos, para a conta única da União, caso os recursos não sejam utilizados no objeto da transferência pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias;

XLIII. autorizar ao CONTRATANTE solicitar, à instituição financeira albergante da conta vinculada, o resgate dos saldos remanescentes, nos casos em que não houver a devolução dos recursos no prazo previsto;

XLIV. estar ciente sobre a não sujeição ao sigilo bancário, quanto a União e respectivos órgãos de controle, por se tratar de recurso público;

XLV. dar ciência da celebração do Contrato de Repasse ao conselho local ou instância de controle social da área vinculada ao programa de governo que originou a transferência, quando houver;

XLVI. divulgar em sítio eletrônico institucional as informações referentes a valores devolvidos, bem como a causa da devolução, nos casos de não execução total do objeto pactuado, extinção ou rescisão do instrumento;

XLVII. disponibilizar, em sítio oficial na internet, ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao extrato do instrumento ou outro instrumento utilizado, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação e o detalhamento da aplicação dos recursos/, bem como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado, podendo ser suprida a publicação na internet pela inserção de link na página oficial do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA que possibilite acesso direto ao Portal de Convênios.

XLVIII. indicar a obrigatoriedade de contabilização e guarda dos bens remanescentes e manifestar compromisso de utilização dos bens para assegurar a continuidade de programa governamental, estando claras as regras e diretrizes de utilização;

XLIX. responder, na figura de seus titulares, na medida de seus atos, competências e atribuições o CONTRATADO e solidariamente, quando for o caso, a UNIDADE EXECUTORA, por desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do contrato ou gestão financeira do instrumento;

L. tomar outras providências necessárias à boa execução do objeto do Contrato de Repasse;

LI. transferir a posse e propriedade do imóvel para os beneficiários finais, sendo condicionante para aprovação da Prestação de Contas, caso a operação preveja o item de investimento de regularização fundiária;

LII. apresentar a Licença de Operação, fornecida pelo órgão ambiental competente, sendo condicionante para aprovação da Prestação de Contas Final, caso a operações seja de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos urbanos e drenagem, inclusive as realizadas nos programas habitacionais;

LIII. estar ciente que a não aprovação pela CONTRATANTE do produto inicial relativo à metodologia implicará a rescisão contratual e a não liberação dos recursos contratados bem como a devolução dos recursos eventualmente já sacados, no caso de operações de Plano Diretor, Risco e Regularização Fundiária;

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

LIV. estar ciente que a liberação da última parcela fica condicionada à comprovação da regularização efetiva da situação da delegação ou concessão firmada entre o município e o prestador dos serviços, no caso de operações do Programa Serviços Urbanos de Água e Esgoto, quando a comprovação da regularidade da delegação e concessão for apresentada por termo de compromisso;

LV. garantir isoladamente ou junto aos órgãos competentes o fornecimento, a manutenção e a operação dos sistemas de abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgoto sanitário, de coleta e tratamento dos resíduos sólidos, de coleta de esgotos pluviais, de pavimentação pública e de rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública, no que couber.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3 – A CONTRATANTE transferirá, ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, até o limite do valor dos Recursos de Repasse descrito no item V das CONDIÇÕES GERAIS e de acordo com o cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho.

3.1 – O CONTRATADO aportará o valor dos Recursos de Contrapartida descrito no item V das CONDIÇÕES GERAIS de acordo com os percentuais e as condições estabelecidas na legislação vigente e de acordo com o cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho à conta de recursos alocados em seu orçamento.

3.2 – Os recursos transferidos pela União e os recursos do CONTRATADO destinados ao presente Contrato de Repasse, figurarão no Orçamento do CONTRATADO, obedecendo ao desdobramento por fontes de recursos e elementos de despesa.

3.3 – Recursos adicionais necessários à consecução do objeto do presente Contrato de Repasse terão o seu aporte sob responsabilidade exclusiva do CONTRATADO.

3.4 – Toda a movimentação financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta vinculada a este Contrato de Repasse, em agência da CAIXA, isenta de cobrança de tarifas bancárias.

CLÁUSULA QUARTA – DA AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DO OBJETO

4 – O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, por meio deste Instrumento, manifesta sua expressa concordância em aguardar a autorização escrita da CONTRATANTE para o início da execução do objeto deste Contrato de Repasse.

4.1 – A autorização ocorrerá após a finalização do processo de análise pós-contratual e o crédito de recursos de repasse na conta vinculada, conforme diretrizes da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU 424/2016 e do Gestor do Programa.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

4.2 – Eventual execução do objeto realizada antes da autorização da CONTRATANTE não será objeto de medição para liberação de recursos até a emissão da autorização acima disposta.

4.3 – Caso a contratação seja efetuada no período pré-eleitoral, o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA declara estar ciente de que a autorização de início de objeto e a liberação dos recursos somente ocorrerá após finalizado o processo eleitoral a se realizar no mês de outubro, considerada, inclusive, a eventual ocorrência de segundo turno, em atendimento ao artigo 73, inciso VI, alínea "a" da Lei nº 9.504/97.

CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO, LIBERAÇÃO E DESBLOQUEIO DE RECURSOS

5. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a regularidade dos atos praticados e a sua plena execução, respondendo o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do instrumento, não cabendo a responsabilização do CONTRATANTE por inconformidades ou irregularidades praticadas pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissão de responsabilidade atribuída ao CONTRATANTE.

5.1 No acompanhamento da execução do objeto serão verificados:

I – a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação aplicável;
II – a compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido no plano de trabalho, os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;
III – a regularidade das informações registradas pelo CONTRATADO no SICONV;
IV – o cumprimento das metas do plano de trabalho nas condições estabelecidas.
V – a conformidade financeira

5.2 O CONTRATANTE comunicará ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica apurados durante a execução do instrumento, suspendendo o desbloqueio de recursos, ficando estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual período.

5.3 O CONTRATANTE reportará decisão quanto à aceitação ou não das justificativas apresentadas e, se for o caso, realizará procedimento de apuração de dano ao erário, ensejando registro de inadimplência no SICONV e imediata instauração de Tomada de Contas Especial.

5.4 – A liberação dos recursos financeiros obedecerá ao cronograma de desembolso de acordo com as metas e fases ou etapas de execução do objeto e será realizada sob

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

bloqueio, após eficácia contratual, respeitando a disponibilidade financeira do Gestor do Programa e atendidas as exigências cadastrais vigentes.

5.4.1 - A liberação de recursos deverá ocorrer da seguinte forma:

I - exceto nos casos de instrumento com parcela única, o valor do desembolso a ser realizado pelo Gestor do Programa ou pela mandatária referente à primeira parcela, não poderá exceder a 20% (vinte por cento) do valor global do instrumento;

II - a liberação da primeira parcela ou parcela única ficará condicionada ao:

a) envio pela mandatária e homologação pelo Gestor do Programa da Síntese do Projeto Aprovado - SPA quando o objeto do instrumento envolver a execução de obras e serviços e engenharia enquadrados nos incisos II e III do art. 3º da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424/2016;

b) conclusão da análise técnica e aceite do processo licitatório pelo Gestor do Programa ou mandatária; e,

III - a liberação das demais parcelas, está condicionada a execução de no mínimo 70% (setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente.

5.5 - O cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho deverá estar em consonância com as metas e fases ou etapas de execução do objeto do instrumento.

5.6 - Após a comprovação da homologação do processo licitatório pelo CONTRATADO, o cronograma de desembolso deverá ser ajustado em observação ao grau de execução estabelecido no referido processo licitatório.

5.7–É permitido o adiantamento de parcelas no regime de execução direta na forma do cronograma de desembolso aprovado, sendo vedado nos casos de execução de obras e serviços de engenharia enquadrados no inciso III do art. 3º da Portaria MPDG/MF/CGU nº 424/2016, ficando a liberação das parcelas subsequentes condicionada à aprovação,pela CONTRATANTE, de relatório de execução com comprovação da aplicação dos recursos da última parcela liberada.

5.8 – Na hipótese de inexistência de execução financeira após 180 (cento e oitenta) dias da liberação da primeira parcela o instrumento deverá ser rescindido, sendo vedado, também, o início de execução de novos instrumentos e a liberação de recursos para este CONTRATADO.

5.9 – A autorização de desbloqueio dos recursos creditados na conta vinculada ocorrerá condicionada a:

I - a emissão da autorização para início do objeto;

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

II - a apresentação do relatório de execução compatível com o cronograma de desembolso aprovado, devidamente atestado pela fiscalização do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA;
III – o atendimento ao disposto nos Artigos 52 e 54 da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424/2016;
IV - a comprovação do aporte da contrapartida pactuada para a etapa correspondente;
V - a comprovação financeira da etapa anterior pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA.

5.9.1 - O servidor indicado pelo CONTRATADO responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra deverá assinar e carregar no SICONV o relatório de fiscalização referente a cada medição

5.9.2 - O CONTRATADO deverá verificar se os materiais aplicados e os serviços realizados atendem aos requisitos de qualidade estabelecidos pelas especificações técnicas dos projetos de engenharia aceitos

5.9.3 - A execução física será atestada conforme regramento disposto no Artigo 54 da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424/2016.

5.9.4 – A aferição da execução do objeto, suas metas e fases ou etapas será realizada por meio da verificação da compatibilidade entre o efetivamente executado e o pactuado no Plano de Trabalho.

CLÁUSULA SEXTA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS

6 – As despesas com a execução do objeto do presente Contrato de Repasse correrão à conta de recursos alocados nos respectivos orçamentos dos contratantes.

6.1 – A emissão do empenho plurianual, quando for o caso, ocorrerá de acordo com determinação específica do Gestor do Programa, com incorporação ao presente Contrato de Repasse mediante Apostilamento.

6.2 – A eficácia deste Instrumento está condicionada à validade dos empenhos, que é determinada por instrumento legal, findo o qual, sem a total liberação dos recursos, o presente Contrato de Repasse fica automaticamente extinto.

6.2.1 – No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de Restos a Pagar, o quantitativo físico-financeiro poderá ser reduzido até a etapa do objeto contratado que apresente funcionalidade.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

7 – Os recursos somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas em lei ou na Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016, vedada sua utilização em finalidade diversa da pactuada neste Instrumento.

7.1 – A programação e a execução financeira deverão ser realizadas em separado, de acordo com a natureza e a fonte de recursos, se for o caso.

7.2 – Antes da realização de cada pagamento, o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA incluirá no SICONV, no mínimo, as seguintes informações:

I - a destinação do recurso;
II - o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;
III - o contrato a que se refere o pagamento realizado;
IV - a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;
V - informações das notas fiscais ou documentos contábeis.

7.3 – Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços, facultada a dispensa deste procedimento nos casos citados abaixo, em que o crédito poderá ser realizado em conta bancária de titularidade do próprio CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, devendo ser registrado no SICONV o beneficiário final da despesa:

a) por ato da autoridade máxima do Gestor do Programa;
b) na execução do objeto pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA por regime direto;
c) no ressarcimento ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA por pagamentos realizados às próprias custas decorrentes de atrasos na liberação de recursos pelo Gestor do Programa e em valores além da contrapartida pactuada.

7.3.1 – Excepcionalmente, poderá ser realizado, uma única vez no decorrer da vigência do presente Contrato de Repasse, pagamento a pessoa física que não possua conta bancária, desde que permitida a identificação do beneficiário pela CONTRATANTE, e observado o limite de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)por fornecedor ou prestador de serviços.

7.4 – Os recursos transferidos pela CONTRATANTE não poderão ser utilizados para despesas efetuadas em período anterior ou posterior à vigência do presente Contrato de Repasse, permitido o pagamento de despesas posteriormente desde que comprovadamente realizadas na vigência descrita no item VI das CONDIÇÕES GERAIS.

7.5 – Os recursos transferidos, enquanto não utilizados, serão aplicados em caderneta de poupança se o prazo previsto para sua utilização for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

em títulos da dívida pública federal, quando a sua utilização estiver prevista para prazo menor que um mês.

7.5.1 – A aplicação dos recursos, creditados na conta vinculada ao Contrato de Repasse, em fundo de curto prazo será automática, após assinatura pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA do respectivo Termo de Adesão ao fundo no ato de regularização da conta, ficando o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA responsável pela aplicação em caderneta de poupança por intermédio do SICONV, se o prazo previsto para utilização dos recursos transferidos for igual ou superior a um mês.

7.5.2 – Todos os rendimentos provenientes da aplicação dos recursos das contas vinculadas devem ser devolvidos à conta única do Tesouro ao final da execução do objeto contratado, devendo constar de demonstrativo específico que integrará a prestação de contas, vedada a sua utilização.

7.5.3 - Na ocorrência de perdas financeiras decorrentes da aplicação dos recursos, que comprometam a execução do objeto contratual, fica o CONTRATADO obrigado ao aporte adicional de contrapartida.

7.6 – Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Contrato de Repasse, inclusive os provenientes das receitas auferidas em aplicações financeiras, deverão ser restituídos à UNIÃO FEDERAL, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, na forma indicada pela CONTRATANTE na época da restituição, sob pena da imediata instauração de Tomada de Contas Especial do responsável.

7.6.1 – A devolução prevista acima será realizada observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e da contrapartida prevista, independente da época em que foram aportados, devendo, nos casos em que incida exclusivamente sobre o repasse ou a contrapartida, ser devolvido apenas ao ente titular do valor remunerado.

7.6.2 – Nos casos de descumprimento do prazo previsto no item 7.6, o CONTRATANTE solicitará à instituição financeira albergante da conta vinculada a devolução imediata dos saldos remanescentes à conta única do Tesouro Nacional.

7.7 – Deverão ser restituídos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de juros legais e atualizados monetariamente, a partir da data do recebimento, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos:

a) quando não houver qualquer execução física referente ao objeto pactuado neste Instrumento nem utilização de recursos;
b) quando for executado parcialmente o objeto pactuado neste Instrumento;
c) quando não for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestação de contas parcial ou final;
d) quando os recursos forem utilizados em desconformidade com o pactuado neste Instrumento;

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

e) quando houver utilização dos valores resultantes de aplicações financeiras em desacordo com o estabelecido no item 7.5.2;
f) quando houver impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com as disposições do contrato celebrado.

7.7.1 – Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "a", os recursos que permaneceram na conta vinculada, sem terem sido desbloqueados em favor do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, serão devolvidos acrescidos do resultado da aplicação financeira nos termos do item 7.5, no prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da vigência do Contrato de Repasse.

7.7.2 – Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "b", em que a parte executada apresente funcionalidade, a devolução dos recursos já creditados em conta e não aplicados no objeto do Plano de Trabalho, acrescidos do resultado da aplicação financeira nos termos do item 7.5, ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da vigência contratual.

7.7.3 – Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "b", em que a parte executada não apresente funcionalidade, a totalidade dos recursos liberados devem ser devolvidos devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução de recursos, acrescido a esse montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da devolução de recursos à conta única do Tesouro.

7.7.4 - Para aplicação dos itens 7.7.2 e 7.7.3, a funcionalidade da parte executada será verificada pela CONTRATANTE.

7.7.5 - Vencidos os prazos de devolução descritos nos itens 7.7.2 e 7.7.3, os valores devem ser devolvidos devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução de recursos, acrescido a esse montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da devolução de recursos à conta única do Tesouro.

7.7.6 - Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "c", os recursos devem ser devolvidos incluindo os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC.

7.7.7 – Na hipótese prevista no item 7.7. alíneas "d", será instaurada Tomada de Contas Especial, além da devolução dos recursos liberados devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos,

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

acrescido esse montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da devolução dos recursos à Conta Única do Tesouro Nacional.

7.8 – Para fins de efetivação da devolução dos recursos à União, a parcela de atualização referente à variação da SELIC será calculada proporcionalmente à quantidade de dias compreendida entre a data da liberação da parcela para o CONTRATADO e a data de efetivo crédito do montante devido na conta única do Tesouro.

CLÁUSULA OITAVA – DOS BENS REMANESCENTES AO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

8 – Os bens remanescentes decorrentes do Contrato de Repasse serão de propriedade do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, quando da sua extinção, desde que vinculados à finalidade a que se destinam.

CLÁUSULA NONA – DAS PRERROGATIVAS

9 – O Gestor do Programa é a autoridade competente para coordenar e definir as diretrizes do Programa, cabendo à CONTRATANTE o acompanhamento e avaliação das ações constantes no Plano de Trabalho.

9.1 – Sempre que julgar conveniente, o Gestor do Programa poderá promover visitas *in loco* com o propósito do acompanhamento e avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas em razão do Contrato de Repasse, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes ao assunto.

9.2 – É prerrogativa da União, por intermédio do Gestor do Programa e do CONTRATANTE, promover a fiscalização físico-financeira das atividades referentes ao Contrato de Repasse, bem como, conservar, em qualquer hipótese, a faculdade de assumir ou transferir a responsabilidade da execução do objeto, no caso de sua paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer.

9.3 - As informações relativas à celebração, execução, acompanhamento, fiscalização e de prestação de contas, inclusive àquelas referentes à movimentação financeira dos instrumentos, serão públicas, exceto nas hipóteses legais de sigilo fiscal e bancário e nas situações classificadas como de acesso restrito, concoante o ordenamento jurídico.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAÇÃO

10 – Obriga-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a registrar, em sua contabilidade analítica, em conta específica do grupo vinculado ao ativo financeiro, os recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no

passivo financeiro, com subcontas identificando o Contrato de Repasse e a especificação da despesa.

10.1 – As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas serão emitidos em nome do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, devidamente identificados com o nome do Programa e o número do Contrato de Repasse, e mantidos em arquivo, em ordem cronológica, no próprio local em que forem contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo fixado no Contrato de Repasse.

10.1.1 – O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA deverá disponibilizar cópias dos comprovantes de despesas ou de outros documentos à CONTRATANTE sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

11 – A Prestação de Contas referente aos recursos financeiros deverá ser apresentada à CONTRATANTE no prazo descrito no item VI das CONDIÇÕES GERAIS.

11.1 – Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo fixado, a CONTRATANTE estabelecerá o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para sua apresentação, ou recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados pela taxa SELIC.

11.2 – Caso o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA não apresente a prestação de contas nem devolva os recursos nos termos do item anterior, ao término do prazo estabelecido, a CONTRATANTE registrará a inadimplência no SICONV por omissão do dever de prestar contas e comunicará o fato ao órgão de contabilidade analítica, para fins de instauração de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento e adoção de outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.

11.3 – Cabe ao prefeito e ao governador sucessores prestar contas dos recursos provenientes dos Contratos de Repasse firmado pelo seu antecessor.

11.3.1 – Na impossibilidade de atender ao disposto no item anterior, deve apresentar, à CONTRATANTE, e inserir no SICONV documento com justificativas que demonstrem o impedimento e as medidas adotadas para o resguardo do patrimônio público.

11.3.2 – Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do antecessor, o novo administrador solicitará a instauração de Tomada de Contas Especial.

11.3.3 – Os casos fortuitos ou de força maior que impeçam o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA de prestar contas dos recursos recebidos e aplicados ensejarão a juntada de documentos e justificativas, a serem entregues à CONTRATANTE, para análise e manifestação do Gestor do Programa.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v010 micro

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REEMBOLSO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

12 – O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA é responsável pelas despesas extraordinárias incorridas no âmbito desse instrumento, quando solicitar:

a) reanálise de enquadramento de Plano de Trabalho e de projetos de engenharia e de trabalho social, quando houver;
b) vistoria de etapas de obras não previstas originalmente;
c) publicação de extrato no Diário Oficial da União decorrente de alteração contratual de responsabilidade do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA AUDITORIA

13 – Os serviços de auditoria serão realizados pelos órgãos de controle interno e externo da União, sem elidir a competência dos órgãos de controle interno e externo do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, em conformidade com o Capítulo VI do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986.

13.1 – É livre o acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Controle Interno ao qual esteja subordinada a CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da União a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o Instrumento pactuado, bem como aos locais de execução das obras, quando em missão de fiscalização ou auditoria.

13.2. Em sendo evidenciados pelos Órgãos de Controle ou Ministério Público vícios insanáveis que impliquem nulidade da licitação realizada, o CONTRATADO deverá adotar as medidas administrativas necessárias à recomposição do erário no montante atualizado da parcela já aplicada, o que pode incluir a reversão da aprovação da prestação de contas e a instauração de Tomada de Contas Especial, independentemente da comunicação do fato ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E DAS AÇÕES PROMOCIONAIS

14 – É obrigatória a identificação do empreendimento com placa segundo modelo fornecido pela CONTRATANTE, durante o período de duração da obra, devendo ser afixada no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da autorização da CONTRATANTE para o início dos trabalhos, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

14.1 – Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do Contrato de Repasse será obrigatoriamente destacada a participação da CONTRATANTE, do Gestor do Programa, bem como o objeto de aplicação dos recursos, observado o disposto no § 1° do art. 37 da Constituição Federal, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral n° 9.504, de 30 de setembro de 1997.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA

15 – A vigência deste Instrumento iniciar-se-á na data de sua assinatura e encerrar-se-á no prazo descrito no item VI das CONDIÇÕES GERAIS, possibilitada a sua prorrogação mediante Termo Aditivo e aprovação da CONTRATANTE, quando da ocorrência de fato superveniente que impeça a consecução do objeto no prazo acordado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

16 – O Contrato de Repasse poderá ser denunciado por qualquer das partes e rescindido a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis pelas obrigações assumidas na sua vigência, creditando-se-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período, aplicando, no que couber, a Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e demais normas pertinentes à matéria.

16.1 – Constitui motivo para rescisão do Contrato de Repasse o descumprimento de qualquer das Cláusulas pactuadas, particularmente quando constatada pela CONTRATANTE:

I - a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
II - a inexistência de execução financeira após 180 (cento e oitenta) dias da liberação da primeira parcela, à exemplo do descrito na Cláusula Quinta, item 5.8;
III - a falsidade ou incorreção de informação de documento apresentado;
IV - a verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

16.1.1 – A rescisão do Contrato de Repasse, na forma acima prevista e sem que tenham sido os valores restituídos à União Federal devidamente corrigidos, ensejará a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR

17 – A existência de restrição do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA não foi considerada óbice à celebração do presente instrumento, em razão da decisão liminar concedida nos termos especificados no Contrato de Repasse, a qual autorizou a celebração deste instrumento, condicionada à decisão final.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

17.1 – Ainda que posteriormente regularizada a restrição apontada no Contrato de Repasse, a desistência da ação ou a decisão judicial desfavorável ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA implicará a desconstituição dos efeitos da respectiva liminar, com a rescisão do presente contrato e a devolução de todos os recursos que eventualmente tenha recebido, atualizados na forma da legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA ALTERAÇÃO

18 – A alteração deste Instrumento, no caso da necessidade de ajustamento da sua programação de execução física e financeira, inclusive a alteração do prazo de vigência fixado no Contrato de Repasse, será feita por meio de Termo Aditivo e será provocada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, mediante apresentação das respectivas justificativas, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias que antecedem o término da sua vigência, sendo necessária, para sua implementação, a aprovação da CONTRATANTE.

18.1 – A alteração do prazo de vigência do Contrato de Repasse, em decorrência de atraso na liberação dos recursos por responsabilidade do Gestor do Programa, será promovida "de ofício" pela CONTRATANTE, limitada ao período do atraso verificado, fazendo disso imediato comunicado ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA.

18.2 – A alteração contratual referente ao valor dc Contrato de Repasse será feita por meio de Termo Aditivo, ficando a majoração dos recursos de repasse sob decisão unilateral exclusiva do Gestor do Programa.

18.3 – É vedada a alteração do objeto do Contrato de Repasse.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS VEDAÇÕES

19 – Ao CONTRATADO é vedado:

I. reformular os projetos de engenharia das obras e serviços já aceitos pelo CONTRATANTE;
II. reprogramar os projetos de engenharia dos instrumentos enquadrados no Inciso I do Artigo 3º da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424/2016;
III. realizar despesas a título de taxa de administração ou similar;
IV. pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de pessoal do órgão ou entidade pública da Administração Direta ou Indireta, salvo nas hipóteses previstas em leis federais específicas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
V. utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da estabelecida no instrumento;
VI. realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento;

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

VII. efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado;
VIII. realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto no que se refere às multas e aos juros decorrentes de atraso na transferência de recursos pelo CONTRATANTE, e desde que os prazos para pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado.
IX. transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar, quando for o caso;
X. realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizes promoção pessoal e desde que previstas no plano de trabalho;
XI. pagar, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados;
XII. aproveitar rendimentos para ampliação ou acréscimo de metas ao plano de trabalho pactuado;
XIII. computar receitas oriundas dos rendimentos de aplicações no mercado financeiro como contrapartida.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS E DAS COMUNICAÇÕES

20 – Os documentos instrutórios ou comprobatórios relativos à execução do Contrato de Repasse deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada.

20.1 – As comunicações de fatos ou ocorrências relativas ao Contrato serão consideradas como regularmente feitas se entregues por carta protocolada, telegrama, fax ou correspondência eletrônica, com comprovante de recebimento, nos endereços descritos no item VIII das CONDIÇÕES GERAIS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO

21 – Fica eleito o foro da Justiça Federal, descrito no item VII das CONDIÇÕES GERAIS, para dirimir os conflitos decorrentes deste Instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que será assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele, sendo extraídas as respectivas cópias, que terão o mesmo valor do original.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA Contrato de Repasse – Transferência Voluntária

Capanema , 21 de Dezembro de 2017
Local/Data

Assinatura do CONTRATANTE
Nome: EZIO LUIZ LENA
CPF: 500.032.590-72

Assinatura do CONTRATADO
Nome: AMÉRICO BELLÉ
CPF: 240.595.879-15

Testemunhas

Nome: PAULO CESAR
CPF: 554.059.169-00

Nome:
CPF:

Evandro Cesar Malinski
RG.: 5.961.085-6
CPF: 781.942.379-04

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

1:28

CAIXA

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Gestor / Programa / Ação / Modalidade	Município/UF
1041530-91	**Ministério das Cidades / Planejamento Urbano**	**Capanema-PR**

Proponente	Objeto	Empreendimento/Apelido
Prefeitura Municipal de Ca	**Pavimentação Poliedrica com Pedras Irregulares em Vias Públicas Urbanas**	**Calçamentto Tamoios**

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)

ITENS		*SIGLAS*	*VALORES*
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		AC	3,80%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO		S+G	0,32%
TAXA DE RISCO		R	0,50%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS		DF	1,02%
TAXA DE LUCRO		L	6,64%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	I	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
	ISS (legislação municipal)		3,00%
	CPRB (INSS)		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU			20,73%
BDI RESULTANTE			**26,85%**

FÓRMULA UTILIZADA: $$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 100,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 3,00%

Observações:

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
CREA-RS 88.296/D

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento
Nome: Rubens Luis Rolando Souza
CREA/CAU: RS 88.296/D
ART/RRT: 20171998970

Data: 19/07/2018

CAIXA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº da Operação	Gestor / Programa / Ação / Modalidade	Município/UF	Localidade
1041530-91	Ministério das Cidades / Planejamento Urbano	Capanema-PR	Rua Tamoios entre a Rua Rio Grande do Nort

Proponente / Tomador	Objeto	Empreendimento / Apelido
Prefeitura Municipal de Capanema	Pavimentação Poliédrica com Pedras Irregulares em Vias Públicas	Calçamentto Tamoios

DATA BASE SINAPI: 03/2017 (DESONERADO)
LOCALIDADE SINAPI: CURITIBA

BDI PADRÃO:	26,85%	P
BDI DIFERENCIADO 1:	4,71%	D1
BDI DIFERENCIADO 2:		D2
BDI ZERO:	0,00%	Z

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R$)	UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	BDI ↓	RECURSOS ↓
			TOTAL					387.001,82		
1			PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA					387.001,82		
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.026,93		
1.1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	323,82	410,77	1.026,93	P	
1.2			TERRAPLENAGEM					69.252,74		
1.2.1	SINAPI	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	6.418,34	0,45	0,57	3.658,45	P	
1.2.2	SINAPI	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	1.837,75	6,66	8,45	15.528,99	P	
1.2.3	Composição	005	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE 1ª CATEGORIA 200-400	m3	4.718,69	4,50	5,71	26.943,72	P	
1.2.4	SINAPI	41722	COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	M3	4.718,69	3,86	4,90	23.121,58	P	
1.3			DRENAGEM					135.911,95		
1.3.1	SINAPI	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	386,96	2,30	2,92	1.129,92	P	
1.3.2	SINAPI	94317	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	232,80	12,99	16,48	3.836,54	P	
1.3.3	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	286,50	146,13	185,37	53.108,51	P	
1.3.4	SINAPI	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	182,00	218,50	277,17	50.444,94	P	
1.3.5	SINAPI	92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	15,00	294,60	373,70	5.605,50	P	
1.3.6	SINAPI	83690	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1,98	474,27	601,61	1.191,19	P	
1.3.7	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	23,00	705,91	895,45	20.595,35	P	
1.4			PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES					115.487,58		
1.4.1	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	5.078,48	1,16	1,47	7.465,37	P	
1.4.2	Composição	004	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	m2	761,77	1,55	1,97	1.500,69	P	
1.4.3	SINAPI	72979	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	5.078,48	10,29	13,05	66.274,16	P	
1.4.4	SINAPI	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016	TXKM	7.963,06	0,80	1,01	8.042,69	P	
1.4.5	Composição	003	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICO	m2	761,77	0,37	0,47	358,03	P	
1.4.6	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	806,04	31,15	39,51	31.846,64	P	
1.5			SINALIZAÇÃO VERTICAL					5.731,50		
1.5.1	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	3,00	79,20	100,47	301,41	P	
1.5.2	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,57	554,40	703,26	1.104,12	P	
1.5.3	Composição	001	Suporte Metálico Galvanizado D=2,5" com aletas anti giro	UNIDADE	11,00	310,03	393,27	4.325,97	P	
1.6			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					17.354,39		
1.6.1	SINAPI	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	44,89	2,30	2,92	131,08	P	
1.6.2	SINAPI	94317	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	44,89	12,99	16,48	739,79	P	
1.6.3	SINAPI	85389	REMOCAO TUBULACAO FF C/ DN 400 A 600MM EXCLUINDO ESCAVACAO/REATERRO	M	56,11	78,98	100,19	5.621,66	P	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R$)	UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	BDI	RECURSOS
1.6.4	SINAPI	92831	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	4,00	605,31	767,84	3.071,36	P	
1.6.6	Composição	002	Boca de Bueiro Simples Tubular de Concreto(BSTC) 1,50 m	UNIDADE	2,00	3.070,75	3.895,25	7.790,50	P	
1.7			PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADAS					42.236,73		
1.7.1	SINAPI	72961	REGULARIZACAD E COMPACTACAD DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.193,60	1,16	1,47	1.754,59	P	
1.7.2	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	59,68	534,74	678,32	40.482,14	P	

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária , sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome: Rubens Luis Rolando Souza
CREA/CAU: RS 88.296/D
ART/RRT: 20171998970

Rubens Luis Rolando Souza
Eng. Civil Municipal de Carazinho-PR
Matrícula 17703-1
CREA/RS 88.296/D

Data: 19/07/2018

CAIXA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Nº da Operação	Gestor / Programa / Modalidade / Ação	Município/UF	Localidade
1041530-91	Ministério das Cidades / Planejamento Urbano	Capanema-PR	Rua Tamoios entre a Rua Rio Grande do Norte e Av Ataídes Roberto Escher

Proponente/Tomador	Objeto	Empreendimento/Apelido
Prefeitura Municipal de Capane	Pavimentação Poliédrica com Pedras Irregulares em Vias Públicas Urbanas	Calçamentto Tamoios

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1		PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA		-	
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	1,25 m x 2,00 m = 2,50 m2
1.2		TERRAPLENAGEM		-	
1.2.1	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	6.418,34	Área a pavimentar = 5.078,48 m2(rua) àrea de calçada = 1.339,86 m2 Total = 6.418,34 m2
1.2.2	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	1.837,75	Prancha 02/02 Levantamento Topográfico Volume de Corte = 1.837,75 m3
1.2.3	005	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE 1ª CATEGORIA 200-400	m3	4.718,69	Prancha 02/02 Levantamento Topográfico Volume de Aterro= 6.556,44 m3 Volume de Corte = 1.837,75 m3 Aterro - Corte = 6.556,44 m3 - 1.837,75 m3 Volume Corte/Aterro = 4.718,69 m3
1.2.4	41722	COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	M3	4.718,69	Prancha 02/02 Levantamento Topográfico Volume de Aterro= 6.556,44 m3 Volume de Corte = 1.837,75 m3 Aterro - Corte = 6.556,44 m3 - 1.837,75 m3 Volume Corte/Aterro = 4.718,69 m3
1.3		DRENAGEM		-	
1.3.1	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	386,96	V(volume de escavação)DN60= 286,50m(comprimento) x 0,80m(largura) x 0,80m(altura) V(DN 60) = 183,36 m3 V(volume de escavação)DN80 = 182,00m(comprimento) x 1,00m(largura) x 1,00m(altura) V(DN80)) = 182,000 m3 V(volume de escavação)DN 1000= 15,00 m(comprimento) x 1,20m(largura) x 1,20m(altura) V(DN 100) = 21,60 m3 183,36 m3 + 182,00,00 m3+ 21,60 m3 = 386,96 m3
1.3.2	94317	ATERRO MECANIZADO 0E VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	232,80	VR(volume de reaterro)= VE(volume de escavação - VT(volume do Tubo VR(DN60) = 183,36 m3 - (0,6x0,6x3,14/4)m2x183,36m VR(DN60) = 183,36 m3 - 51,52 m3 VR(DN60) = 131,54m3 VR(DN80) = 182,00 m3 - (0,8x0,8x3,14/4)m2x182,00m VR(DN80) = 182,000 m3 - 91,44m3 VR(DN 80) = 91,44 m3 VR(DN100) =28,80 m3 - (1,00x1,00x3,14/4)m2x15,00m VR(DN100) = 21,60 m3 - 11,78 m3 VR(DN100) = 9,82 m3
1.3.3	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E A5SENTAMENTO. AF_12/2015	M	286,50	0N(60) = 286,50m
1.3.4	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI5, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALA0O EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	182,00	DN(80) = 182 m
1.3.5	92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDE5 CDLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	15,00	DN(100) = 15,00m
1.3.6	83690	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA E5PE5SURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1,98	Dissipador = 4(unidades) x 1,50m(largura) x 2,20m(comprimento) x 0,15m(espessura) Dissipador = 1,98 m3
1.3.7	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	23,00	BL = 23 unidades
1.4		PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES		-	
1.4.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE E5PESSURA	M2	5.078,48	Área a pavimentar = 5.078,48 m2(rua)
1.4.2	004	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	m2	761,77	Volume de Argila = 5.078,48 m2 x 0,15 cm(espessura) Volume = 761,77 m3
1.4.3	72979	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E A5SENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	5.078,48	Área a pavimentar = 5.078,48 m2(rua)

CAIXA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Nº da Operação	Gestor / Programa / Modalidade / Ação	Município/UF	Localidade
1041530-91	Ministério das Cidades / Planejamento Urbano	Capanema-PR	Rua Tamoios entre a Rua Rio Grande do Norte e Av Ataídes Roberto Escher

Proponente/Tomador	Objeto	Empreendimento/Apelido
Prefeitura Municipal de Capane	Pavimentação Poliédrica com Pedras Irregulares em Vias Públicas Urbanas	Calçamentto Tamoios

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.4.4	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TDNXKM). AF_04/2016	TXKM	7.963,06	Cálculo da DMT = DF(distânica fixa) + DV(distância variável) DF = 0,85 Km(distância da Pedreira até o trecho) DV = 0,253 Km(extendão do trecho)/2 DV = 0,13 Km DMT = 0,85 Km + 0,13Km DMT = 0,98 Km Transporte da Pedra = 5.078,48 m2 x 1,6Ton/m3(densidade da pedra) x 0,98 Km Transporte = 7.963,06 TonxKM
1.4.5	003	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICO	m2	761,77	Volume a compactar = 761,77 m3
1.4.6	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	806,04	Meio fio = 806,04 m
1.5		SINALIZAÇÃO VERTICAL			
1.5.1	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	3,00	03 unidades
1.5.2	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,57	08 unidades x (0,5x0,5x3014/4) 1,57 m2
1.5.3	001	Suporte Metálico Galvanizado D=2,5" com aletas anti giro	UNIDADE	11,00	11 unidades
1.6		SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
1.6.1	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	44,89	Comprimento dos Tubos = 10,13m + 5,98m + 9,58m + 12,19m + 4,23m + 4,00m + 5,00m Comprimento total das tubulações = 56,11 m Volume Escavação = 56,11 m x 0,80m(largura) x 1,00m(altura) Voluem de escavação = 44,89 m3
1.6.2	94317	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	44,89	Comprimento dos Tubos = 10,13m + 5,98m + 9,58m + 12,19m + 4,23m + 4,00m + 5,00m Comprimento total das tubulações = 56,11 m Volume Escavação = 56,11 m x 0,80m(largura) x 1,00m(altura) Voluem de escavação = 44,89 m3
1.6.3	85389	REMOCAO TUBULACAO FF C/ DN 400 A 600MM EXCLUINDO ESCAVACAO/REATERRO	M	56,11	Comprimento dos Tubos = 10,13m + 5,98m + 9,58m + 12,19m + 4,23m + 4,00m + 5,00m Comprimento total das tubulações = 56,11 m
1.6.4	92831	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	4,00	4,00 m no bueiro exsitente
1.6.6	002	Boca de Bueiro Simples Tubular de Concreto(BSTC) 1,50 m	UNIDADE	2,00	02 unidades no bueiro existente
1.7		PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADAS			
1.7.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.193,60	Área de Calçadas = 1.047,37 m2 Área de Rampas = 146,23 m2 Área total = 1..193,63 m2
1.7.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	59,68	Volume = 1.193,60 m2 x 0,05 m(espessura) Volume = 59,68 m3

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: Rubens Luis Rolando Souza

CREA/CAU: RS-88.296/D

ART/RRT: 20171998970

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Data: 19/07/2018

CAIXA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Gestor / Programa / Ação / Modalidade	Município/UF
1041530-91	Ministério das Cidades / Planejamento Urbano	Capanema-PR

Proponente	Objeto	Empreendimento/Apelido
Prefeitura Municipal de Capanema	Pavimentação Poliédrica com Pedras Irregulares em Vias Públicas Urbanas	Calçamentto Tamoios

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
001		Suporte Metálico Galvanizado D=2,5" com aletas anti giro	UNIDADE	abr/16	DER-PR	R$ 310,03
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
		EQUIPAMENTOS				
DER-PR	373200	Betoneira 600 L gazolina	UNIDADE	0,020000	R$ 15,00	R$ 0,30
	346080	Caminhão Carroceria 81/37 6 toneladas	UNIDADE	0,100000	R$ 25,30	R$ 2,53
	301800	Carrinho de Concretagem	UNIDADE	0,150000	R$ 0,13	R$ 0,02
		MÃO DE OBRA				
	210060	Encarregado de Serviço	UNIDADE	1,000000	R$ 44,59	R$ 44,59
	200130	Pedreiro	UNIDADE	0,100000	R$ 21,30	R$ 2,13
	200131	Servente	UNIDADE	0,600000	R$ 16,45	R$ 9,87
	200280	Soldador	UNIDADE	1,000000	R$ 21,32	R$ 21,32
		MATERIAIS				
	13900	Areia	m3	0,024900	R$ 37,75	R$ 0,94
	173200	Cimneto Portland	ton	0,011000	R$ 386,36	R$ 4,25
	161150	Suporte Metálico 2 1/2" x 2,25 mm x 3,00m altura	UNIDADE	1,000000	R$ 211,50	R$ 211,50
	530000	Pedra Britada	m3	0,031200	R$ 27,24	R$ 0,85
	29990	Ferramentas Manuais	UNIDADE	0,150000	R$ 78,20	R$ 11,73
Observações:						

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
002		Boca de Bueiro Simples Tubular de Concreto(BSTC) 1,50 m	UNIDADE	set/16	DER-PR 620500	R$ 3.070,75
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
DER-PR	620500					
		MÃO DE OBRA				
	210060	Encarregado de Serviço	UNIDADE	0,100000	R$ 44,80	R$ 4,48
	200260	Pedreiro	UNIDADE	1,000000	R$ 21,32	R$ 21,32
	200130	Servente	UNIDADE	5,000000	R$ 16,46	R$ 82,30
		ITENS DE INCIDENCIA				
	29990	Ferramentas Manuais	UNIDADE	0,069054	R$ 78,20	R$ 5,40
		SERVIÇOS				
	606000	Concreto Ciclópico FCK 11 Mpa preparo em betoneira e lançamento	m3	6,176000	R$ 212,52	R$ 1.312,52
	602000	Formas de Madeira Comum	m2	27,910000	R$ 58,93	R$ 1.644,73
Observações:						

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
003		COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICO	m2	abr/16	DER-PR	R$ 0,37
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
		EQUIPAMENTO				
	340840	Rolo Vibratório liso autoporp. CS-54 B	m2	0,002014	R$ 148,98	R$ 0,30
		MÃO DE OBRA				
	200130	Servente	m2	0,003808	R$ 18,38	R$ 0,07

1041530-91	Ministério das Cidades / Planejamento Urbano	Capanema-PR
Proponente **Prefeitura Municipal de Capanema**	Objeto **Pavimentação Poliédrica com Pedras Irregulares em Vias Públicas Urbanas**	Empreendimento/Apelido **Calçamentto Tamoios**

Observações:

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
004		**COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO**	**m2**	**abr/16**	**DER-PR**	**R$ 1,55**
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
		MÃO DE OBRA				
	200250	Feitor	m2	0,020000	R$ 41,75	R$ 0,84
	200130	Servente	m2	0,003808	R$ 18,38	R$ 0,07
		ITENS DE INCIDENCIA				
		Ferramentas Manuais	m2	0,015038	R$ 1,33	R$ 0,02
		SERVIÇOS				
	520100	Escavação e carga material 1ª Categoria	m3	4,130000	R$ 0,15	R$ 0,62
		PRODUÇÃO DA EQUIPE: 30,00 m3				

Observações:

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
005		**ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE 1ª CATEGORIA 200-400**	**m3**	**abr/16**	**DER-PR**	**R$ 4,50**
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
		EQUIPAMENTO				
	313180	Caminhão Basculante 1635/45 12m3 leve	m3	0,015507	R$ 114,15	R$ 1,77
	313200	Escavadeira Hidáulica 320D L leve	m3	0,007731	R$ 164,27	R$ 1,27
	311200	Motoniveladota 120-K leve	m3	0,007702	R$ 83,10	R$ 0,64
		MÃO DE OBRA				
	200020	Apontador	m3	0,017952	R$ 8,36	R$ 0,15
	210060	Encarregado de serviço	m3	0,007778	R$ 50,14	R$ 0,39
	200130	Servente	m3	0,015234	R$ 18,38	R$ 0,28
		PRODUÇÃO DA EQUIPE: 129,03 m3				

CAIXA

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO (QCI)

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº Operação	Gestor / Programa / Ação /Modalidade	Município/UF	Localidade
1041530-91	Ministério das Cidades - Planejamento Urbano	Capanema-PR	Rua Tamoios entre a Rua Rio Grande do Norte e Av Ataídes Roberto Escher

Proponente / Tomador	Objeto	Empreendimento / Apelido
Prefeitura Municipal de Capanema	Pavimentação Poliédrica com Pedras Irregulares em Vias Públicas Urbanas	Caiçamentto Tamoios

SALDO A REPROGRAMAR	Repasse (R$)	Contrapartida (R$)
	0,00	0,00

Meta / Submeta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição	Situação	Quantidade	Unidade	Lote de Licitação / nº do CTEF	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	OUTROS (R$)	INVESTIMENTO (R$)	PESO DA META (%)
								(63,53%)	(36,47%)	(0,00%)	(100,00%)	
							TOTAL	245.850,00	141.151,82	-	387.001,82	
1	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	Em Análise	5078,48	m²	Lote 1	245.850,00	141.151,82	-	387.001,82	100,00%
2								-	-	-	-	
3								-	-	-	-	
4								-	-	-	-	
5								-	-	-	-	
6								-	-	-	-	
7								-	-	-	-	
8								-	-	-	-	
9								-	-	-	-	
10								-	-	-	-	
11								-	-	-	-	
12								-	-	-	-	
13								-	-	-	-	
14								-	-	-	-	
15								-	-	-	-	
16								-	-	-	-	
17								-	-	-	-	
18								-	-	-	-	
19								-	-	-	-	
20								-	-	-	-	
21								-	-	-	-	
22								-	-	-	-	
23								-	-	-	-	
24								-	-	-	-	
25								-	-	-	-	

Capanema-PR, 19 de julho de 2018
Local/Data

Américo Belle
Prefeito Municipal

Rubens Luiz Rolando Sousa
Eng° Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n° 11324
CREA PR 96 [illegible]-D

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1041530-91	18271/2017	Cascavel	Ministério das Cidades	Planejamento Urbano	Pavimentação com Pedras Irregulares em Vias Públicas	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
Prefeitura Municipal de Capanema	Capanema/PR	Rua Tamoios	Pavimentação com Pedras Irregulares em Vias Públicas

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)
1	Serviços Preliminares	1
2	Drenagem DN 60 escavação/reate	1
3	Drenagem DN 80 escavação/reate	1
4	Drenagem DN 1000 escavação/re	2
5	Drenagem Bocas de lobo/dissipad	2
6	Serviços Complementares	3
7	Terraplenagem	1
8	Pavimentação entre Rio Grande d	3
9	Pavimentação entre Ceará/Piauí	4
10	Pavimentação entre Piauí/Ataídes	5
11	Calçadas entre Rio Grande do No	6
12	Calçadas entre Ceará/Piauí	6
13	Calçadas entre Piauí/Ataídes Esc	6
14	Sinalização	6

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
Parcela	%	46,16%	7,12%	15,17%	11,39%	7,77%	12,39%
	R$	178.645,50	27.546,12	58.694,49	44.096,03	30.051,45	47.968,23
Acumulado	%	46,16%	53,28%	68,45%	79,84%	87,61%	100,00%
	R$	178.645,50	206.191,62	264.886,11	308.982,14	339.033,59	387.001,82

Capanema/PR, 19 de julho de 2018
Local e Data

Responsável Técnico: Rubens Luis Rolando
CREA / CAU: RS 88.296/D

Rubens Luis Rolando de Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema/PR
Matrícula nº 1963-1
CREA/RS 88.296/D

27.477 v005 micro

MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES , DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AVENIDA ATAÍDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRSTÓVÃO EM CAPANEMA-PR

DISPOSIÇÕES GERAIS

01-EXECUÇÃO DA OBRA

A execução da obra ficará a cargo da empresa vencedora da licitação, através de competente Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA.

Para a execução dos serviços serão necessários os procedimentos normais de regularização da situação do responsável técnico pela empresa construtora junto à Prefeitura Municipal, com relação às licenças e alvarás.

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

01 – NORMAS GERAIS

Estas especificações de materiais e serviços são destinados à compreensão e complementação dos Projetos Executivos da

Construção e Orçamento de custos, sendo parte integrante do Contrato da Obra.

Eventuais dúvidas de interpretação entre as peças que compõe o Projeto de Construção deverão ser discernidas, antes do início da obra, com a Divisão e Engenharia da Prefeitura Municipal e com o engenheiro autor dos projetos.

Eventuais alterações de materiais e/ou serviços propostos pela empreiteira, no caso único da impossibilidade da existência no mercado, deverão ser previamente apreciados pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Capanema, com anuência expressa do autor dos projetos que poderão exigir informações complementares, testes ou análise para embasar Parecer Técnico final à sugestão alternativa.

Os materiais e/ou serviços não previstos nestas Especificações constituem casos especiais, devendo ser apreciados pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal, com acompanhamento do engenheiro autor dos projetos. Neste caso, deverão ser apresentados Memorial Descritivo do Material/Serviço, Memorial Justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa que permita comparação com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações complementares.

Todas as peças gráficas deverão obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura Municipal, devendo ser rubricados pelo profissional responsável técnico pela empresa proponente.

São obrigações do empreiteiro e do Responsável Técnico:

Obedecer as normas e leis de higiene e segurança no trabalho;

Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados à Prefeitura Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão;

Empregar operários devidamente especializados nos serviços a serem executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra;

Manter atualizados no canteiro de Obras, Alvará, Certidões, Licenças, evitando interrupção por embargos;

Manter serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma;

Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro;

Providenciar a colocação das placas exigidas pelo Governo do Estado, Prefeitura Municipal/CREA e órgão financiador;

Apresentar ao final da obra, a documentação prevista no Contrato de Empreitada Global.

Para execução da obra, objeto destas especificações ficará a cargo da firma empreiteira o fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e o que se fizer necessário para o bom andamento dos serviços.

02 – FISCALIZAÇÃO

2.1. A fiscalização dos serviços será feita pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal, através de seu responsável técnico, em qualquer ocasião, devendo a empreiteira submeter-se ao que lhe for determinado.

2.2. A empreiteira manterá na obra, à testa dos serviços e como seu preposto, um profissional devidamente habilitado residente, que as representará integralmente em todos os atos, de modo que as comunicações feitas ao preposto serão consideradas como feitas ao empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto será considerada como tomada de empreiteiro. O profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa, deverá estar registrado no CREA – PR como Responsável Técnico pela Obra.

2.3. Fica a empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela fiscalização, sem haver necessidade declaração quanto aos motivos. A substituição deverá ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

2.4. Poderá a fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como mandar refazê-los, quando os mesmos não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da empreiteira.

2.5. A presença da fiscalização na obra, não diminui a responsabilidade da empreiteira perante a legislação pertinente.

2.6. Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos que interessem aos serviços, bem como um livro Diário de Obras.

03 – MATERIAIS E MÃO DE OBRA

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, os padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas referentes aos materiais já normalizados, mão de obra e execução de serviços especificados, serão rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a fiscalização exigir análise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira.

3.3. A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das obras de propriedade da Prefeitura Municipal, assim como das já construídas e ainda não recebidas definitivamente, serão de total responsabilidade da empreiteira.

04 – INSTALAÇÃO DA OBRA

4.1. Ficarão a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, mão de obra, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios tais como: barracão, andaimes, cercas, instalações de sanitários, de luz, de água, etc.

4.2. A fim de que a Fiscalização aprove a localização dessas instalações provisórias, deverá a empreitada apresentar as respectivas plantas de locação antes do início dos trabalhos.

Na conclusão dos materiais e ela pertencentes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias corridos. Se não o fizer, poderá a Fiscalização efetuar sua retirada, sendo que as despesas decorrentes serão debitadas à empreiteira, não se responsabilizando a Prefeitura Municipal pelo destino e conservação dos mesmos.

4.3. Deverão ser executadas as instalações provisórias de sanitários necessárias ao atendimento do pessoal da obra.

4.4 A placa de obra será em chapa de aço galvanizado nº 26, nas medidas padrões de 2,00m x 1,25m de área e pintadas nas cores específicas pelo Governo Municipal, conforme figura extraída do manual de placas do Governo Federal.



Área total
• Proporção de 8Y x 5Y

Dimensões mínimas
• 2m x 1,25m
Nota: A placa deve possuir tamanho adequado para visualização no canteiro de obras.

Área da marca do Governo Federal (A):
• Cor de fundo: Branca

Área do nome da obra (B):
• Cor de fundo: Verde • Pantone 576
• Fonte: Verdana Bold, caixa mista
• Cor da Fonte: Branca

Área de informações da obra (C):
• Cor de fundo: Verde • Pantone 7483
• Fonte: Verdana Bold e Regular, caixa mista
• Cor da Fonte: Amarelo • Pantone 107 e Branca
• Entrelinhas: 1,2
• Espaço entre letras: 0

Área das assinaturas (D):
• Cor de fundo: Branca

05 | Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1 - DISPOSITIVO DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA

1.1 – DEFINIÇÃO

Entende-se por dispositivo de drenagem superficial urbana o conjunto de mecanismos que visam a coleta e remoção de águas pluviais precipitadas nas áreas urbanizadas, dispondo-os em local adequado, de modo a evitar erosões, inundações, desbarrancamentos ou outros danos, levando-se em consideração parâmetros básicos de combate à erosão e observando-se a topografia do terreno e dados pluviométricos e são constituídos por:

Rede Coletora: É o dispositivo que conduz as águas pluviais através de diâmetros de tubulações adequadas à vazão a ser escoada. O assentamento será feito preferencialmente no passeio (lateral da pista).

1.1.1 - Escavações

As escavações das valas serão executadas de acordo com os gabaritos de canalização e, em princípio será adotado o diâmetro nominal dos tubos de 600 mm, 800 mm e 1000 mm.

Caso necessário os taludes de valas deverão ser devidamente escorados. Sempre que o material for de baixo poder de suporte será exigido um lastro de brita com 10 cm no fundo da vala. Nas redes

sob a pista de rolamento este lastro é obrigatório independentemente do tipo de solo.

Os materiais retirados da abertura das valas deverão ser depositados a distância superior a 0,50 m da borda da vala e, quando de boa qualidade, servirão para reaterro das canalizações, desde que aprovados pela fiscalização.

1.1.2 – Reaterro

O reaterro deverá ser executado em camadas não superior a 50 cm compactadas mecânicamente pela própria retro-escavadeira, com material adequado aprovado pela fiscalização.

O material excedente das escavações será considerado Bota Fora e o local de depósito ficará ao encargo da empreiteira, podendo ser aproveitado para regularização dos passeios e contenção lateral dos meios fios.

1.1.3 – Caixas Coletoras

Boca de lobo: é o elemento de drenagem pluvial urbana que visa captação das águas pluviais e a sua condução à rede coletora, localizam-se nas extremidades das quadras, de forma que não permita indefinição no escoamento superficial, evitando a formação de zonas mortas.

Serão executadas da seguinte forma:

Solo previamente apiloado para lançamento de concreto magro;

Alvenaria de tijolos maciços de pé assentados com argamassa cimento e areia 1:4;

Revestimento interno será em chapisco no traço 1:3;

Tampa em Concreto Armado.

1.2. MATERIAIS

Os materiais utilizados deverão satisfazer as especificações do DER-PR, sendo estes:

Cimento: "Recebimento e aceitação de Cimento Portland Comum e Portland de Alto Forno".

Agregado miúdo: "Agregado miúdo para concreto".

Agregado graúdo: "Agregado graúdo para concreto".

Água: "água para concreto"(insalubre, inodora e incolor)

Concreto: "Concreto e argamassa"

Aço: "Armaduras para concreto armado

Formas: "Formas e cimbres".

Os tijolos devem seguir as normas da ABNT, NBR 7170.

O critério de medição é por unidade.

1.3 – EQUIPAMENTOS

A escavação das valas para assentamento dos tubos será executado com retro-escavadeira e a concha com largura compatível ao diâmetro da tubulação. A colocação dos tubos dentro das valas faz-se com a retro-escavadeira ou pá carregadeira, dependendo da situação e do diâmetro do tubo.

1.4 – DISSIPADOR DE ENERGIA

O dissipador de energia é o dispositivo que visa promover a redução da velocidade de escoamento nas entradas ou saídas ou mesmo ao longo da própria canalização, no nosso caos é na saída, de modo a reduzir os efeitos da erosão nas áreas adjacentes ou nos próprios dispositivos de drenagem pluvial.

Os dissipadores de energia serão feitos nas saídas das tubulações como mostra em projeto de drenagem, sendo executados na sua confecção com pedras de mão com diâmetro de 10 a 15 cm, com preenchimento dos vazios em concreto de cimento .ciclópico.

1.5 – ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS

As condições para aceitação dos serviços levarão em consideração os seguintes itens:

Serão avaliados os alinhamentos, declividades, cotas dos tubos e dispositivos de captação e inserção, usando os métodos topográficos correntes;

2.0 DESMATAMENTO E LIMPEZA (TERRAPLENAGEM RUAS E CALÇADAS)

Os serviços compreendem as operações desmatamento, destocamento e limpeza, nas áreas destinadas a implantação do corpo estradal e naquelas correspondentes aos empréstimos das obstruções naturais, por ventura existentes, tais como camada vegetal, arbustos, tocos, raízes, entulhos e eventuais matacões soltos de pequeno porte.

Serão derrubadas todas as árvores que se acharem compreendidas pelos off-sets com um acréscimo de 2,00 m para cada lado podendo ser reduzido a critério da Fiscalização.

A limpeza compreenderá as operações de escavações e remoção da camada orgânica, na espessura do projeto ou a critério da fiscalização.

Os materiais provenientes do desmatamento da limpeza serão removidos ou estocados conforme indicação da fiscalização.

3 – PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

3.1 – MINUTA DE PROJETO

Pavimentação de vias urbanas com pedras irregulares, com área total de **5.078,48 m2**. Conforme explicitado abaixo.

3.2 – DEFINIÇÃO

É o pavimento caracterizado pela cravação por percussão, de pedras irregulares justapostas, assentes sobre um colchão de solo coesivo, confinadas lateralmente por meio fio e rejuntadas com solo coesivo.

3.3 – MATERIAIS

A pedra irregular não apresenta uma forma constante, como o próprio nome indica, e portanto, pretende-se em cada tipo de jazida limitar o campo de variações, de maneira que no seu conjunto a superfície pavimentada apresente uma determinada homogeneidade.

Quanto às dimensões das pedras algumas medidas deverão ser observadas, tais como: seção de topo circunscrito variando de 0,05 a 0,10m e altura de 0,13 a 0,15m, obtida a partir de maciços rochosos extraídos de pedreiras indicadas no projeto ou pela fiscalização.

O meio fio será em concreto pré-moldado (Fornecido pela prefeitura), nas dimensões 10 x 25 x 100 cm (conforme detalhe em projeto anexo); e serão fornecidos pela empresa vencedora.

Para o assentamento das pedras será usado um colchão de argila com uma camada de 15,00 cm de espessura, nesses 15,00 cm os últimos 5,00 cm serão o rejunte (camada final).

O critério de medição é por metro quadrado.

3.4 – EQUIPAMENTOS

Deverá estar na obra permanentemente a disponibilidade da obra pelo menos:

* Trator de esteira de porte médio (na jazida de argila e pedreira);
* Retroescavadeira
* Carregadora frontal;
* Caminhão basculante;
* Rolo liso vibratório com peso mínimo de 10ton;
* Ferramentas manuais (carrinhos, pás, picaretas, enxadas, soquetes, martelos, etc).

3.5 – EXECUÇÃO

O subleito deverá ser escarificado, regularizado e compactado. Deverão ser executados cortes, aterros que fizeram-se necessários e

serão executados pela EMPRESA EXECUTORA supervisionada pelo departamento de engenharia da Prefeitura Municipal de Capanema.

3.6 MEIO-FIO

Assenta-se o meio fio em valas laterais escavadas manualmente com profundidade aproximada de 20 cm e o mesmo será escorado com argila proveniente de fora ou resíduo da escavação das tubulações dede que autorizado pela fiscalização numa largura mínima de 1,50 m e toda a extensão das ruas. O meio fio terá as dimensões de 100x15x13x20 cm(comprimento, largura inferior, largura superior e altura).

3.7 REGULARIZAÇÃO

O material a ser utilizado como base deverá ser espalhado manualmente, de modo a atingir uma espessura mínima final de 0,15m e coincidente com o piso do meio fio.

3.8 COLXÃO DE ARGILA

As pedras deverão ser assentadas com as faces de rolamento cuidadosamente escolhidas, entrelaçadas e bem unidas, de modo que não coincidam as juntas vizinhas, observando-se um espaçamento entre as pedras não superior a 1,50cm.

3.9 COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO

A compactação será executada após o rejuntamento, progredindo dos bordos para o eixo nos trechos em tangente, e do bordo interno para o externo nos trechos em curva. Em cada passada, o equipamento deverá recobrir, no mínimo, metade da faixa anteriormente compactada.

Após a rolagem final, o pavimento está apto para receber o tráfego.

A pavimentação não deverá ser executada quando o material do colchão estiver saturado.

O critério de medição é por metro quadrado.

3.10 – ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS

O pavimento pronto deverá ter a forma definida pelo alinhamento, perfis, dimensões e seção transversal estabelecidos pelo projeto.

Durante todo o período de execução do pavimento e até o seu recebimento definitivo, os trechos em construção e o pavimento pronto deverão ser protegidos contra os elementos que possam danificá-los e devidamente sinalizados.

Os materiais só poderão ser empregados após autorização da fiscalização.

Todo e qualquer material rejeitado pela fiscalização deverá ser retirado imediatamente do canteiro de obras.

O acabamento deverá ser julgado satisfatório pela fiscalização.

Deverá a empreiteira apresentar a esta fiscalização um diário de obra relatando os acontecimentos no decorrer da obra e deverão ser vistados pelo responsável técnico da empreiteira e o engenheiro fiscal da prefeitura.

4.0 CALÇADAS

Será procedida a remoção da camada vegetal existente na largura da calçada numa espessura de 5,00 cm, bem como algumas árvores que se fizerem necessários também deverão ser removidas.

Deverá ser executada a regularização e compactação do subleito após a remoção da camada superficial.

Será procedida a execução da calçada em concreto FCK 15 Mpa na espessura de 5,00 cm devidamente reguada, nivelado com acabamento bruto e com juntas de dilatação a cada 3,00m.

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Existe no corpo estradal algumas tubulações antigos sem funcionalidade nenhuma ou seja sem captar água e estando praticamente no meio da pista a ser pavimentada.

Será procedida a escavação, remoção dessas tubulações e reaterro compactada das valas provenientes de tais serviços.

No projeto de terraplanagem mostra entre as estacas 11 e 12 um bueiro existente que está no ponto mais baixo captando todas as águas dessa bacia de contribuição, entretanto como vai ser alargado a pista é necessário que a jusante do bueiro se prolongue a sua tubulação que é de 1500 mm em mais 4,00 m, após isso deverá ser feito duas alas a montante e a jusante para conter a erosão.

As cabeceiras (alas)serão de concreto ciclópico (concreto magro preenchido de rachão) ou com blocos de concreto com consumo de cimento 210Kg/m3 e terão as suas dimensões estabelecidas em projeto em anexo.

A execução das bocas de montante e jusante deverão ser atendidos os procedimentos executivos previstos. atendendo as imposições geométricas do projeto de drenagem especifico.

Concluídas as bocas, deverão ser verificadas as condições de canalização a montante e jusante da obra. Todas as erosões encontradas e que possam a vir a comprometer o funcionamento da obra deverão ser tratadas com enrrocamento de pedra arrumada ou por soluções específicas do projetista. Deverão ser executadas as necessárias valas de derivação, a jusante, e bacias de captação , a montante, de forma a disciplinar a entrada e saída do fluxo d´água no bueiro.

O controle geométrico constituirá na conferencia por métodos correntes de alinhamento, esconsidades (quando houver),

declividades, comprimentos e cotas dos bueiros executados e suas respectivas bocas.

6.0 - LIMPEZA GERAL

No término da obra deverá ser efetuada a limpeza geral e a desmobilização, sendo a obra entregue em perfeitas condições de uso.

Nesta ocasião será formulado Atestado de Entrega Provisória de Obra pela Fiscalização Municipal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Toda dúvida existente na compreensão das especificações de serviço será dirimida pelo Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver determinada nos Projetos específica, neste Memorial e na falta de orientações de algum tipo de material ou serviço, a fiscalização municipal terá supremacia e autoridade para identificar os mesmos, dentro dos custos constantes do orçamento anexo.

Todos os serviços terão como parâmetros básicos de execução, as especificações constantes nas normas da Associação Brasileira de Norma Técnica e as especificações dos fabricantes dos produtos a serem aplicados.

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificações da ABNT, para os tipos de serviços previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptações e contradições resolvidas pelo engenheiro autor dos projetos e pela fiscalização do Município.

Toda e qualquer modificação do tipo de material e serviço constantes dos documentos que integram o Projeto Executivo de Construção de **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES , DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AVENIDA ATAÍDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRSTÓVÃO EM CAPANEMA-PR** , somente poderão ser executados com autorização expressa do Engenheiro Fiscal do Município. A utilização dos materiais para a construção da presente obra fica sujeita a fiscalização e aprovação prévia do município, através de seu engenheiro, bem como toda a fiscalização e medição dos serviços ficarão sob sua responsabilidade.

Capanema, 19 de julho de 2018

Eng.Rubens Luis Rolando Souza
Responsável Técnico
CREA PR 88.296/D

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1903-1
CREA/PR 88.296/D

MEMORIAL DESCRITIVO PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES , DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AVENIDA ATAÍDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRSTÓVÃO EM CAPANEMA-PR

INTRODUÇÃO

Este documento apresenta detalhadamente as especificações técnicas da sinalização horizontal e vertical, a serem implantadas no Município de Capanema/PR.

Além de especificações dos materiais pertinentes, apresentaremos também detalhes de implantação e aplicação dos materiais.

Para a elaboração deste documento fora utilizado o Código de Trânsito Brasileiro, Manual de Sinalização do DETRAN / PR, Guia Brasileiro de Sinalização Turística (EMBRATUR) e Manual de Sinalização do DNIT.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Segundo as especificações técnicas adotadas pelo Código de Trânsito Brasileiro, Manual de Sinalização do DETRAN / PR e Guia Brasileiro de Sinalização Turística (EMBRATUR).

2.0 SINALIZAÇÃO VERTICAL

É um subsistema da sinalização viária, que se utiliza placas, onde o meio de comunicação (sinal) está na posição vertical, fixado ao lado ou suspenso sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente e, eventualmente, variáveis, mediante símbolos e/ou legendas pré-reconhecidas e legalmente instituídas. As placas têm por finalidade aumentar a segurança, ajudar a manter o fluxo de tráfego em ordem e fornecer informações aos usuários da via. Elas são necessárias para:

Regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições que governam o uso da via;
Advertir os condutores sobre os perigos existentes na via, alertando também sobre a proximidade de escolas, passagens de pedestres, etc;
Indicar direções, logradouros, pontos de interesse, etc, de forma a ajudar o condutor em seu deslocamento.

A eficiência das placas depende principalmente dos seguintes fatores:

Colocação correta no campo visual;
Propriedade e clareza da mensagem transmitida;
Entendimento por parte do condutor.

2.1 Placa de regulamentação e advertência

2.1.1 Características da placa

DIMENSÕES MÍNIMAS:

Regulamentação: Círculo de 0,50m de diâmetro
Octógono de 0,25m de lado
Triângulo equilátero de 0,75m de lado

Advertência: Quadrado de 0,50m de lado

ESPECIFICAÇÕES:

Chapa de aço 1010/1020, bitola 18, galvanizada, fabricada de acordo com o disposto na NBR-11904 da ABNT.

TRATAMENTO:

Após corte e furação a chapa deverá ser desengraxada, decapada e fosfatizada, recebendo "PRIMER" anti-oxidante compatível com o sistema a ser utilizado na confecção da placa.

2.1.2 Características do símbolo

DIMENSÃO:

Regulamentação:	Círculo	Diâmetro do círculo	0,50 m
		Orla interna	0,05 m
		Tarja de proibição	0,05 m

(Tarja de proibição formando ângulo de 45° com o diâmetro horizontal, partindo do setor superior esquerdo e chegando ao setor inferior direito ao círculo)

Advertência	Quadrado	Lado	0,50 m
		Orla externa	0,01 m
		Orla interna	0,02 m

Observação: Para placas com dimensões acima do mínimo pré-estabelecido, os símbolos deverão variar proporcionalmente.

CORES

Regulamentação:	Círculo	Fundo	branca
		Tarja	vermelha
		Orla	vermelha
		Símbolo	preta
		Letras	preta
Advertência:	Quadrado	Fundo	amarela
		Símbolo / legenda	preta
		Orla externa	amarela
		Orla interna	preta
		Letras	

2.1.3 Especificações

ACABAMENTO

FRENTE:

Placas:, R-2, , R-19 (40Km/h),

Os modelos das placas acima citados deverão ser totalmente refletivos com impressão pelo processo "SILK SCREEN" sobre a película refletiva de micro esferas inclusas, sem recortes ou montagem e com utilização de pastas (tintas) transparentes especiais sobre essa película refletiva de maneira a proporcionar a forma e a cor correta durante todo o dia e a noite com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.

As pastas (tintas) devem fornecer um desempenho equivalente ao das películas refletivas de micro-esferas inclusas, quando sem impressão, nas respectivas cores.

A impressão com as pastas (tintas) deve apresentar performance efetiva relativa a vida útil da película refletiva de micro-esferas inclusas, ou seja: 07(sete) anos. A impressão dos sinais sobre a película refletiva de micro-esferas inclusas, não deve apresentar

borrões, marcas da tela de impressão, riscos, serrilhas, sujeiras, grumos de pigmentação e outros corpos estranhos.

As películas refletivas de micro-esferas inclusas branca e amarela, substratos para confecção de sinais impressos de regulamentação e de advertência, devem apresentar os seguintes índices de brilho refletivo:

ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO		ÂNGULO DE ENTRADA	VALORES DE BRILHO EM CANDELA.LUX/m^2	
BRANCA	AMARELA	0,2°	-4°	70
0,2°		30°	30	22

As películas refletivas com micro-esferas inclusas deverão apresentar as seguintes características:

Durabilidade e desempenho, tanto sem impressão como com impressão com pastas (tintas), satisfatória de 07(sete) anos.
Adesão em chapa de alumínio, conforme a Norma ASTM-D-903-49.
Resistência à abrasão - Teste ASTM-D-968/81, óxido de alumínio branco (massa específica 3,90 - 3,97 Kg/litro), referido a película seca de 300 micra, com um mínimo de 80 micra.

VERSO:

Pintura em PRETO semi-fosco, com esmalte sintético especial de primeira linha ou similar, com secagem em estufa a 140° C.
SISTEMA DE FIXAÇÃO

Através de dois parafusos de cabeça sextavada, zincado eletroliticamente, diâmetro de 8 mm, comprimento de 75 mm, dotado de porca e duas arruelas também zincadas eletroliticamente.

2.1.4 Garantias


O fornecedor deve dar garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação da chapa, contra defeitos de pintura, impressão, aplicação de película e desgaste do sistema de fixação.

Para acompanhamento da performance do material instalado, o fornecedor deverá entregá-lo com algum tipo de identificação indelével do fabricante ou revendedor.


A identificação deverá apresentar dimensões não superiores a 25(vinte e cinco) cm2, confeccionada em material à escolha do fabricante: etiqueta plástica, impressão em "silk screen", impressão em baixo relevo, etc.

2.1.5 Observações


Para quaisquer informações complementares, consultar a Coordenadoria Técnica do DETRAN/PR.

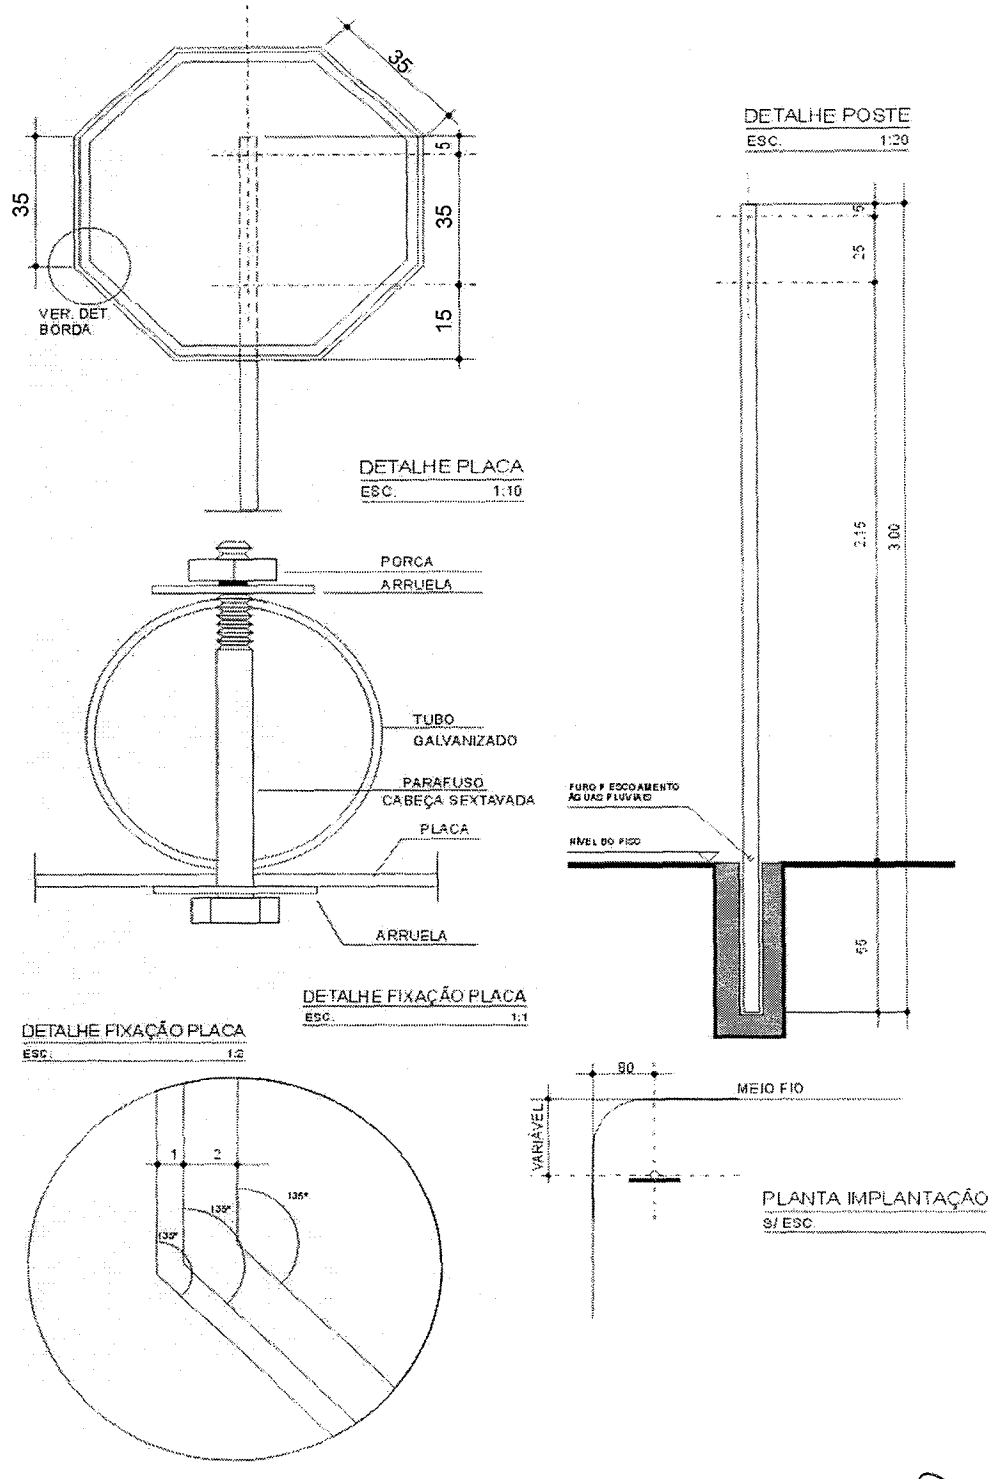


Detalhe SV 1 - Placa de regulamentação - octogonal
Fonte: Divisão de Sinalização / COTEC / DETRAN-Paraná

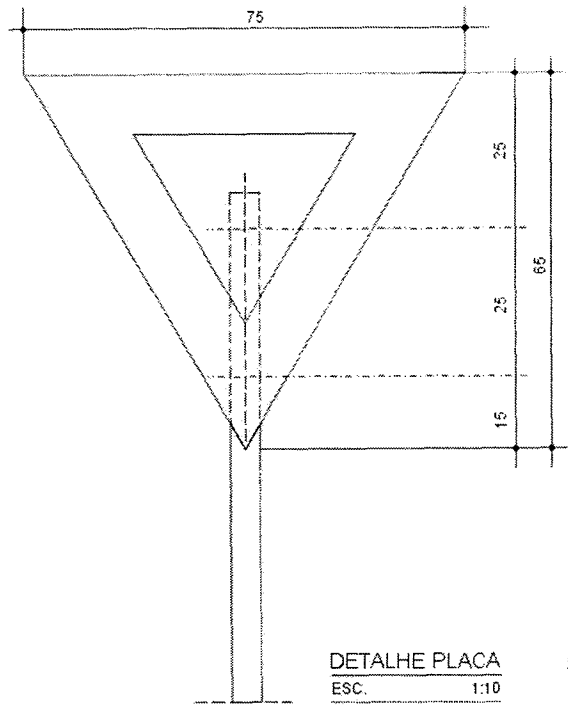


DETALHE PLACA
ESC. 1:10

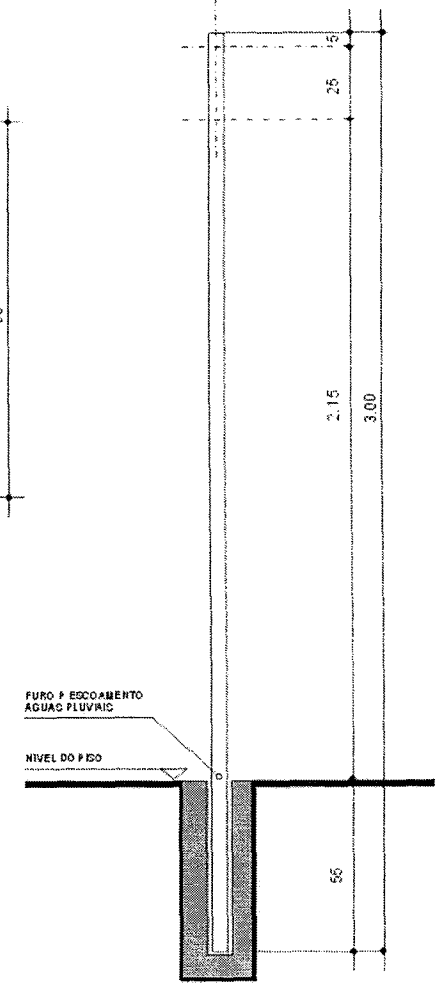

DETALHE POSTE
ESC. 1:20

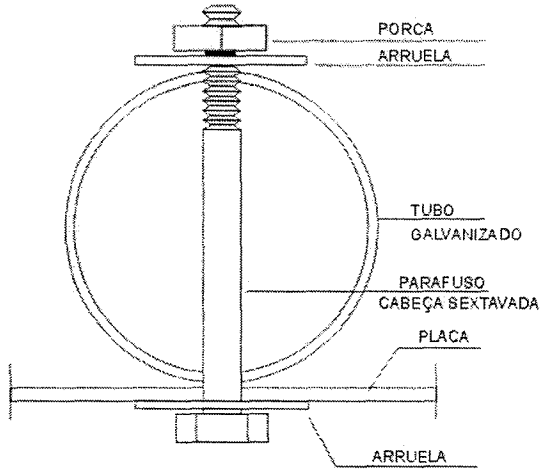


DETALHE FIXAÇÃO PLACA
ESC. 1:1

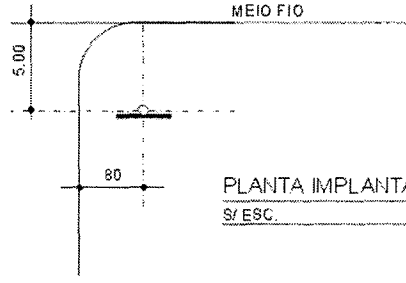


PLANTA IMPLANTAÇÃO
S/ ESC.

Detalhe SV 2 - Placa de regulamentação - triangular
Fonte: Divisão de Sinalização / COTEC / DETRAN-Paraná

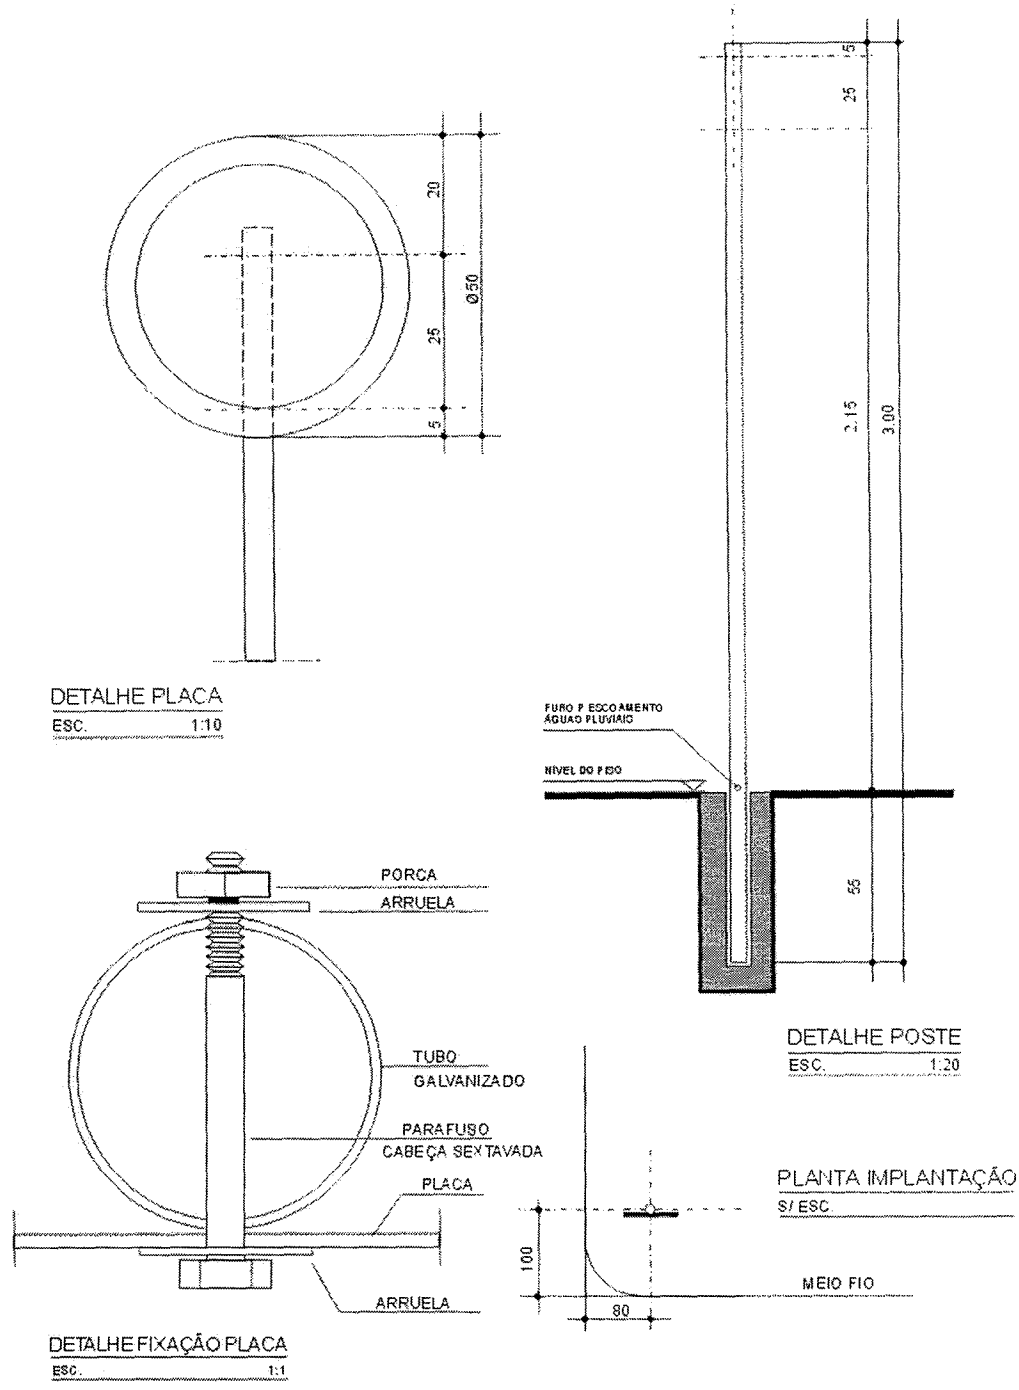

Detalhe SV 3 - Placa de regulamentação - circular
Fonte: Divisão de Sinalização / COTEC / DETRAN-Paraná

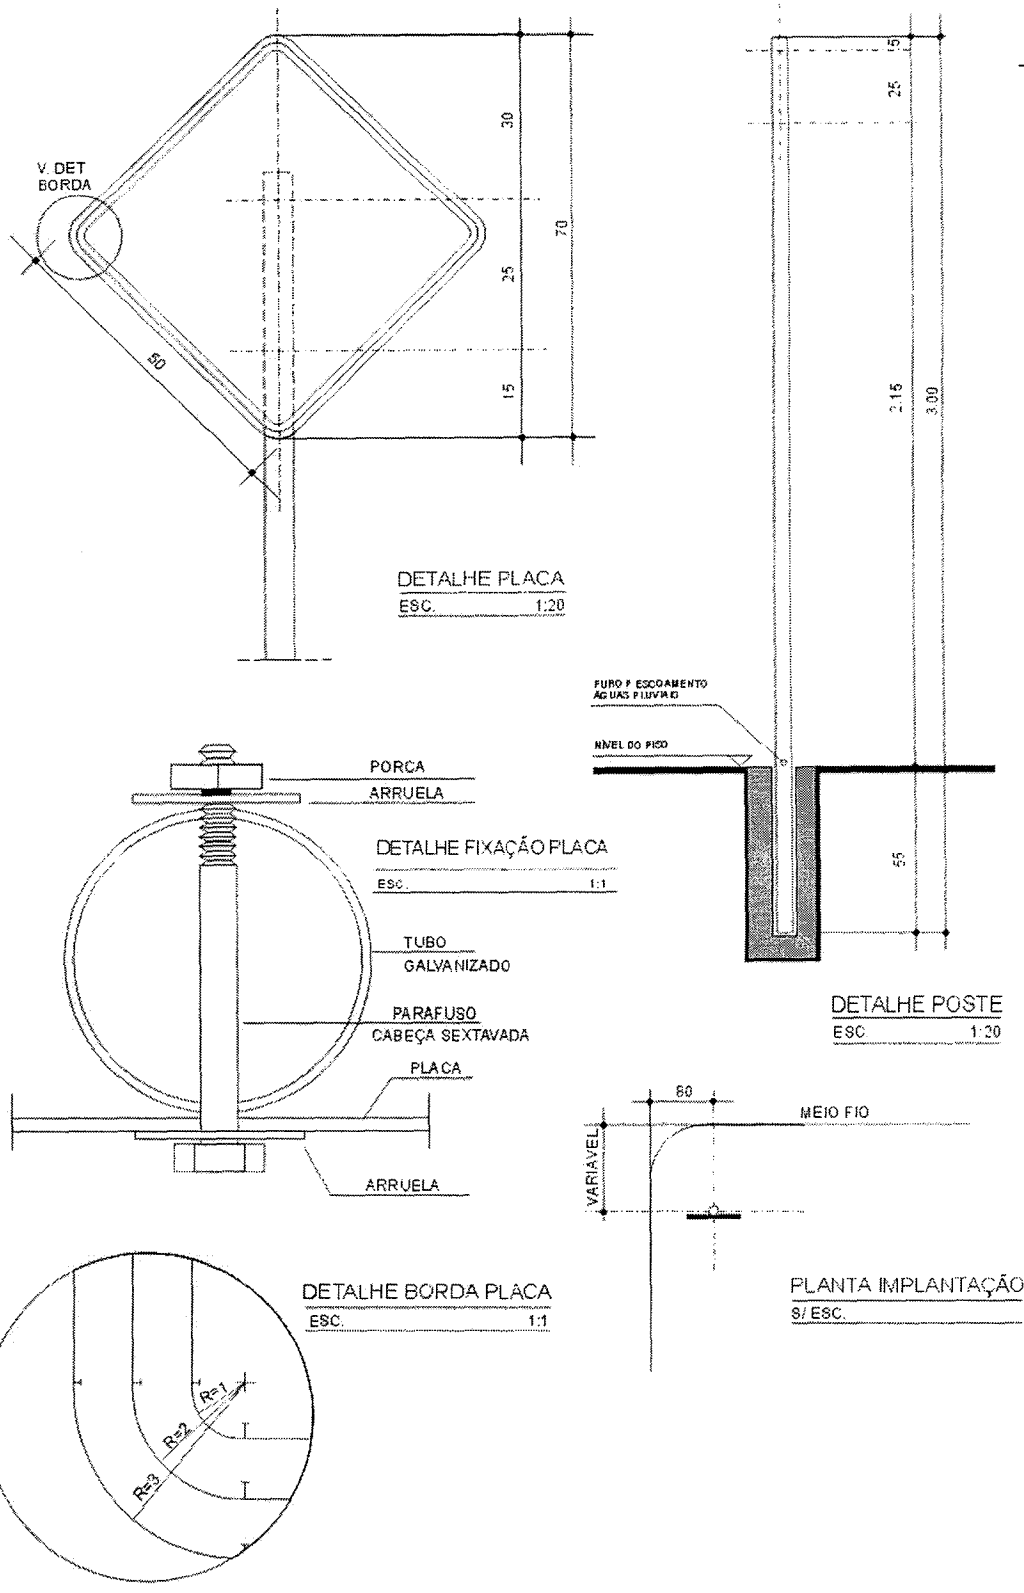

Detalhe SV 4 - Placa de advertência / quadrada
Fonte: Divisão de Sinalização / COTEC / DETRAN-Paraná

2.5 Poste de suporte

2.5.1 Características do equipamento

DIMENSÃO:

Tubo metálico, com seção circular, espessura de parede de 2,50 mm (dois e meio milímetros), comprimento de 3 m (três metros), com sistema ante giro constituído por aletas metálicas fixadas a 30cm (trinta centímetros) da base do poste.

2.5.2 Especificações

Tubo metálico em aço 1010/1020.

TRATAMENTO:

Após corte e furação o poste de suporte deverá ser zincado a fogo.

FIXAÇÃO:

Em uma sapata de concreto, moldada "in loco".

2.5.3 Garantias

O proponente deve garantir os seus equipamentos por um prazo de 12 (doze) meses contra defeito de fabricação.

2.5.4 Observações

A firma vencedora do fornecimento do poste deverá entregar o equipamento com os furos conforme projetos.


Para quaisquer informações complementares consultar a Coordenadoria Técnica do DETRAN/PR.

Capanema, 19 de julho de 2019


Eng.Rubens Luis Rolando Souza
Responsável Técnico
CREA PR 88.296/D


1x1 / 23


Boca de Lobo: (Existente á Retirar)


03


Dissipador de Energia:(A Executar)


04


Alas P/ DN 1500mm: (A Executar)


02


Curvas de Nivel de Metro em Metro




Calçamento Existente



Ponto de Esgoto Residencial



Posto de Visita - Esgoto



PREFEITURA MUNICIPAL

SAÚDE PÚBLICA

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

OBRA:

PROJETO PAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES
e DRENAGEM PLUVIAL
Rua Tamoios - São Cristóvão - Capanema Pr

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
RUBENS L.R. SOUZA
CREA RS-88296-D
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

ÁREA TOTAL: 5.078,48m²

LOCALIDADE/BAIRRO: São Cristóvão

Desenvolvimento Proj.: Evandro C. Malinski

ESCALA: INDICADA

DATA: Março de 2017

Américo Bellé
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

FOLHA: 01-03

PREFEITURA MUNICIPAL

SAÚDE PÚBLICA

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

OBRA:

PROJETO PAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES
e DRENAGEM PLUVIAL
Rua Tamoios - São Cristóvão - Capanema Pr.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RUBENS L.R. SOUZA
CREA RS-88296-D
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

ÁREA TOTAL: 5.078,48m²

ESCALA: INDICADA

DATA: Março de 2017

LOCALIDADE/BAIRRO: São Cristóvão

Desenvolvimento Proj.: Evandro C. Malinski

PREFEITO MUNICIPAL
Américo Belle
Prefeito Municipal

FOLHA: 02-03

PREFEITURA MUNICIPAL

SAÚDE PÚBLICA

PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS E RAMPAS

OBRA:

PROJETO PAVIMENTAÇÃO

CALÇADAS E RAMPAS EM CONCRETO

Rua Tamoios - São Cristóvão - Capanema Pr.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RUBENS L.R. SOUZA
CREA RS-88296-D
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

ÁREA TOTAL: 1.193,62m²

ESCALA: INDICADA

DATA: Março de 2017

LOCALIDADE/BAIRRO: São Cristóvão

Desenvolvimento Proj.: Evandro C. Malinski

PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 03-03

Fls. 071

Fls. 072

PREFEITURA MUNICIPAL	SAÚDE PÚBLICA

SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA

OBRA:

PROJETO PARCIAL
DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA

Rua Tamoios - São Cristóvão - Capanema Pr.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RUBENS L.R. SOUZA
CREA RS-88296-D
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

ÁREA TOTAL:

LOCALIDADE/BAIRRO: São Cristóvão

Desenvolvimento Proj.: Evandro C. Malinski

FOLHA: ÚNICA

ESCALA: INDICADA

DATA: Março de 2017

PREFEITO MUNICIPAL

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Fls. 073

Capanema - PR, 23 de julho de 2018

Assunto: Tomada de Preços

DE: Prefeito Municipal

PARA:
- Departamento de Contabilidade;
- Procuradoria Jurídica;
- Pregoeiro e Equipe de Apoio à Licitação.

Preliminarmente à autorização solicitada mediante Protocolo nº 13 o presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com vistas:

1 - À indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer frente a despesa;

2 - À elaboração de parecer sobre a possibilidade do procedimento licitatório, indicando a modalidade e o tipo de licitação a serem adotados no certame;

3 - À elaboração da minuta do instrumento convocatório da licitação e da minuta do contrato;

4 - Ao exame e aprovação das minutas indicadas no item 3 acima.

Atenciosamente,

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Capanema - PR, 23 de julho de 2018

Assunto: Tomada de Preços

DE: Departamento de Contabilidade
PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

Em atenção ao ofício encaminhado por Vossa Excelência em 23/07/2018 informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do Certame, para aquisição constantes no protocolo número supra, sendo que o pagamento será efetuado através da Dotação Orçamentária;

DOTAÇÕES					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2018	1350	08.002.15.451.1501.1151	000	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
2018	1355	08.002.15.451.1501.1151	870	4.4.90.51.00.00	Do Exercício

Respeitosamente,

Cleomar Walter
Téc. Cont. CRC. PR-046483/O-2
CPF: 723.903.959-53

Tramitação do Processo

Processo: **1961 / 2018** Data: **01/08/2018 09:30** Situação: **Encaminhado**

Requerente: **RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA** CPF: **51335883053**

Contato: **RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA - Tel: 46-9919-9360**

Assunto: **SOLICITAÇÃO PARA SETOR DE PLANEJAMENTO - Versão: 4**

Descrição: MEMORANDO INTERNO 25/2018

Ocorrência: 8 Data: 01/08/2018 09:30:00 Previsão: 14/08/2018

De: ROMANTI EZER BARBOSA Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI

Etapa: LICITAÇÃO

Anexo:

Descrição: Em complementação ao evento anterior, solicito seja anexado no PA cópia do Termo de Acordo de medidas compensatórias e mitigatorias firmado entre o Município de Capanema e o CEBI, tendo em vista que parte dos recursos desta obra está previsto como uma ação compensatoria.

Att.

Romanti Barbosa
Procurador Municipal

Ocorrência: 7 Data: 01/08/2018 09:27:00 Previsão: 22/08/2018

De: ROMANTI EZER BARBOSA Para: RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA

Etapa: PLANEJAMENTO

Anexo:

Descrição: Procedi as correções no arquivo, que seguem destacadas em vermelho. Solicito a completa montagem do PA, assinado, numerado e rubricado. Após, retorne para emissão de Parecer Jurídico previo a publicação. Att. Romanti Barbosa Procurador Municipal

Ocorrência: 6 Data: 24/07/2018 10:30:00 Previsão: 06/08/2018

De: PEDRO AUGUSTO GLUSZEWICZ SANTANA Para: ROMANTI EZER BARBOSA

Etapa: PROCURADORIA

Anexo:

Descrição: ENCAMINHO ESSE PA PARA ANALISE E EMISSÃO DO PARECER JURIDICO DO EDITAL

Ocorrência: 5 Data: 24/07/2018 10:29:00 Previsão: 14/08/2018

De: PEDRO AUGUSTO GLUSZEWICZ SANTANA Para: PAULO FERNANDO LAZZARETI ORSO

Etapa: PLANEJAMENTO

Anexo:

Descrição: Encaminhado

Ocorrência: 4 Data: 24/07/2018 10:16:00 Previsão: 06/08/2018

De: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI Para: MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO

Etapa: LICITAÇÃO

Anexo:

Descrição: para regularização

Ocorrência: 3 Data: 20/07/2018 09:47:00 Previsão: 02/08/2018

De: PAULO FERNANDO LAZZARETI ORSO Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI

Etapa: LICITAÇÃO

Anexo:

Descrição: ENCAMINHO PARA PROCESSO LICITATÓRIO

Ocorrência: 2 Data: 20/07/2018 09:31:00 Previsão: 10/08/2018

De: ADAO FELICIO PONCIO Para: PAULO FERNANDO LAZZARETI ORSO

Etapa: PLANEJAMENTO

Anexo:

Descrição: MEMORANDO INTERNO 25/2018

Tramitação do Processo

Processo: **1961 / 2018** Data: **01/08/2018 09:30** Situação: **Encaminhado**

Requerente: **RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA** CPF: **51335883053**

Contato: **RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA - Tel: 46-9919-9360**

Assunto: **SOLICITAÇÃO PARA SETOR DE PLANEJAMENTO - Versão: 4**

Descrição: MEMORANDO INTERNO 25/2018

Ocorrência: 1 Data: 20/07/2018 09:31:31 Previsão: 23/07/2018

De: ADAO FELICIO PONCIO Para: EDINA LUCIANE ESCHER SOTT

Etapa: ETAPA INICIAL

Anexo:

Descrição: Abertura do processo.

BAIXO IGUAÇU

TERMO DE ACORDO DE MEDIDAS COMPENSATÓRIAS E MITIGADORAS DECORRENTES DA IMPLANTAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA BAIXO IGUAÇU QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO EMPREENDEDOR BAIXO IGUAÇU E O MUNICÍPIO DE CAPANEMA (PR).

DAS PARTES:

CONSÓRCIO EMPREENDEDOR BAIXO IGUAÇU, pessoa jurídica de direito privado, com estabelecimento na Rua Tupinambás, nº 1187, no município de Capanema (PR), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.469.993/0001-73, neste ato representado de acordo com seu Contrato Social, doravante denominado simplesmente **CEBI**;

MUNICÍPIO DE CAPANEMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.972.760/0001-60, com sede na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 1080, na Cidade de Capanema (PR), neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Américo Bellé**, inscrito no CPF/MF sob o nº 240.595.879-15, doravante denominado simplesmente **MUNICÍPIO**;

CEBI e **MUNICÍPIO**, individualmente também denominado **PARTE** e, quando em conjunto, simplesmente **PARTES**;

CONSIDERANDO:

(1) Que o **CEBI** é responsável pela implantação da Usina Hidrelétrica (UHE) Baixo Iguaçu;

(2) Que o Plano Básico Ambiental (PBA) da UHE Baixo Iguaçu, datado de julho de 2009, revisado e atualizado em março de 2013, prevê em seus Programas de Saúde (P.25), de Relocação da Infraestrutura (P.27), de Desenvolvimento Turístico, Lazer e Recreação (P.28) e de Apoio aos Municípios e Comunidades Locais (P.24), ações compensatórias e mitigadoras a serem implantadas nos municípios diretamente afetados pelo empreendimento;

(3) O **CEBI** realizou um estudo detalhado no **MUNICÍPIO**, denominado Diagnóstico Socioeconômico, para averiguar a flutuação dos índices de saúde, educação, segurança, infraestrutura e saneamento em decorrência da implantação do empreendimento e mesmo não tendo sido constatada substancial pressão no **MUNICÍPIO**, o **CEBI** realizou e continuará realizando, dentro das suas possibilidades, convênios com o **MUNICÍPIO** para melhoria da qualidade de vida da população;

(4) Que em razão dos entendimentos firmados em diversas reuniões paritárias, as **PARTES** ajustaram as medidas compensatórias e mitigadoras a serem implantadas pelo **CEBI** no município de Capanema (PR);

RESOLVEM as **PARTES** celebrar o presente **TERMO DE ACORDO DE MEDIDAS COMPENSATÓRIAS E MITIGADORAS DECORRENTES DA IMPLANTAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA BAIXO IGUAÇU**, doravante simplesmente **TERMO**, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente **TERMO** tem por objeto estabelecer as medidas compensatórias e mitigadoras a serem implantadas pelo **CEBI** no município de Capanema (PR) em razão dos

impactos experimentados pelo **MUNICÍPIO** em decorrência da implantação da Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1. O presente **TERMO** terá vigência até a efetiva conclusão, por parte do **CEBI**, das ações descritas no quadro constante do inciso I da Cláusula Terceira.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES

3.1. Cada uma das **PARTES** compromete-se a atender às respectivas atribuições abaixo relacionadas:

I. CEBI:

a) Ações já implementadas:

Medidas	Valores Aplicados pelo CEBI	
Obras de reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil Balão Mágico.	R$	226.499,00
Construção de uma pista de skate na Praça Central.	R$	35.000,00
Doação de um micro-ônibus para atendimento da área da saúde em Capanema.	R$	190.000,00
Realização de terraplanagem e cascalhamento do trecho Linha Siemens – Comunidade Cristo Rei, com 6,2km, e do trecho Alto Faraday – Barra do Rio Capanema até Ouro Azul, com 4 km, totalizando 10,2km.	R$	49.000,00
Obra de asfaltamento Alto Faraday - Doação de material pétreo (Rachão e Brita Graduada) 2016/2017.	R$	269.029,23
Doação de mudas de árvores nativas para projeto de arborização municipal (200 mudas de cerejeira japão, 100 mudas de alecrim, 100 mudas de hibisco, 50 mudas de manacá, 100 mudas de alamandra).	-	
Construção da nova sede da Polícia Militar com 262,52m² + complementares (iluminação externa e cabeamento de telefonia e internet).	R$	479.455,86
Doação de sistema de monitoramento com 18 câmeras para o município.	R$	133.659,08
Repasse de recursos para aquisição de uniformes e equipamentos para a Fanfarra Municipal.	R$	5.000,00
Patrocínio do evento Aniversário do Município - 2013 com repasse de recursos.	R$	20.000,00
Patrocínio do evento Feira do Melado 2014 com repasse de recursos.	R$	49.990,00

Patrocínio do evento Feira do Melado 2016 com repasse de recursos.	R$	30.000,00
Patrocínio do evento Verão Capanema 2017 com repasse de materiais.	R$	7.200,00

b) Ações em andamento ou a serem implementadas:

Medidas	Valores Aplicados pelo CEBI	
Aquisição de equipamentos para os Postos de Saúde, desfibrilador, equipamentos de laboratório.	R$	510.000,00
Obra de asfaltamento Alto Faraday – Doação de material pétreo (Rachão e Brita Graduada) 2018.	R$	134.765,67
Obra de recapeamento Alto Faraday – repasse de recursos para execução de material pétreo.	R$	500.000,00
Obra de modernização do canteiro central da Av. Rio Grande do Sul – aquisição de materiais: paver e concreto.	R$	200.000,00
Obras no Estádio Municipal – repasse de recursos para aquisição de materiais para drenagem fluvial, escavação, boca de lobo.	R$	100.000,00
Obras de revitalização dos canteiros centrais da Av. Brasil e Av. Independência – aquisição de materiais: paver, areia, pó de pedra, cimento etc.	R$	306.401,16
Casa da Cultura – execução do projeto completo, com mão de obra e material.	R$	125.000,00
Ambulância Semi UTI (parte do recurso já foi liberado pelo Estado) – repasse de recursos para aquisição.	R$	70.000,00
Aquisição de ônibus (parte do recurso já foi liberado pelo Estado) – repasse de recursos para aquisição.	R$	70.000,00
Aquisição de duas Minivans (parte do recurso foi liberado através do SESA) – repasse de recursos para aquisição.	R$	24.000,00
Aquisição de equipamentos de saúde – cadeiras de roda, andador, muleta e concentrador de oxigênio.	R$	40.000,00
Piso da quadra de futebol – aquisição de materiais.	R$	25.000,00

II. MUNICÍPIO:

a) Receber os equipamentos destinados aos Postos de Saúde – desfibrilador, equipamentos de laboratório –, assegurando a correta destinação e utilização dos mesmos;

b) Adquirir, com os recursos repassados pelo **CEBI**, parcialmente a execução e o material pétreo necessário às obras de recapeamento do Alto Faraday, responsabilizando-se pela qualidade dos serviços e material e correta aplicação dos mesmos;

c) Elaborar Termo de Referência detalhado com descritivo do material – paver e concreto – para as obras de modernização do canteiro central da Av. Rio Grande do Sul, recebendo o material a ser adquirido pelo **CEBI** e assegurando a correta utilização do mesmo;
d) Adquirir, com os recursos repassados pelo **CEBI**, os materiais para execução da drenagem fluvial, escavação e boca de lobo no Estádio Municipal, responsabilizando-se pela qualidade do material e correta aplicação do mesmo;
e) Elaborar Termo de Referência detalhado com descritivo do material – paver, areia, pó de pedra, cimento etc – para as obras de modernização dos canteiros centrais da Av. Brasil e Av. Independência, recebendo o material a ser adquirido pelo **CEBI** e assegurando a correta utilização do mesmo;
f) Encaminhar plantas, memorial descritivo e Termo de Referência para execução, pelo **CEBI** ou empresa por ele contratada, da Casa da Cultura de Capanema;
g) Enviar ao **CEBI** documentação que comprove que o recurso disponibilizado pelo Estado do Paraná já está disponível para aquisição da Ambulância Semi UTI, recebendo o valor complementar do **CEBI** e assegurando que o mesmo seja aplicado para a aquisição do equipamento descrito;
h) Enviar ao **CEBI** documentação que comprove que o recurso disponibilizado pelo Estado do Paraná já está disponível para aquisição de Ônibus, recebendo o valor complementar do **CEBI** e assegurando que o mesmo seja aplicado para a aquisição do equipamento descrito;
i) Enviar ao **CEBI** documentação que comprove que o recurso disponibilizado pelo SESA já está disponível para aquisição de duas Minivans, recebendo o valor complementar do **CEBI** e assegurando que o mesmo seja aplicado para a aquisição dos equipamentos descritos;
j) Elaborar Termo de Referência detalhado com descritivo dos equipamentos de saúde – cadeiras de roda, andador, muleta e concentrador de oxigênio –, recebendo os equipamentos a serem adquiridos pelo **CEBI** e assegurando a correta utilização dos mesmos;
k) Elaborar projeto e Termo de Referência de materiais para o piso da quadra de futebol, recebendo os equipamentos a serem adquiridos pelo **CEBI** e assegurando a correta utilização dos mesmos;
l) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas a seus servidores, empregados ou colaboradores envolvidos na execução do objeto deste **TERMO**.

CLÁUSULA QUARTA – DA POSSIBILIDADE DE REPROGRAMAÇÃO DOS RECURSOS

4.1. A partir do cumprimento, pelo **CEBI**, das medidas descritas nas alíneas do inciso I do item 3.1 da Cláusula Terceira, o **MUNICÍPIO** confere ao **CEBI** plena, geral e irrevogável quitação sobre as mesmas, para nada mais reclamar a título das compensações e/ou mitigações por elas sanadas, observado o quanto disposto no item 4.2 que segue.

4.2. Considerando que as obrigações foram estabelecidas a partir de estimativas apresentadas pelo **MUNICÍPIO** em reuniões paritárias, fica acordado entre as **PARTES** que os valores e finalidades de aplicação das obrigações na forma descrita na Cláusula Terceira, inciso I, poderão ser alteradas, mediante decisão conjunta entre o **MUNICÍPIO** e o **CEBI**, de modo a atender a finalidade deste **TERMO**, bem como possibilitar a utilização de eventual resíduo do recurso total estimado em outros projetos do Município de Capanema (PR).

CLÁUSULA QUINTA – DA RESOLUÇÃO

5.1. O presente **TERMO** somente poderá ser resolvido pela superveniência de norma ou fato administrativo que o torne formal ou materialmente inexequível.

CLÁUSULA SEXTA – DA CESSÃO

6.1. O **CEBI** poderá ceder ou transferir os direitos e obrigações decorrentes do presente **TERMO** a terceiros independentemente da anuência do **MUNICÍPIO**, ficando, porém, cedente e cessionário(s) solidariamente responsáveis.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CÓDIGO DE ÉTICA

7.1. As **PARTES** declaram conhecer o Código de Ética do **CEBI** e o Código de Conduta Ética para Fornecedores, disponíveis em www.baixoiguacu.com.br, comprometendo-se a observar por si, por seus administradores, prepostos, representantes e empregados, os seus princípios e diretrizes, mantendo, durante toda a sua relação com o **MUNICÍPIO** e/ou com terceiros relacionados ao objeto deste **TERMO**, os mais elevados padrões de ética e integridade.

CLAUSULA OITAVA – DAS LEIS ANTICORRUPÇÃO

8.1. As **PARTES** declaram que conhecem as várias leis e convenções aplicáveis no Brasil que proíbem atos de corrupção e outros atos lesivos contra a administração pública, dentre elas a Convenção Anticorrupção da OCDE, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto Federal n° 5.687/06), o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/1992), Lei n° 9.613/98 e a Lei n° 12.846/2013, doravante denominadas, em conjunto, "Leis Anticorrupção". Em todas as atividades e atos relacionados à execução do presente **TERMO**, comprometem-se as **PARTES** a cumprir e fazer cumprir, por si e por seus administradores, colaboradores e terceiros, rigorosamente, as Leis Anticorrupção.

8.2. O **MUNICÍPIO** declara ainda que conhece as disposições relacionadas com o combate à corrupção, seja ela pública ou privada, contidas no Código de Ética e na Política Anticorrupção do **CEBI** e compromete-se a cumprir fielmente essas disposições, comprometendo-se ainda a denunciar ao **CEBI** qualquer infração a essas disposições que venha a ser do seu conhecimento, na forma disciplinada no item 8.10.

8.3. Obrigam-se as **PARTES**, seja diretamente, seja por intermédio terceiros subcontratados ou representantes, de forma irrevogável, a não prometer, oferecer, dar, patrocinar, incentivar, obrigar ou concordar, direta ou indiretamente, com subornos, fraudes, tráfico de influência, extorsão, vantagem indevida (seja em dinheiro, presentes, descontos, favores ou qualquer outra coisa de valor), a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada, nem praticar quaisquer dos atos vedados pelas Leis Anticorrupção. Comprometem-se, ainda, a adotar as melhores práticas de governança com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus administradores, colaboradores, prepostos ou terceiros, de acordo o disposto no artigo 7º, inciso VIII, da Lei n° 12.846/2013 e na Lei n° 9.613/98 e suas respectivas modificações e regulamentações.

8.4. As **PARTES** deverão observar e fazer observar, por seus fornecedores, prepostos, empregados, colaboradores em geral, prestadores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética e integridade durante todo o processo de contratação e execução deste **TERMO**. É dever das **PARTES** treinar seus empregados e colaboradores em geral acerca de condutas éticas e do combate à corrupção. Além disso, deverá incorporar nos contratos com seus fornecedores relacionados ao objeto do presente **TERMO**, quando autorizada a subcontratação, cláusulas de integridade e anticorrupção.

8.5. As **PARTES** declaram que suas atividades, relacionadas ao objeto deste **TERMO** ou relacionadas com qualquer outro contrato celebrado entre elas, não afrontam a legislação anticorrupção e de lavagem de dinheiro.

8.6. As **PARTES** declaram, ainda, que não há qualquer agente público ou pessoa a ele relacionada que receberá, direta ou indiretamente, benefícios ou vantagens em decorrência do presente **TERMO**.

8.7. Toda documentação de cobrança a ser emitida nos termos deste **TERMO** deverá estar acompanhada de fatura/nota fiscal detalhada, contendo discriminação dos serviços prestados e/ou bens adquiridos, conforme o caso. As **PARTES** se obrigam a manter livros, contas, registros e faturas fidedignos e consistentes com as operações a que correspondem. Considerando os propósitos da presente cláusula – Leis Anticorrupção, as **PARTES** concordam e autorizam que, na hipótese de indícios de irregularidades ou de quaisquer práticas ilícitas, a outra **PARTE**, seja diretamente ou por meio de pessoas por ela formalmente indicadas a tal fim, possa inspecionar o local de execução do **TERMO** e auditar todos os documentos, contas e registros relacionados à contratação e à execução do objeto deste **TERMO**.

8.8. Qualquer violação, por parte de quaisquer das **PARTES**, das Leis Anticorrupção ou da presente cláusula – Leis Anticorrupção – será considerada uma infração grave a este **TERMO**, consistirá justa causa para sua rescisão motivada, conferindo à **PARTE** inocente o direito de declarar rescindido imediatamente o presente **TERMO**, sem qualquer ônus ou penalidade para si, ficando a **PARTE** infratora responsável pelas perdas e danos a que der causa, nos termos da lei aplicável.

8.9. O presente **TERMO** poderá ser imediatamente rescindido pela **PARTE** inocente, ainda, na hipótese de participação ou envolvimento comprovado da **PARTE** infratora, diretamente ou indiretamente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas e/ou obstrutivas (conforme Diretrizes e definições do Banco Mundial), ou em lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores (conforme Lei n° 9.613/98), seja na execução do presente **TERMO** ou em quaisquer outros contratos em que figurar como **PARTE**, seja com entes públicos ou privados.

8.10. As **PARTES** notificarão prontamente, por escrito, à outra **PARTE** a respeito de qualquer suspeita ou violação do disposto nas Leis Anticorrupção ou às disposições desta cláusula – Leis Anticorrupção – ou de qualquer suspeita de participação em práticas de suborno ou corrupção, assim como o descumprimento de qualquer declaração prevista nesta cláusula.

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO

9.1. Se necessário, o **MUNICÍPIO** providenciará à sua conta a publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial do Estado do Paraná, no prazo de 30 (trinta) dias da data de sua assinatura.

CLÁUSULA DEZ – DO FORO

10.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Comarca de Capanema (PR), para a elucidação de quaisquer dúvidas oriundas do presente **TERMO**.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para o mesmo fim de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Capanema (PR), 24 de julho de 2018.

Pelo **CEBI:**

José de Anchieta dos Santos
Diretor Presidente

Newton Gomes Rocha Jr.
Diretor Administrativo e Financeiro

Newton Gomes Rocha Jr.
Diretor Administrativo Financeiro
Consórcio Empreendedor
BAIXO IGUAÇU

Pelo **MUNICIPIO**:

Américo Bellé
Prefeito

Testemunhas:

Romanti Ezer Barbosa
OAB/PR 56.675

Jonas Welter
CPF: 041.605.059-02

EDITAL DE LICITAÇÃO N° 12/2018
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

1. PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços, mediante a Comissão de Licitação, designada pela portaria n°.6905 de 30 de novembro de 2017, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados, fará realizar licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS**, do tipo **MENOR PREÇO**, na forma de Execução Indireta, pelo **Regime de Empreitada por Preço Global**, de acordo com as condições deste edital e seus anexos, bem como com o que determina a **Lei n° 8.666/93**, a Lei Complementar n°. 123/06 e do Decreto n°. 8.538/15.

1.1. Da sessão pública:

Os envelopes contendo a proposta e a documentação **deverão ser entregues até às 9 horas do dia 31/08/2018**, e serão **abertos no dia 31/08/2018**, **às 9 horas**, na sala da Comissão Permanente de Licitações da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, situada a **AV GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - CAPANEMA - PR.**

1.2. Para maior transparência nos atos administrativos, a Sessão Pública poderá ser gravada pela Administração Municipal, através de equipamento áudio visual próprio.

1.3. Integra este Edital, independentemente de transcrição:

- Projeto Básico;
- Carta credencial – anexo 01;
- Declaração de Regularidade no Ministério do Trabalho – anexo 02;
- Atestado de visita – anexo 03;
- Declaração de responsabilidade técnica – anexo 04;
- Declaração de idoneidade – anexo 05;
- Carta proposta de preços – anexo 06;
- Demonstrativo analítico do BDI – anexo 07;
- Termo de renúncia – anexo 08;
- Minuta do contrato – anexo 09;
- Declaração de Aceitação da Responsabilidade – anexo 10;
- Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – anexo 11;
- Declaração de Propriedade de Aparelhamento e disponibilidade de pessoal Técnico para execução do objeto da licitação - Anexo 12
- Cronograma de utilização do aparelhamento - anexo 13

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitação tem por objeto a execução, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da seguinte obra:

Local: NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO
Área da Pavimentação Poliédrica: 5.078,48m²
Prazo de Execução: 6 (Três) meses
Prazo de Vigência: 12 (Seis) meses
Capital social Mínimo: 38.700,18 (Trinta e oito mil, setecentos reais e dezoito centavos)
Preço Máximo Global: R$ R$ 387.001,82(Trezentos e oitenta e sete mil, um real e oitenta e dois centavos)

A obra deverá ser executada em conformidade com o projeto básico, especificações técnicas, memoriais e demais documentos confeccionados pela Engenharia Municipal, não sendo admitida qualquer alteração ou substituição dos materiais e técnicas empregadas na execução da obra sem a anuência prévia e expressa do Departamento de Engenharia.

2.2. O valor do subtotal da planilha de serviços, de cada macro item, deverá respeitar o percentual pré-estabelecido na tabela abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO – MACRO ITENS	PERCENTUAL DO VALOR GLOBAL
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,26%
1.2.	TERRAPLENAGEM	17,89%
1.3	DRENAGEM PLUVIAL	35,12%
1.4.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	29,85%
1.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1,48%
1.6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,48%
1.7.	PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADAS	10,92%

2.3. Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada macro item, o preço global da proposta não poderá ultrapassar o preço máximo estabelecido no item 2.1, sob pena de desclassificação.

3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1. A despesa com a contratação da obra, estimada em R$ 387.001,82 (Trezentos e Oitenta e Sete Mil e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos), valor que correrá a conta da seguinte Dotação Orçamentária:

DOTAÇÕES					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2018	1350	08.002.15.451.1501.1151	000	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
2018	1355	08.002.15.451.1501.1151	870	4.4.90.51.00.00	Do Exercício

4. DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL

4.1. O edital poderá ser impugnado:

4.1.1. Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública;

4.1.2. Por qualquer licitante em até 03 (três) úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.

4.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame.

4.3. Até a data marcada para abertura da sessão pública, qualquer interessado poderá solicitar à Administração elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto.

4.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

4.5. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Comissão de Licitação deverão ser autuados no processo licitatório e estar disponíveis para consulta por qualquer interessado.

4.6. Qualquer impugnação ao presente edital deverá ser protocolizada junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, endereçada ao Setor de Licitações do Município, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da impugnação a data de recebimento da correspondência, a qual deverá respeitar os itens 4.1.1 e 4.1.2, deste edital.

5. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

5.1. Poderão participar desta licitação os interessados do ramo pertinente ao seu objeto, devidamente ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

5.1.1. Caso haja interesse de participação nesta licitação, a licitante deverá realizar ou atualizar o cadastro de fornecedores junto ao Setor de Licitações do Município de Capanema - PR, respeitando o prazo estipulado no item 5.1 acima, apresentando os seguintes documentos:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores, **ou**; inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, **ou**; a ata de fundação e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede.

b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias; ; **no caso da empresa apresentar com data superior a 60 (sessenta dias o Presidente da Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações poderá consultar o site: http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp para averiguar se houve alterações. (se não houver alterações a empresa não será desclassificada).**

c) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciários – (INSS – Instituto Nacional da Seguridade Social);

d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando a situação regular;

e) Pen-Drive ou CD-ROM virgem para repasse dos anexos e arquivos digitais obrigatórios referentes a esta licitação.

5.1.2. Quando o cadastro de fornecedor for realizado ou atualizado, e os arquivos digitais repassados, o representante da licitante obrigatoriamente deverá assinar um Protocolo de Retirada do Edital, que será anexado ao Processo Licitatório.

5.2. O cadastramento no banco de dados Municipal será realizado por meio da divisão de Licitações do Município.

5.3. Não poderão participar desta licitação:

5.3.1. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto da licitação.

5.3.2. Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;

5.3.3. Empresas impedidas de licitar ou contratar com a União (art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e art. 28 do Decreto nº 5.450/2005) ou suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública (Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93);

5.3.4. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V da Lei nº 9.605/98;

5.3.5. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

5.3.6. Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou extrajudicial;

5.3.7. Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Deputados ou Senadores (cfr. art. 54, II da Constituição);

5.3.8. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa);

5.3.9. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93.

5.4. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.

6. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS

6.1. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/06.

6.1.1.A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00, em conformidade com as disposições do art. 34 da Lei nº 11.488/07 e do art. 3º, § 4º, VI da Lei Complementar nº 123/ com alterações da Lei Complementar nº 155/2016, receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº 123/06 às ME/EPP.

6.1.2. A pessoa física ou o empresário individual enquadrados nos limites definidos pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº 123/06, às ME/EPP.

6.2. A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 123/2006 independe da habilitação da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado para a obtenção do regime tributário simplificado.

6.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar (Art. 11 do Decreto nº 6.204/07).

6.4. A declaração acima exigida deverá ser entregue juntamente com a documentação de habilitação.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Previamente à abertura da sessão de habilitação e julgamento, o representante do licitante deverá apresentar-se à Comissão de Licitação para efetuar seu credenciamento como participante desta Licitação, munido da sua carteira de identidade ou documento equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão.

7.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com firma reconhecida, ou documento equivalente.

7.3. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem ostentar a competência do representante do licitante para representá-lo perante terceiros.

7.4. O instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, deve ostentar os poderes específicos para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes a licitações, devendo vir acompanhado dos documentos de constituição da empresa ou do registro como empresário individual.

7.5. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

7.6. Cada licitante poderá credenciar apenas um representante.

7.7. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não impedirá a participação do licitante no presente certame, porém impedirá o seu representante de se manifestar durante a sessão.

8. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA

8.1. Os documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados no anverso com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2018, ÀS 9h00min DO DIA 31/08/2018, (RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS À COMISSÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 12/2018, ÀS 9h00min DO DIA 31/08/2018, (RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) CNPJ N° XXXX

8.2. O envelope 01 deverá conter todos os documentos a seguir relacionados, o qual deverá ser apresentado devidamente lacrado e inviolado, em 01(uma) via cada um, sendo que as folhas deverão, preferencialmente, ser do tamanho A4, os documentos deverão estar rubricados por elemento credenciado da proponente, no caso de cópias, estas deverão estar devidamente autenticadas por tabelião, ou por servidor membro da comissão permanente de licitação.

8.3. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes da abertura da sessão pública.

8.4. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único, endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação:

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO **MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR** TOMADA DE PREÇOS 12/2018, ÀS 9h00min DO DIA 31/08/2018, (RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) CNPJ N° XXXX

8.5. Os envelopes lacrados contendo as propostas de preços e documentos de habilitação deverão ser protocolados no Protocolo-Geral do Município (junto ao Departamento de Tributação no Paço Municipal) até a hora marcada no Preâmbulo deste edital para abertura da sessão pública, quando não encaminhados via correio.

8.5.1. A sessão pública não será iniciada enquanto houver empresas na fila do protocolo dos envelopes.

8.5.2. Após o início da sessão, não poderão participar certame as empresas que não tiverem os seus envelopes devidamente protocolados conforme o item 10.5.

8.5.3. Considera-se o início da sessão a manifestação do Pregoeiro, declarando aberta a sessão pública, devendo constar na Ata o efetivo horário da abertura e a justificativa para eventual atraso.

8.6. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão efeitos como proposta.

8.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

8.8. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados:

8.8.1. RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

b. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

b.1) Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.

d. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;

e. No caso de cooperativa:

e.1) A ata de fundação e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede;

e.2) O registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

e.3) O regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com ata da assembleia que os aprovou;

e.4) Os editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;

e.5) A ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

f. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

g. Para qualquer tipo de empresa: Certidão simplificada de registro do comercio - Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para apresentação dos envelopes, salvo sociedade simples;

8.8.2. RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL:

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias; **no caso da empresa apresentar com data superior a 60 (sessenta dias o Presidente da Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações poderá consultar o site: http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp para averiguar se houve alterações. (se não houver alterações a empresa não será desclassificada)**

b) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciários – (INSS – Instituto Nacional da Seguridade Social);

c) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando a situação regular, expedido pela Caixa Econômica Federal;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa da Dívida Ativa da União e Receita Federal);

d.1) A aceitação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União está condicionada à verificação da correspondente autenticidade nos seguintes endereços eletrônicos: www.receita.fazenda.gov.bre www.pgfn.fazenda.gov.br.

e) Prova de regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federação da sede da licitante;

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, (Certidão Negativa de Tributos Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante;

8.8.3. RELATIVA À REGULARIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA:

a) certidão negativa de falências ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sida realizada em data **não anterior a 90 (noventa)** dias da data prevista para apresentação dos envelopes;

b) Certidão negativa de títulos de protesto da empresa **com validade de 30 dias**.

c) Comprovação de capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, por meio de Certidão emitida pela Junta Comercial ou Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas.

8.8.4. RELATIVA À REGULARIDADE TRABALHISTA:

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei 12.440/11 (validade 180 dias contados da data de sua emissão).

8.8.5. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) **Registro ou inscrição**, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, **da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s)**, da região a que estiverem vinculados.

a.1) No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Paraná, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato.

b) Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem a contratação, especificamente, no que tange ao presente certame, Pavimentação Poliédrica;

b.1) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame;

b.2) Caso o licitante seja cooperativa, os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal condição através da apresentação das respectivas atas de inscrição, da comprovação da integralização das respectivas quotas-partes e de três registros de presença desses cooperados em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais, bem como da comprovação de que estão domiciliados em localidade abrangida na definição do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de 1971;

b.3) No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

c) Comprovação da **capacitação técnico-operacional**, mediante apresentação de um atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, **em nome do licitante**, relativos à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber: **Pavimentação Poliedrica, com quantitativos mínimos de 50% da área objeto da presente licitação, vedado o somatório de atestados**. Ou seja, somente será admitido o quantitativo mínimo de 50% da área objeto da presente licitação em **um único atestado (2.539,24 m²).**

c.1) O atestado deverá estar devidamente registrado no CREA ou no CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, dando-se tal comprovação mediante a apresentação da correspondente CAT com registro de atestado **de atividade concluída**, ou documento equivalente, **que indique a licitante como empresa contratada**.

d) Declaração, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por intermédio de seu responsável técnico devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde será realizada a obra, e de que é detentor de todas as informações relativas à sua execução.

d.1) A vistoria ocorrerá apenas no dia 20/08/2018 às 09h00min. sendo que os representantes das proponentes deverão se dirigir no horário marcado à Prefeitura Municipal para posterior visita ao local da obra. Em hipótese alguma serão aceitos atrasos, mesmo com concordância de todos os licitantes.

d.2) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá possuir formação na área de engenharia, devido à complexidade do objeto desta licitação, bem como estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

e) Declaração na qual a Licitante manifeste sua total compreensão e conhecimento dos termos contidos na Especificação Técnica deste Edital, conforme Modelo **Anexo 10** deste Edital.

f) Indicação do Responsável Técnico ou da Equipe de Profissionais Responsáveis Técnicos que participarão da construção da obra, conforme **Anexo 04**- (Declaração de Responsabilidade Técnica). O responsável técnico deverá opor assinatura de aceite na exigência constante acima.

g) Declaração formal (Anexo 12) de que disporá, por ocasião da contratação, das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como do anexo 13, contendo o cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos.

8.9. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR (DECLARAÇÕES/OUTROS):

a) Declaração idoneidade, conforme modelo constante no **Anexo 05** deste Edital.

b) Declaração de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. (Conforme modelo no **Anexo 02** deste Edital – Regularidade com o Ministério do Trabalho).

d) Documentos facultativos:

d.1) Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte

(A empresa interessada no exercício dos direitos dispostos da Lei Complementar nº 123/2006, de 14/12/2006, deverá apresentar juntamente com a documentação de habilitação, no envelope "A", a Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, **com firma reconhecida** (anexo 11)).

d.2) Termo de Renúncia:(A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisão a Comissão da Licitação quanto a habilitação, deverá apresentar o respectivo documento nos exatos termos do anexo 08, o qual deverá ser entregue juntamente com a documentação de habilitação).

8.10. Os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** (envelope nº 01) poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia desde que autenticada por cartório competente, ou cópia simples que **poderá** ser autenticada pelos membros da Comissão ou Funcionário do Setor de Licitações, no decorrer da sessão **desde que o original esteja na posse do representante credenciado**, ou ainda por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet.

8.11. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 90 dias contados da data da abertura da sessão pública.

8.12. As ME/EPP e seus equiparados deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de desclassificação (art. 43 da LC nº 123/06 e nº 147/14).

8.13. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da ME/EPP, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, §1°, da LC nº 123/06 e n° 147/14);

8.14. A declaração do vencedor do certame acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal (art. 4º, § 2º, do Decreto 6.204/07);

8.15. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

8.16. O proponente que não cumprir com o disposto no item 08 e seus subitens será desclassificado.

9. DA PROPOSTA

9.1. Deverá ser apresentada uma carta proposta de preços conforme Anexo 06 e/ou conforme modelo padrão do sistema, impressa por computador com tinta indelével, sem rasuras e entrelinhas. A proposta deverá ser elaborada considerando-se que o objeto será executado pelo regime de empreitada por preço global a preços fixos e sem direito a reajustamento e deverá conter:

a) Razão social, endereço completo, telefone e o CNPJ da proponente etc..

b) Nome e RG do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva assinatura.

c) Data.

d) Preço global e unitário do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em algarismos e por extenso, com demonstração dos valores correspondentes à mão-de-obra e material.

e) Prazo de execução do objeto em dias.

f) Prazo de validade da proposta no mínimo 05 (cinco) meses contados a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitação.

9.1.1. Planilha de Serviços - conforme descrito no projeto básico - Deverá ser apresentada uma planilha de serviços datilografada ou impressa por computador, sem rasuras e entrelinhas e deverá conter:

a) Razão social.

b) Município e objeto.

c) Data.

d) Discriminação dos serviços, unidades de medida, quantidades, preços unitários, preços parciais, preços subtotais e preço global, com no máximo duas casas após a vírgula.

e) Demonstração dos valores correspondentes à mão-de-obra.

f) Páginas numeradas.

g) Nome, RG e assinatura do responsável legal pela Empresa, bem como o nome, número do registro no CREA e assinatura do responsável técnico.

9.1.1.1. Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estarão incluídos todos os custos com a mão-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos, instalações provisórias necessárias, bem como

os encargos sociais, fiscais, comerciais, administrativos, lucros e quaisquer despesas de tributos incidentes sobre os serviços, não se admitindo qualquer adicional.

9.1.1.2. No preço proposto, além dos custos elencados no item 9.1.1.1, está incluso o BDI – Benefício e Despesas Indiretas, vez que nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada. Todavia, caso haja necessidade de aditivos de valores e quantitativo, devidamente justificada, será descontado do valor do aditivo o percentual equivalente do Risco na composição do BDI, que será calculado sobre o valor global da obra, salvo na hipótese de superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, verificados durante a execução da obra, hipóteses, que devidamente justificadas, não sofrerão descontos do percentual de "risco".

9.1.1.3. A Composição Analítica do BDI deverá ser apresentada conforme modelo (Anexo 07), discriminando todos os custos indiretos e lucros (ou benefícios).

9.1.1.4. O BDI – Com Desoneração da folha de pagamento máximo admitido nesta licitação é 26,85%, devendo cada licitante preencher sua planilha de Composição Analítica do BDI.

9.1.2. Cronograma físico-financeiro - Deverá ser apresentado um cronograma físico-financeiro, conforme o Projeto Básico, devidamente preenchido com o respectivo equilíbrio físico-financeiro constando o nome, número do RG e assinatura do responsável legal pela empresa, bem como o nome número do registro no CREA e assinatura do responsável técnico.

9.2. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas.

9.3. A apresentação da proposta na licitação será considerada como prova de que a proponente examinou e concordou com todas as especificações e demais elementos da Licitação, que os comparou entre si e obteve do Licitador, através de seus técnicos, informações satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente existente, antes de elaborar sua proposta, concluindo que os elementos da licitação lhe permitiram preparar proposta de preços completa irrevogável e integralmente satisfatória.

9.4. Independentemente do valor unitário apresentado pela proponente para cada item constante da planilha de preços, o preço global da proposta não poderá ultrapassar o Preço Máximo estabelecido no item 3.1, sob pena de desclassificação.

9.5. A apresentação da proposta implica na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos e fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidade e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

9.6. Nos preços ofertados já deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execução do objeto, vez que tais tributos fazem parte da discriminação do BDI - Benefícios de Despesas Indiretas. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL -, que não podem ser repassados à Administração, não serão incluídos na proposta apresentada.

9.7. As propostas terão validade de **6(seis)** meses contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

9.8. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

9.9. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.

9.10. Após a abertura da sessão, somente serão aceitas alterações formais, que não apresentem alteração da proposta, observadas as exceções previstas neste edital.

9.11. Fica entendido que os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os documentos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se mencione em um e se omita em outro será considerado especificado e válido.

10. DA SESSÃO PÚBLICA

10.1. A abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e a proposta de preços será realizada em sessão pública, da qual será lavrada ata circunstanciada assinada pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes.

10.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

10.3. Aberta a sessão, a Comissão de Licitação receberá, de uma só vez, os envelopes contendo a proposta e a documentação de habilitação.

10.4. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, a Comissão de Licitação poderá verificar o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de licitar (http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx);

b) CNAE (http://www.cnae.ibge.gov.br)

c) SICAF;

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

e) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

10.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de eventual matriz ou filial (cfr. Acórdão TCU nº 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. art. 12 da Lei nº 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário).

10.6. Constatada a existência de vedação à participação no certame, a Comissão de Licitação reputará o licitante inabilitado.

10.7. Ainda como condição prévia à habilitação, para os itens ou grupos de participação exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipótese de exercício da prerrogativa de efetuar o lance de desempate previsto Lei Complementar nº 123/2006, o Presidente da Comissão de Licitação poderá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), na seção "Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)", para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar no exercício anterior ou corrente extrapola o faturamento máximo permitido como condição paras esse benefício.

10.7.1. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o Presidente da Comissão de Licitação indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente inabilitação, sem prejuízo das penalidades incidentes.

10.8. Não ocorrendo o descumprimento das condições de participação, serão identificados os licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentação de habilitação.

10.9. Caso necessário, a Comissão de Licitação poderá suspender a reunião para analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a se reunir.

10.10. Analisada a documentação de habilitação, a Comissão de Licitação, de forma motivada, indicará os licitantes inabilitados em razão de falha ou omissão na documentação.

10.11. A inabilitação de qualquer licitante será sempre fundamentada e registrada na ata da sessão.

10.12. Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serão imediatamente abertas as propostas de preço dos licitantes habilitados.

10.13. Não havendo renúncia ao direito de recorrer, a Comissão de Licitação suspenderá a sessão e marcará nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de preço.

10.13.1. Os documentos de habilitação e os envelopes lacrados contendo as propostas serão rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissão de Licitação e ficarão guardados na respectiva Seção.

10.14. Após o final da fase de habilitação, os envelopes nº 02 dos licitantes inabilitados não serão devolvidos.

10.15. Os envelopes nº 02 ficarão à disposição das empresas inabilitadas pelo período de até 10 (dez) dias úteis contados do encerramento da fase de habilitação, após o que serão destruídos pela Comissão de Licitação.

10.16. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes do certame.

10.17. A intimação do julgamento da habilitação e das propostas dos licitantes será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

10.18. Após a fase de habilitação, não caberá:

10.18.1. Desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.

10.18.2. Desclassificação do licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só conhecidos após o julgamento.

10.19. Abertos os envelopes nº 02, a Comissão de Licitação examinará as propostas apresentadas quanto às suas especificações e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.

10.20. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada na ata da sessão.

10.21. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá fixar prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

10.22. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão e pelos representantes dos licitantes presentes.

10.23. A Comissão de Licitação poderá relevar, numa proposta, qualquer informalidade, não harmonização ou irregularidade de natureza secundária, formal que não constitua um desvio significativo, desde que não prejudique ou afete a classificação relativa de qualquer outra proponente.

10.24. A ausência de assinatura na proposta, planilha ou cronograma físico-financeiro poderá ser suprida se o representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato ser registrado em ata.

10.25. A Comissão de Licitação fará a conferência da proposta de preços, planilha de serviços e cronograma físico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotação no preenchimento serão efetuadas as devidas correções.

10.26. No caso de haver divergência entre o preço grafado em algarismos e o grafado por extenso, prevalecerá o último a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro grosseiro e óbvio, ou ainda, na omissão de um desses valores (algarismo ou extenso) a proposta será válida desde que não haja dúvidas sobre o preço apresentado.

10.27. Se existir diferença entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecerá esta.

10.28. Se existir erro aritmético na multiplicação da quantidade pelo preço unitário, o preço unitário prevalecerá a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro grosseiro e óbvio no preço unitário. Neste caso, o preço parcial cotado prevalecerá e o preço unitário será corrigido.

10.29. Nos casos em que houver diferença entre o preço global indicado na planilha de serviços e o preço global analisado, prevalecerá este.

10.30. Se o valor de um macro item (item 2.2) ultrapassar o percentual máximo admissível estabelecido, a diferença entre o valor proposto pela proponente e o máximo admissível será remanejado para a última parcela do cronograma físico-financeiro.

10.31. A Comissão de Licitação fará a conferência do cronograma físico-financeiro e procederá a correção se constatado erro, desequilíbrio físico-financeiro e/ou a necessidade de ajuste face o contido no item 2.2. A simples correção de erro, desequilíbrio físico-financeiro e/ou de ajuste não acarretará a desclassificação da proposta.

10.32. O cronograma físico-financeiro corrigido deverá ser aceito expressamente pela proponente. Caso a proponente rejeite a correção, a sua proposta será desclassificada.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1. O critério de julgamento será o de **menor preço global**.

11.2. Será desclassificada a proposta final que:

a) Contenha vícios ou ilegalidades ou que seja elaborada em desacordo com o presente edital;

b) Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Projeto Básico;

c) Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital;

c.1) A proposta poderá utilizar custos unitários diferentes daqueles fixados neste Edital, desde que o preço global orçado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro do contrato fiquem igual ou abaixo do valor calculado a partir do sistema de referência utilizado.

d) que apresentar preços e vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;

e) que apresentarem preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero;

f) que não aceite correção do cronograma físico-financeiro;

g) que venha a ser considerada inexequível pela Comissão de Licitação, após procedimento para apurar a viabilidade técnica e econômica do preço global proposto, quando for razoável concluir que a proponente não é capaz de executar o Contrato ao preço da sua oferta.

11.3. Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, ou

b) Valor global orçado pela Administração.

11.3.1. Nessa situação, previamente à desclassificação da proponente, lhe será facultado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a comprovação da viabilidade dos preços constantes em sua proposta, por meio de composição detalhada dos preços unitários, comprovando que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666/93, sob pena de desclassificação.

12. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

12.1. Caso todos os licitantes vencedores do certame não se enquadrarem nos requisitos do item 6 deste edital, far-se-á sorteio na mesma sessão de julgamento.

12.2. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

12.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

12.3. Para efeito do disposto no item 12.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

12.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

12.3.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 12.2.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

12.3.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 12.2.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

12.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na Lei Complementar 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

12.5. As regras de desempate previstas na Lei Complementar 123/06 somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

13. DOS RECURSOS

13.1. Dos atos da Administração serão admitidos os seguintes recursos:

13.1.1. Recurso hierárquico, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, ou da lavratura da ata de reunião, nos casos de:

a) Habilitação ou inabilitarão do licitante;

b) Julgamento das propostas;

c) Anulação ou revogação da licitação;

d) Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;

e) Rescisão do Contrato por ato unilateral da Administração, nos casos a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei nº 8.666/93;

f) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.

13.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico.

13.1.3. Pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato, no caso de declaração de inidoneidade por decisão do(a) Prefeito(a) Municipal.

13.2. A interposição de recurso será comunicada aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

13.3. O recurso será dirigido à Comissão Permanente de Licitação, por intermédio do Presidente da Comissão de Licitação, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado.

13.4. A decisão deverá ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando do recebimento do recurso.

13.5. Os recursos interpostos em razão de habilitação ou inabilitação de licitante ou do julgamento das propostas terão efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos.

13.6. Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do licitante aos autos do processo licitatório ou a qualquer outra informação necessária à instrução do recurso.

13.7. Caso os autos do processo não estejam disponíveis para vista dos licitantes interessados, o prazo para recurso será suspenso.

13.8. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao licitante vencedor.

14.2. Após a adjudicação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias.

14.3. Previamente à formalização da contratação, a Comissão Permanente de Licitação poderá realizar consulta ao SICAF para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.

14.4. Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, a Comissão Permanente de Licitação poderá convocar o licitante subsequente na ordem de classificação, para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente.

15. DO INSTRUMENTO DO CONTRATO, DA SUBCONTRATAÇÃO E DA CESSÃO

15.1. A contratação será formalizada por intermédio de instrumento contratual.

15.2. É vedada a subcontratação total ou parcial do seu objeto, bem como a associação do contratado com outrem, bem como a cessão ou transferência, total ou parcial, de qualquer encargo, obrigação ou direito relativo ao objeto desta licitação.

16. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

16.1. O contrato terá vigência de **12(doze) meses.**

16.2. O prazo de vigência de contrato é maior do que o prazo para a execução da obra devido à necessidade de realizar medições, pagamentos e prestação de contas, entre outros procedimentos.

16.3. Na hipótese de necessidade de aditivo de prorrogação contratual, será discriminado o novo prazo de vigência do contrato e o novo prazo para execução da obra.

17. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

17.1. Caberá à CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 09), além do fornecimento da mão-de-obra, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução da obra e demais atividades correlatas, obriga-se a:

17.1.1 Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

17.1.2. Elaborar e disponibilizar à CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução da obra, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos:

17.1.2.1. A Contratada deverá apresentar ao Departamento de Engenharia do Município, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, um cronograma de dimensionamento de mão-de-obra, isto é, relação nominal de todo o pessoal técnico que irá executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma físico da obra.

17.1.2.2. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Básico (memorial descritivo), apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos;

17.1.2.3. O projeto executivo deverá ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a partir da assinatura do contrato.

17.1.2.4. A não elaboração do projeto executivo pela empresa contratada ensejará a aplicação das multas previstas neste edital, bem como, na hipótese de haver necessidade de aditivos contratuais por inconsistências encontradas entre o projeto básico e a execução da obra, verificadas após o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao "risco", da composição do BDI apresentado pela empresa, será descontado do valor final de um possível aditivo.

17.1.3. Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496, de 1977;

17.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Projeto Básico, nos termos do artigo 111 da Lei nº 8.666, de 1993;

17.1.5. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra;

17.1.6. Assegurar à CONTRATANTE:

17.1.6.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

17.1.6.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

17.1.7. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, no prazo determinado.

17.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

17.1.9. Atentar, em relação ao material, para todas as disposições e especificações constantes no Projeto Básico.

17.1.10. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

17.1.11. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento da obra, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação da obra em relação ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execução da obra, para possibilitar a sua fiscalização.

17.1.12. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste instrumento e as especificações constantes no projeto básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

17.1.13. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA.

17.1.14. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

17.1.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

17.1.16. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos documentos relativos à execução da reforma.

17.1.17. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

17.1.18. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

17.1.19. Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigações inerentes à execução dos serviços ora contratados.

17.1.20. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

17.1.21. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e telefônicas.

17.1.22. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra.

17.1.23. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachás, com fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's;

17.1.24. Manter sediado junto à Administração, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

17.1.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Administração;

17.1.26. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração;

17.1.27. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

17.1.28. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços, fora das suas especificações;

17.1.29. Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

17.1.30. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do patrimônio público;

17.1.31. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Projeto Básico ou neste contrato;

17.1.32. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a sua habilitação e qualificação no certame licitatório;

17.1.33. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados utilizados na execução dos serviços.

17.1.34. Fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos para a execução da obra;

17.1.35. Examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de serviços para uma proposta de preços completa e satisfatória;

17.1.36. Providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS.

17.2. A CONTRATANTE obriga-se a:

17.2.1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato;

17.2.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei n° 8.666/93;

17.2.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em interrupção na execução do Contrato;

17.2.4. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato;

17.2.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

17.2.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

17.2.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

17.2.8. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das normas ambientais vigentes;

17.2.9. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Básico e seus anexos;

17.2.10. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

18. DA SEGURANÇA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

18.1. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato.

18.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

18.3. A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.

18.4. A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

18.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil, especialmente a denunciação da lide, se for o caso.

18.6. A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

18.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum título.

19. DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO E COMUNICAÇÃO

19.1. A fiscalização da execução do objeto deste Contrato será feita através de profissionais devidamente designados pelo CONTRATANTE. A fiscalização procederá mensalmente a medição baseada nos serviços executados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro, para que se permita a elaboração do processo de faturamento.

19.2. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a situação inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso.

19.3. A contratada deverá permitir e colaborar para que funcionários, engenheiros, especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto da presente Licitação;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir;

19.4. A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para representá-la na execução do contrato.

19.5. A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha de serviços, Boletim

Diário de Ocorrências – BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização.

19.6. A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização.

19.7. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou incorreções não revelados até o Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE.

19.8. Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado.

19.9. A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

19.10. A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento um ao outro. A finalidade é revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais.

19.11. Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva, após o seu recebimento.

19.12. A fiscalização será realizada pela Secretaria de Planejamento do Município, por meio de Engenheiro Municipal.

19.13. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.

19.14. Ficam reservados à Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto no Contrato, no Edital, nas Especificações, nos Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com as obras / serviços em questão e seus complementos.

19.15. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, salvo seja caracterizada a omissão funcional por parte destes, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

19.16. Compete especificamente à Fiscalização:

19.16.1. Indicar à Contratada todos os elementos indispensáveis ao início das obras/serviços;

19.16.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obrigações da Contratada constantes do Contrato;

19.16.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificações e Normas Técnicas da ABNT, e outras porventura aplicáveis;

19.16.4. Esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela Contratada;

19.16.5. Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à Contratada;

19.16.6. Autorizar as providências necessárias junto a terceiros;

19.16.7. Transmitir por escrito, instruções sobre as modificações dos serviços que porventura venham a ser feitos, bem como as alterações de prazo e cronograma;

19.16.8. Relatar oportunamente à Contratante, ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços em relação a terceiros;

19.16.9. Dar à Contratante imediata ciência de fatos que possam levar à aplicação de penalidades contra a Contratada, ou mesmo à rescisão do Contrato.

19.17. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso:

a) Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada;

b) Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigidas;

c) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;

e) O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e

f) A satisfação do público usuário.

19.18. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

19.19. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666/93.

19.20. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666/93.

19.21. A substituição de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada, durante a execução do contrato, somente será admitida, a critério da Contratante, mediante a comprovação de experiência equivalente ou superior do substituto proposto.

19.22. Os serviços deverão desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a Contratada, sua equipe e a Fiscalização, dispondo esta, de amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento do Contrato.

19.23. Reserva-se à Contratante o direito de intervir nas obras/serviços quando ficar comprovada a incapacidade técnica da Contratada ou deficiência dos equipamentos e da mão-de-obra empregados, sem que desse ato resulte o seu direito de pleitear indenização, seja a que título for, aplicando-se as penalidades cabíveis.

20. DO PAGAMENTO

20.1. Os pagamentos **serão efetuados em parcelas** correspondentes às **medições mensais** a serem feitas de acordo com o estabelecido no **Cronograma físico-financeiro,** considerando os preços unitários constantes da Planilha de Quantidades, todos aprovados pelo Departamento de Engenharia do Município.

20.2. **Após a aprovação das medições**, o pagamento será realizado no **prazo de até 15 (quinze) dias**, mediante depósito na conta de titularidade da CONTRATADA, com a respectiva emissão e aceitação da nota fiscal e apresentação das guias de recolhimentos do INSS e notas fiscais dos materiais comprados pela CONTRATADA.

20.3. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidões e documentos vencidos, que tenham sido apresentados na ocasião da habilitação ou junto ao Cadastro de Fornecedores do Município de Capanema. Os pagamentos somente serão efetivados caso a CONTRATADA apresente situação regular.

20.4. Qualquer suspensão de pagamento devido à falta de regularidade do fornecedor não gerará para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigação de reajustamento ou atualização monetária do valor devido.

20.5. Os pagamentos somente serão efetuados após o repasse dos valores pelo órgão CONCEDENTE, em decorrência do Convênio especificado no item 2 deste edital, não gerando para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigação de reajustamento ou atualização monetária do valor devido caso a CONCEDENTE não repasse os valores nos prazos previstos nos itens acima.

20.5.1. Todavia, para evitar prejuízo à CONTRATADA, verificando o CONTRATANTE que o órgão CONCEDENTE não repassou as verbas necessárias ao pagamento da respectiva parcela até o 30° (trigésimo) dia após a medição realizada, a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA do fato, facultando a esta a suspensão da execução da obra, até a liberação do pagamento. A opção pela suspensão da execução da obra deve ser formalizada por escrito e anexada ao processo licitatório.

20.6. O pagamento dos valores devidos pela Contratante fica condicionado ao pagamento e comprovação dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes órgãos:

a) CREA, por meio da ART de Execução da Obra - Anotação de Responsabilidade Técnica;

b) ISS do Município de Capanema;

c) INSS, através da matrícula da obra;

d) Prefeitura Municipal, através do Alvará de Construção da obra;

20.7. Na ocasião do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada deverá apresentar na tesouraria da Contratante, além dos documentos exigidos no item anterior:

a) Comprovante de medição realizada pelo Departamento de Engenharia do Município, devidamente assinada pelo Engenheiro responsável pela fiscalização da obra;

b) Certidões de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo mês do pagamento.

20.8. A liberação da última parcela estará condicionada à elaboração do Termo de Recebimento Provisório das obras e/ou serviços contratados, o qual será lavrado em até 15 (quinze) dias após a notificação da conclusão da obra realizada pela CONTRATADA, devendo esta, ainda, apresentar as seguintes documentações:

a) Comprovação de regularidade trabalhista e previdenciária da obra;

b) Certificado de vistoria e conclusão da obra efetuado pelo Departamento de Engenharia do Município;

c) Termo de Recebimento Provisório da obra;

20.9. Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição contratual ou de execução incorreta da obra, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais.

20.10. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e indenização pelos danos decorrentes.

20.11. O pagamento poderá ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovação de cumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste Edital.

20.11.1. Na hipótese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisão do contrato.

20.12. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

20.13. A Administração somente efetuará o pagamento após a ocorrência das seguintes hipóteses, sendo facultada a adoção de apenas uma delas:

20.13.1. Mediante a comprovação da quitação dos tributos referentes à aquisição ou prestação de serviço contratado; ou

20.13.2. Mediante retenção diretamente sobre o valor devido ao contratado do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), caso o referido tributo incida na contratação, bem como o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos da Lei Complementar Federal nº 116/03, e na Lei Municipal 950/03.

20.14. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

20.15. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou indenizações devidas pelo contratado.

20.16. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de processo administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes.

20.17. É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

21. DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

21.1. O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

21.1.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

21.2. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a

finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

21.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas.

21.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

21.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE formada por três servidores efetivos. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) obra(s) será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

21.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas, e somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato.

21.5. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

22. DAS SANÇÕES

22.1. Comete infração administrativa, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:

a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;

b) Apresentar documentação falsa;

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

e) Comportar-se de modo inidôneo;

f) Cometer fraude fiscal;

g) Fizer declaração falsa;

h) Ensejar o retardamento da execução do certame.

22.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Multa de até **2% (dois por cento)** sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Capanema e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até dois anos;

22.3. Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita às sanções administrativas abaixo, garantidas a prévia defesa:

22.3.1. Advertência por escrito;

22.3.2. Multas:

a) **Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo que exceder à data prevista para a conclusão da obra, contado do 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Início da Obra, concedida nos termos da Cláusula Quarta, do Contrato de Repasse** Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO

b) **Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo de atraso na colocação de placas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, contado do 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Início da Obra, concedida nos termos da Cláusula Quarta, do Contrato de Repasse nº** Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO;

c) Multa de 5,0% sobre o valor do contrato no caso de execução incorreta da obra, quando impossível a seu refazimento, ou recusa da CONTRATADA em refazer os serviços, sem prejuízo das glosas parciais ou totais realizadas nas medições da Fiscalização;

d) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato quando, por ação, omissão ou negligência, a CONTRATADA infringir qualquer disposição do Edital, cláusula ou condição do contrato não especificada nas alíneas "a" e "b" deste item, aplicada em dobro na reincidência;

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato quando a CONTRATADA ceder o Contrato, ou subcontratar a obra, no todo ou em parte, para pessoa física ou jurídica, sem autorização do CONTRATANTE, devendo reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

f) Multa de 20,0% sobre o valor do contrato, quando ocorrer rescisão do contrato pelos seguintes motivos:

1- quando a contratada falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;

2- quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, cujo aditivo de prorrogação contratual deverá obrigatoriamente ser aprovado pela Procuradoria Municipal, sob pena de nulidade;

3- quando houver inadimplência de cláusulas e condições contratuais por parte da CONTRATADA e desobediência das determinações da fiscalização;

4- demais hipóteses mencionadas no art. 78, da Lei 8.666/93.

22.3.2.1. A aplicação das sanções previstas neste edital, não exime a CONTRATADA de ressarcir à CONTRATANTE por outros eventuais prejuízos causados que ultrapassem o valor das multas previstas neste instrumento.

22.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

22.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

22.4. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que:

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

22.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93, e subsidiariamente na Lei nº 9.784/99.

22.6. A multa será descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos eventualmente devidos pela Administração.

22.7. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de competência exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal.

22.8. As demais sanções são de competência exclusiva do Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

22.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

22.10. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa do Município e cobradas judicialmente.

22.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

22.12. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

23. DA RESCISÃO DO CONTRATO

23.1. Constituem motivo para rescisão do contrato:

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no início e na finalização da obra;

e) A paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

f) A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste edital e no contrato;

g) A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da Administração e autorização em contrato.

h) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

i) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

j) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

k) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

l) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

m) Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

n) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;

o) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

p) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes da obra, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

q) A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução da obra, nos prazos contratuais;

r) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;

s) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

23.2. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

24.DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO

24.1. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.

24.2. A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

25. DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO

25.1. A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento quando eivado de vício insanável.

25.2. A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

25.3. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.

25.4. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que diretamente dependam ou sejam consequências do ato anulado.

25.5. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará expressamente os atos a que ela se estende.

25.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

24.7. A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

25.8. Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais interessados.

26. DAS ALTERAÇÕES, ACRÉSCIMOS, SUPRESSÕES DE SERVIÇOS E REAJUSTE

26.1. Qualquer modificação que se faça necessária durante o andamento das obras/serviços, seja nos projetos, detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a critério do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizará por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras/serviços para melhor adequação técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alterações posteriores.

26.2. Caso venha a ser necessário nas obras/serviços contratada a realização de serviços adicionais não previstos originalmente, o novo custo global será definido com base nos preços unitários constantes da Tabela de Preços Unitários vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada pelos órgãos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condições da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

26.3. No caso de acréscimo de serviços, a Ordem de Serviço Correspondente somente será expedida após a formalização do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido às formalidades legais.

26.4. Em caso de prorrogação contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu causa à prorrogação, fica ajustado que a correção dos valores será pelo índice INPC/IBGE.

26.5. O aditivo de prorrogação da execução da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o cronograma físico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execução, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

26.6. Todos os fatos que ensejam a suspensão ou paralisação da obra devem necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual será juntada ao processo licitatório.

27. DO FORO

27.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Capanema-PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

28. DISPOSIÇÕES FINAIS

28.1. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

28.2. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura execução da obra.

28.3. É facultado à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive com a fixação de prazo de resposta, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar desde a realização da Sessão Pública.

28.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

28.5. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Município de Capanema-PR.

28.6. Qualquer impugnação, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Edital deverão ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, endereçada ao Setor de Licitações do Município, considerando-se a data de recebimento da correspondência para verificação da tempestividade dos atos, respeitando-se os prazos previstos neste edital.

28.7. O Setor de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no horário de expediente, na Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, centro - Município de Capanema PR.

Capanema-PR, 01 de agosto de 2018.

Américo Bellé
Prefeito Municipal

ANEXO 01
CARTA CREDENCIAL

(local e data)

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 12/2018.

Senhores

O abaixo assinado....., portador da carteira de identidade nº ....., na qualidade de responsável legal pela proponente ....., vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria que o senhor ....., carteira de identidade nº ....., é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e proposta de preços, para assinar as atas e demais documentos, e com poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitação em epígrafe.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal (**COM RECONHECIMENTO DE FIRMA**), e carimbo do CNPJ da empresa)

ANEXO 02
Declaração de Regularidade no Ministério do Trabalho

(em papel preferencialmente timbrado com razão social, CNPJ, endereço completo, endereço eletrônico, telefone, fax, com nome e assinatura do representante legal)

Abaixo consta modelo para apresentação da Declaração de Atendimento ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. A declaração deverá ser entregue em papel timbrado da empresa licitante, com assinatura de seu Representante Legal. Em caso de necessidade, deve ser feita a ressalva relativa ao emprego de aprendiz; se não for o caso, esta ressalva não deve constar da declaração.

DECLARAÇÃO DE* REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO *EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Referência:

Município de Capanema - PR
Tomada de Preços nº 12/2018.

_____ , inscrita no CNPJ/MF nº_____ , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)_____ , portador(a) do documento de identidade RG nº _____ , emitido pela SSP/__ , e do CPF nº_____ , DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Capanema-PR, __ de _____ de 2018.

_____(Assinatura do representante legal)_____
Nome
RG/CPF
Cargo
Carimbo do CNPJ da empresa

ANEXO 03
ATESTADO DE VISITA

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 12/2018

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO

Declaramos que o engenheiro....., CREA nº ..... da empresa....., responsável técnico da proponente, devidamente credenciado, visitou o local da execução da obra objeto do Tomada de preços em epígrafe.

(Local e Data)

(nome, RG/CREA e assinatura do responsável pelo Licitador)

ANEXO 04
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 12/2018

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA nº	Data do registro	Assinatura do profissional

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das Leis Trabalhistas vigentes.

(local e data)

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)

ANEXO 05
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 12/2018

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Tomada de Preços nº 12/2018, instaurado pelo Município de Capanema-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como, que nossa empresa não possui menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

(LOCAL E DATA)

_____

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)

ANEXO 06
CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

(Identificação da Proponente - razão social, endereço, telefone e CNPJ, etc.)

(Local e data)

À Comissão de Licitações

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 12/2018.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de R$.....(.....), sendo R$.....(....) referentes à mão-de-obra e R$ ....(....) referentes ao fornecimento do material.

O prazo de execução do objeto da licitação é de.....meses, contados a partir do 10° dia após a assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de preços é de.....(.....) meses (no mínimo 06 (seis) meses, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)

ANEXO 07
DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO BDI

CAIXA

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Gestor / Programa / Ação / Modalidade	Município/UF
1041530-91	**Ministério das Cidades / Planejamento Urbano**	**Capanema-PR**

Proponente	Objeto	Empreendimento/Apelido
Prefeitura Municipal de Ca	**Pavimentação Poliedrica com Pedras Irregulares em Vias Públicas Urbanas**	**Calçamentto Tamoios**

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)

ITENS		*SIGLAS*	*VALORES*
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		AC	3,80%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO		S+G	0,32%
TAXA DE RISCO		R	0,50%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS		DF	1,02%
TAXA DE LUCRO		L	6,64%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	I	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
	ISS (legislação municipal)		3,00%
	CPRB (INSS)		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU			20,73%
BDI RESULTANTE			**26,85%**

FÓRMULA UTILIZADA: $$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 100,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 3,00%

Observações:

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome: Rubens Luis Rolando Souza
CREA/CAU: RS 88.296/D
ART/RRT: 20171998970

Data: 19/07/2018

ANEXO 08

TERMO DE RENÚNCIA

À Comissão de Licitações

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 12/2018

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Tomada de Preços nº 12/2018, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

(local e data)

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)

123

ANEXO 10
DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE

_____, CPF nº _____, CREA nº _____, declara que é conhecedor das condições constantes no Tomada de Preços nº 12/2018 e que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa _____, CNPJ nº_____, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO

Cidade _____, ____ de _____de 2018.

_____
(nome, RG e assinatura do declarante)

ANEXO 11

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – MODELO

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa _____(denominação da Pessoa Jurídica), inscrita no CNPJ sob o nº _____, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório Tomada de Preços nº 12/2018, realizado pelo Município de Capanema – PR.

___/___/2018

_____

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa **COM FIRMA RECONHECIDA**)

125

ANEXO 12

DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Referência:

Município de Capanema - PR
Tomada de Preços N° 12/2018

_____ , inscrita no CNPJ/MF nº_____ , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)_____ , portador(a) do documento de identidade RG nº _____ , emitido pela SSP/__ , e do CPF nº_____ , DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no 8.7.5, alínea "g" do edital de licitação, que possui todos equipamentos mínimos e dispõe de pessoal técnico para a execução do objeto da licitação.

I. Caminhão basculante;

II. Rolo vibratório pra compactação;

III. Ferramentas manuais (carrinhos, pás, picaretas, enxadas, soquetes, martelos etc.);

IV. Mão-de-obra suficiente para a execução do contrato no prazo pactuado.

Analisando os compromissos e contratos de prestação de serviços vigentes na data da Sessão Pública, DECLARA também que os equipamentos acima e pessoal estão disponíveis para execução da obra objeto deste certame licitatório, não possuindo outros compromissos ou contratos que cumulativamente possam necessitar de tais equipamentos e pessoal, e consequentemente colocar em risco o cumprimento dos prazos de execução desta obra.

_____, __ de _____ de 2018.

_____(Assinatura do representante legal)_____
Nome e RG/CPF
Cargo
Carimbo do CNPJ

OBS.: Todas as declarações deverão ser emitidas em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ, salvo o Atestado de Visita (Anexo 03), onde a emissão é de responsabilidade do Município de Capanema – PR.

ANEXO 09

MINUTA CONTRATO Nº X12/2018

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA.....

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execução de Obra, sem vínculo empregatício, de um lado o **MUNICÍPIO DE CAPANEMA**, com sede e Prefeitura à Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 75.972.760/00XX-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **AMÉRICO BELLÉ.** De outro lado a empresa....., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ....., neste ato representada pelo(a) Sr(a).....inscrito no CPF nº....., residente e domiciliado em.....,doravante denominada CONTRATADA, vêm firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, obedecidas às condições estabelecidas na licitação realizada na modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2018**, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

1. CLÁUSULA **PRIMEIRA** - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.**, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos referentes à licitação Tomada de Preços 12/2018.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de **Tomada de Preços Nº** 12/2018, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

2. CLÁUSULA **SEGUNDA** - DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O preço global para a execução do objeto deste contrato é de R$ **XXXX (por extenso)**.

2.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.1.2. O valor global deste contrato não será reajustado, salvo nas hipóteses previstas em lei.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

DOTAÇÕES					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2018	1350	08.002.15.451.1501.1151	0	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
2018	1355	08.002.15.451.1501.1151	870	4.4.90.51.00.00	Do Exercício

3.2. Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício subsequente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

4.1. As obras serão executadas nos locais e na forma descritos no projeto básico dos empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificações que acompanham o edital.

4.2. O prazo para a conclusão da obra é de no máximo **6 (seis) meses**,

4.2.1. O prazo de execução dos serviços terá início **10° (décimo) dia a partir da Ordem de Início da Obra, concedida nos termos da Cláusula Quarta, do Contrato de Repasse nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO e deverá respeitar o cronograma físico-financeiro previsto no projeto básico.**

4.3. Os serviços deverão ser iniciados no máximo até o 10° (décimo) dia **a partir da Ordem de Início da Obra, concedida nos termos da Cláusula Quarta, do Contrato de Repasse nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO e deverá respeitar o cronograma físico-financeiro previsto no projeto básico.**

4.4. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no Projeto Básico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.5. Somente será admitida alteração do prazo quando:

a) houver alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;

b) houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos do CONTRATANTE;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execução;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusão da obra devido à hipótese de suspensão da execução, nos termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como decorrentes de força maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

5. CLÁUSULA **QUINTA** - DA VIGÊNCIA

5.1. O prazo de vigência do Contrato será de **12 (doze) meses**, contados a partir da data da assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigência previsto no item acima terá início na data de ...../...../..... e encerramento em ...../...../.....

5.3. O prazo de vigência de contrato é maior do que o prazo para a execução da obra devido à necessidade de realizar medições, pagamentos e prestação de contas, entre outros procedimentos.

5.4. Na hipótese de necessidade de aditivo de prorrogação contratual, será discriminado o novo prazo de vigência do contrato e o novo prazo para execução da obra.

6. CLÁUSULA **SEXTA** - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mão-de-obra, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços e demais atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. **Elaborar e disponibilizar à CONTRATANTE os projetos executivos** desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução da obra, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e

entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada deverá apresentar ao Departamento de Engenharia do Município, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, um cronograma de dimensionamento de mão-de-obra, isto é, relação nominal de todo o pessoal técnico que irá executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma físico da obra.

6.1.2.2. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Básico (memorial descritivo), apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos;

6.1.2.3. O projeto executivo deverá ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a partir da assinatura do contrato.

6.1.2.4. A não elaboração do projeto executivo pela empresa contratada ensejará a aplicação das multas previstas neste edital, bem como, na hipótese de haver necessidade de aditivos contratuais por inconsistências encontradas entre o projeto básico e a execução da obra, verificadas após o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao "risco", da composição do BDI apresentado pela empresa, será descontado do valor final de um possível aditivo.

6.1.3. Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496, de 1977;

6.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Projeto Básico, nos termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

6.1.4.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra;

6.1.5. Assegurar à CONTRATANTE:

6.1.5.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

6.1.5.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

6.1.6. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, no prazo determinado.

6.1.7. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

6.1.8. Atentar, em relação ao material, para todas as disposições e especificações constantes no Projeto Básico.

6.1.9. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

6.1.10. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento da obra, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação da obra em relação ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execução da obra, para possibilitar a sua fiscalização.

6.1.11. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste instrumento e as especificações constantes no projeto básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.12. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA.

6.1.13. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

6.1.14. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

6.1.15. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos documentos relativos à execução da reforma.

6.1.16. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

6.1.17. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

6.1.18. Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigações inerentes à execução dos serviços ora contratados.

6.1.19. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

6.1.20. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e telefônicas.

6.1.21. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra.

6.1.22. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachás, com fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's;

6.1.23. Manter sediado junto à Administração, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

6.1.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Administração;

6.1.25. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração;

6.1.26. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

6.1.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços, fora das suas especificações;

6.1.28. Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

6.1.29. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do patrimônio público;

6.1.30. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Projeto Básico ou neste contrato;

6.1.31. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a sua habilitação e qualificação no certame licitatório;

6.1.32. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados utilizados na execução dos serviços.

6.1.33. Fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos para a execução da obra;

6.1.34. Examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de serviços para uma proposta de preços completa e satisfatória;

6.1.35. Providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS.

7. CLÁUSULA **SÉTIMA** - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato e demais documentos da licitação;

7.1.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei n° 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em interrupção na execução do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato;

7.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

7.1.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

7.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das normas ambientais vigentes;

7.1.9. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Básico e seus anexos;

7.1.10. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8. CLÁUSULA **OITAVA** - DAS VEDAÇÕES

8.1. É vedado à CONTRATADA:

8.1.1. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, bem como a associação do contratado com outrem, bem como a cessão ou transferência, total ou parcial, de qualquer encargo, obrigação ou direito relativo ao objeto desta licitação.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

8.1.3. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

9. CLÁUSULA **NONA** - DO PAGAMENTO E DAS MEDIÇÕES

9.1. O prazo e a forma do pagamento estão previstos no item 21 do edital.

9.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada, inspecionada e aprovada pela fiscalização.

9.2.1.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

9.2.1.2. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitação antecipada do valor respectivo.

9.2.2. A CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados.

9.2.2.1. No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

9.2.2.2. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

9.2.3. Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

9.3. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

9.3.1. O "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente executados.

9.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos, havendo desconformidade na execução dos serviços identificada pelo Departamento de Engenharia ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei nº 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

9.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

9.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

$$I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.

VP = Valor da Parcela em atraso.

10. CLÁUSULA **DÉCIMA** - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1. O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

10.2. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

10.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes

da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (*sessenta*) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) obra(s) será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas, e somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11. CLÁUSULA **DÉCIMA PRIMEIRA** - DA FISCALIZAÇÃO

11.1. A fiscalização se dará conforme o item 20 do edital.

12. CLÁUSULA **DÉCIMA SEGUNDA** - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE

12.1. Qualquer modificação que se faça necessária durante o andamento das obras/serviços, seja nos projetos, detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a critério do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizará por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras/serviços para melhor adequação técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alterações posteriores.

12.2. Caso venha a ser necessário nas obras/serviços contratada a realização de serviços adicionais não previstos originalmente, o novo custo global será definido com base nos preços unitários constantes da Tabela de Preços Unitários vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada pelos órgãos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condições da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3. No caso de acréscimo de serviços, a Ordem de Serviço Correspondente somente será expedida após a formalização do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido às formalidades legais.

12.4. Em caso de prorrogação contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu causa à prorrogação, fica ajustado que a correção dos valores será pelo índice INPC/IBGE.

12.5. O aditivo de prorrogação da execução da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o cronograma físico-

financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execução, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

12.6. Todos os fatos que ensejam a suspensão ou paralisação da obra devem necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual será juntada ao processo licitatório.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. As penalidades cabíveis estão pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

14.1. Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios.

14.2. Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que eles devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade.

14.3. Em nenhuma hipótese será admitido emprego de servidores públicos municipais bem como equipamentos, veículos e máquinas públicas na execução da presente obra, sob pena de rescisão contratual e apuração quanto à improbidade administrativa de agentes públicos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual – EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs.

15.2. O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA.

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Lei Federal nº 6.514 de 22/12/77, Portaria nº 3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

15.4. Deverão ser observadas pela contratada todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 08/06/78, Lei Federal nº 6.514, de 22/12/77.

15.5. O CONTRATANTE estará autorizado a interditar serviços ou parte destes em caso do não-cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução da obra.

15.6. Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente(s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato.

16.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

16.3. A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.

16.4. A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

16.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil, especialmente a denunciação da lide, se for o caso.

16.6. A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

16.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum título.

17. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - MEDIDAS ACAUTELADORAS

17.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784/99, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

18. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

18.1. Os motivos para a rescisão do presente Contrato estão pormenorizados no item 24 do edital.

18.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

18.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

18.4. Quando a rescisão ocorrer com base nas alíneas "m" a "q" do item 23.1, do edital, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

18.5. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução dos valores das multas e indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

19. CLÁUSULA **VIGÉSIMA** - DOS CASOS OMISSOS

19.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/90, na Lei Complementar nº 123/06, e na Lei nº 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

20. CLÁUSULA **VIGÉSIMA** - DA PUBLICAÇÃO

20.1. A publicação resumida do instrumento de contrato no Diário Oficial do Município será providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

21. CLÁUSULA **VIGÉSIMA SEGUNDA** - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

21.1. A troca eventual de documentos e correspondências entre o **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** será feita através de protocolo, nos termos do item 28.6 do edital.

22. CLÁUSULA **VIGÉSIMA SEGUNDA** - DO FORO

22.1. As questões decorrentes da utilização do presente Instrumento que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, Comarca de Capanema - PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Município de Capanema - PR, XX de **XXXX** de 2018.

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Contratada
Representante legal

139

ANEXO 13

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

TOMADA DE PREÇOS Nº: 12/2018

PROPONENTE:

MUNICÍPIO / LOCAL:	
OBJETO:	ÁREA CONSTRUÍDA:
LOTE:	PRAZO DE EXECUÇÃO:

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS		Prazo de Execução (dias)							
			30	60	90	120	150	180	210	240
1		Utilização								
		Quantidade								
2		Utilização								
		Quantidade								
3		Utilização								
		Quantidade								
4		Utilização								
		Quantidade								
5		Utilização								
		Quantidade								
6		Utilização								
		Quantidade								
7		Utilização								
		Quantidade								
8		Utilização								
		Quantidade								
9		Utilização								
		Quantidade								
10		Utilização								
		Quantidade								
11		Utilização								
		Quantidade								
12		Utilização								
		Quantidade								
13		Utilização								
		Quantidade								
14		Utilização								
		Quantidade								
15		Utilização								

		Quantidade								
16		Utilização								
		Quantidade								

carimbo, nome, RG assinatura responsável legal	carimbo, nome RG nº CREA assinatura prof	Local/data/ano

111

PARECER JURÍDICO N° 248/2018

INTERESSADO: Comissão Permanente de Licitações.
ASSUNTO: Análise prévia a Tomada de Preços n° 12/2018.

EMENTA: ANÁLISE DA LICITAÇÃO. MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS. OBRA PÚBLICA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLANAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA/PR ORIUNDA DO CONTRATO DE REPASSE 856605/2017/MCIDADES. PROCESSO NUMERADO COM DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. OBJETOS E JUSTIFICATIVAS SUFICIENTES. POSSIBILIDADE DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL.

1. CONSULTA:

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela portaria n° 6.905/2017, encaminha para análise desta Procuradoria Jurídica o Processo Licitatório de modalidade Tomada de Preços n° 12/2018.

Denota-se do processo licitatório que o objeto é a contratação de empresa especializada na execução de pavimentação poliédrica, drenagem pluvial e terraplanagem na rua tamoios entre a Rua Rio Grande do Norte e Av. Ataides Roberto Escher no Bairro São Cristóvão em Capanema/Pr oriunda do Contrato de Repasse 856605/2017/MCIDADES, conforme condições e especificações contidas no edital e seus anexos.

Constam no processo administrativo:

I) Portaria n° 6.905/2017 – fl. 01;

II) Solicitação de autorização para abertura de licitação – fl. 02;

III) Projeto Básico (Laudo Elétrico, Contrato de Repasse, Projetos, Planilhas e Memorial Descritivo) – fls. 03/72;

IV) Despacho de encaminhamento do Prefeito Municipal – fl. 73;

V) Parecer do Departamento de Contabilidade – fls. 74;

VI) Relatório do Sistema de Protocolo – fls. 75/76;

VII) Termo de Acordo de Medidas Compensatórias e mitigadoras firmado entre o Município de Capanema e o CEBI – fls. 77/83;

VIII) Minuta do edital – fls. 84/114;

IX) Anexo 01 – fl. 115; Anexo 02 – fl. 116; Anexo 03 – fl. 117; Anexo 04 – 118; Anexo 05 – fl. 119; Anexo 06 – fl. 120; Anexo 07 – fl. 121; Anexo 08 – fl. 122;

Anexo 10 – fl. 123; Anexo 11 – fl. 124; Anexo 12 – fl. 125; Anexo 09 (minuta contratual) – fls. 126/138; e, Anexo 13 – fl. 139/140. É o relatório.

2. PARECER:

Convém destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria, nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei 8.666/93, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico dos documentos apresentados, não cabendo nenhuma consideração acerca do mérito da presente contratação e da discricionariedade da Administração Pública ao traçar os parâmetros dos produtos entendidos como necessários.

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestação jurídica tem o escopo de apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico e recomendar alguma providência para salvaguardar a Administração e o erário público. Assim, parte das observações aqui expendidas se constitui em recomendações e, caso a Administração opte por não acatá-las, recomenda-se motivar o ato, nos termos do art. 50, da Lei n° 9.784/99. O cumprimento ou não das recomendações decorre do exercício da competência discricionária da autoridade administrativa, a qual responde isoladamente no caso de descumprimento das recomendações deste parecer ou pela ausência de fundamentação dos atos administrativos.

Contudo, as questões que envolvem a legalidade, isto é, os requisitos previstos no ordenamento jurídico são de observância obrigatória, os quais, para não serem aplicados, deve haver motivação e justificativa plausível para tanto.

Nesse rumo, forçoso reconhecer que a análise dos aspectos técnicos dos objetos da contratação pretendida pela Administração não constitui tarefa afeta a este órgão jurídico, o que somente de forma excepcional poderemos adentrar, em razão da omissão grosseira do setor competente na descrição dos objetos ou na justificativa da contratação.

Ante as questões acima suscitadas, passaremos à análise dos aspectos relacionados à legalidade do feito.

2.1. Da modalidade tomada de preços

143

No tocante à escolha da modalidade tomada de preços, os fundamentos estão assentados no art. 23, I, "b" e II, "b", da Lei 8.666/93.

Conforme a legislação vigente, por esta modalidade de certame a Administração escolhe entre os possíveis interessados do ramo de que trata o objeto da licitação, devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, que comprovem possuir requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital.

Nesse prisma, verifica-se que o valor máximo delimitado pela Administração para o pagamento do objeto do certame é de R$ 387.001,82 (trezentos e oitenta e sete mil, um real e oitenta e dois centavos), justificando a realização de licitação pela modalidade tomada de preços.

2.2. Do Projeto Básico

Projeto básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar obra ou serviço ou complexo de obras ou serviços. É imprescindível para realização de qualquer obra ou serviço de engenharia.

Portanto, toda licitação de obra ou serviço realizada em qualquer modalidade de licitação deve ser precedida da elaboração de projeto básico.

Estabelece a Lei de Licitações que o projeto básico deve estar anexado ao ato convocatório, dele sendo parte integrante.

Além de ser peça imprescindível para execução de obra ou prestação de serviços, o projeto básico é documento que propicia a Administração conhecimento pleno do objeto que se quer licitar, de forma detalhada, clara e precisa. Permite ao licitante ter acesso a informações e elementos necessários a boa elaboração da proposta, mediante regras estabelecidas pela Administração a que estará sujeito.

Destarte, limitando-se a examinar a presença dos documentos acima mencionados, em razão de se tratar de documento técnico, verifica-se que o Projeto Básico atende aos requisitos legais, fornecendo subsídios claros e suficientes para que os licitantes elaborem as suas propostas.

2.3. Das minutas de edital e do contrato

144

A análise das minutas de edital e de contrato foi conduzida à luz da legislação aplicável ao presente caso, qual seja, a Lei 8.666/93, que regulamente a Tomada de preços, bem como a Lei Complementar Federal nº 123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

No tocante à minuta do edital, verifica-se que foram preenchidos os requisitos essenciais do art. 40, da Lei 8.666/93.

Adequada, também, a minuta do contrato constante do Anexo 09, em que detalha o objeto, as suas peculiaridades, bem como prevê as cláusulas essenciais dispostas no art. 55, da Lei 8.666/93.

Mesmo não estando a Administração obrigada a exigir prestação de garantia (art. 56, da Lei 8.666/93), mas considerando que diversas empresas locais e regionais, que normalmente têm participado das licitações de obras já se encontram compromissadas com a execução de diversas outras obras deste segmento perante esta Municipalidade, s.m.j. a Procuradoria recomenda a inclusão na Minuta do Edital e Anexos da exigência da prestação de garantia de execução, nas modalidades descritas nos incisos I a III do citado art. 56, da Lei 8.666/93.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta favoravelmente à publicação da minuta de edital em apreço, bem como de seus anexos, ora rubricados com o intuito de identificar a documentação examinada;

Em atenção a recomendação apresentada pela PGM na parte final do Parecer Jurídico nº 190/2018, emitido na TP 09/2018, nesta oportunidade é possível analisar a questão de modo diferente, tendo em vista ao aporte financeira oriundo do Termo firmado entre o Município e o CEBI (fls. 77/83).

Ademais, importante salientar a necessidade de publicação deste edital no portal eletrônico do Município de Capanema, em atendimento à Lei Federal 12.527/2011, bem como no Diário Oficial da União por se tratar de obra parcialmente financiada com recursos federais.

Capanema, 02 de agosto de 2018.

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Municipal
OAB/PR 56.675

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Jurídico de Capanema - PR
Dec. nº 6001/2015
OAB/PR 56.675

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Capanema - PR, 02 de agosto de 2018

Assunto: Tomada de Preços nº 12/2018

DE: Prefeito Municipal
PARA: Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo AUTORIZO a licitação sob a modalidade Tomada de Preços, que tem por objeto o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017-OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

A Comissão de Licitação é aquela nomeada pela Portaria Nº 6.905 de 30 de novembro de 2017.

Encaminhe-se ao Setor de Licitações para as providências necessárias.

Américo Bellé
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº12/2018
O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:
Modalidade: Tomada de Preços nº 12/2018
Tipo de Julgamento: Menor preço por item.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO
Valor da Licitação: R$ 387.001,82 Trezentos e Oitenta e Sete Mil e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos).
Abertura das propostas:09:00 horas do dia 31/08/2018
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br.
Capanema-PR, 02/08/2018.
Américo Bellé- Prefeito Municipal

SEXTA-FEIRA, 03 DE AGOSTO DE 2018

EDIÇÃO 0086
6 PÁGINAS

147

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA

Autorizado pela Lei 1648/2018

www.capanema.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
CAPANEMA

MUNICIPIO DE CAPANEMA:75972760000160

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAPANEMA:75972760000160
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PR, l=Capanema, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=Autenticado por AR FACIAP, cn=MUNICIPIO DE CAPANEMA:75972760000160
Dados: 2018.08.02 17:04:19 -03'00'

ERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADO DE AR INTERNO, GARANTINDO UMA MAIOR HOMOGENEIDADE NA TEMPERATURA INTERNA, DEGELO AUTOMÁTICO SECO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL, CÂMARA INTERNA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL, 05 PRATELEIRAS FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, PORTA DE VIDRO TRIPLO TIPO "NO FOG", ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE CFC, EQUIPADO COM 4 RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO NA PARTE FRONTAL PARA FÁCIL TRAVAMENTO, PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR DE FÁCIL ACESSO, COM SISTEMA MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD, PROGRAMÁVEL DE 2°C A 8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA, ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED DE ALTA CAPACIDADE E VIDA ÚTIL COM ACIONAMENTO NA ABERTURA DA PORTA OU EXTERNAMENTE NO PAINEL FRONTAL, SISTEMA DE ALARME VISUAL E SONORO DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA OU PORTA ABERTA, DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL, SILENCIADOR DO ALARME SONORO DE APENAS UM TOQUE, SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, SISTEMA DE BATERIA PARA ACIONAMENTO DOS ALARMES NA FALTA DE ENERGIA, TAMPA FRONTAL BASCULANTE PARA LIMPEZA DO SISTEMA MECÂNICO E FILTROS, CHAVE GERAL DE ENERGIA – LIGA/DESLIGA, REGISTRO NA ANVISA CLASSE II, ISO 13485, FDA OU CE, MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS, SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA AUTONOMIA DE ATÉ 72 HORAS NA FALTA DE ENERGIA, SISTEMA DE MONITORAMENTO AUTÔNOMO POR PEN DRIVE, PARA REGISTRO DE TEMPERATURAS, ALARMES E EVENTOS SEM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE OU COMPUTADOR, DISCADORA DE TELEFONE PARA 05 NÚMEROS PRÉ-PROGRAMADOS EM CASO DE VARIAÇÃO DA TEMPERATURA OU FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO PADRÃO RBC. GARANTIA DE 12 MESES. MARCA REFERÊNCIA: INDREL RVV440D OU SIMILAR. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ.
Os demais itens permanecem inalterados.

Capanema, 02 de agosto de 2018

Américo Bellé- Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº12/2018
O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:
Modalidade: Tomada de Preços nº 12/2018
Tipo de Julgamento: Menor preço por item.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO
Valor da Licitação: R$ 387.001,82 Trezentos e Oitenta e Sete Mil e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos).
Abertura das propostas:09:00 horas do dia 31/08/2018
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br.
Capanema-PR, 02/08/2018.
Américo Bellé- Prefeito Municipal

DECRETOS

DECRETO Nº 6.520, DE 02 DE AGOSTO DE 2018.

Decreta Luto Oficial de 3 (três) dias no Município de Capanema.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o passamento do Senhor Gerson Guth, servidor público do Município de Capanema, lotado na Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos.

DECRETA:

Art. 1º Luto Oficial de 03 (três) dias no Município de Capanema.

Art. 2º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, 02 dias do mês de agosto de 2018.

Américo Bellé
Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 7.157, DE 02 DE AGOSTO DE 2018.

Suspende, temporariamente, o atendimento no Paço Municipal e na Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 123, inciso X, da Lei Orgânica do Município de Capanema,

Considerando o Decreto nº 6.520/2018, que decretou Luto Oficial de 03 dias no Município de Capanema,

RESOLVE:


Art. 1º Suspender o atendimento ao público no Paço Municipal de Capanema, das 13h30m às 17h30m, no dia 02 de agosto de 2018, em virtude do falecimento do servidor público Gerson Guth, ocorrido na data de hoje.

Art. 2º Suspender os trabalhos da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos nos dias 02 e 03 de agosto de 2018, em razão do passamento do servidor público Gerson Guth, lotado na mencionada Secretaria como Auxiliar de Serviços Gerais III.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 02 dias do mês de agosto de 2018

Américo Bellé
Prefeito Municipal

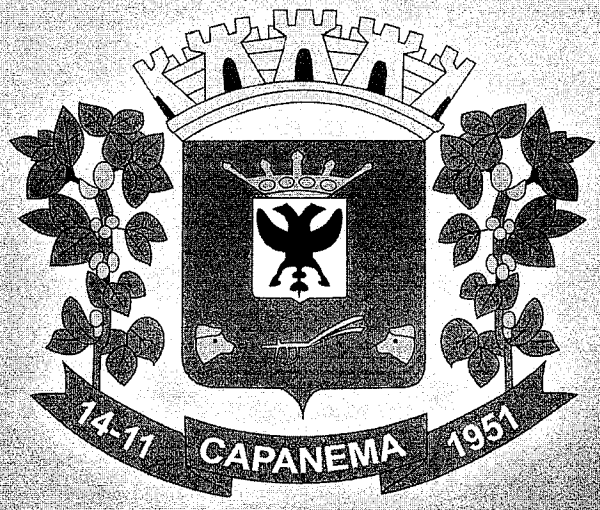

O ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PODE SER CONSULTADO GRATUITAMENTE NOS SEGUINTES LOCAIS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

internet: www.capanema.pr.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 103/2018

Registro de preços para futura aquisição de cartuchos e recarga de toners para impressoras e aquisição de easeos, para atender a todas as Secretarias, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, conforme especificações e anexos constantes no respectivo Edital. Encerramento do recebimento dos envelopes até 09h15min do dia 23 de Agosto de 2018 e abertos a partir das 09h30min, do mesmo dia, no mesmo local. O edital completo poderá ser obtido em sua integra no site: http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 3 de agosto de 2018.
IVANA YUMI SAITO PEREIRA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 99/2018

Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários (estante de aço), em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e anexos constantes no respectivo Edital. Encerramento do recebimento dos envelopes até 09h15min do dia 17 de Agosto de 2018 e abertos a partir das 09h30min, do mesmo dia, no mesmo local. O edital completo poderá ser obtido em sua integra no site: http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 3 de agosto de 2018.
IVANA YUMI SAITO PEREIRA
Pregoeiro

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo Administrativo: nº 087/2018 - Contrato: nº 297/2018 - 1º Termo Aditivo - Pregão: nº 052/2018.
Partes: Município de Arapongas e TACARI & TACARI LTDA, CNPJ nº 82.498.759/0001-00, representada por Rodrigo Cesar Tacari, CPF nº 018.661.089-05.
Objeto: registro de preços para contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para veículos leves e pesados em atendimento a Central de Veículos.
Objeto do Termo Aditivo: com fundamento no Processo Administrativo nº. 19572/2018 da Central de Veículos datado de 26/07/2018, acordam as partes, em acrescentar o veículo Voyage, placa ARF-4787, ano 2009 à relação de veículos do lote 25 pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente - SEASPMA. Data e assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo Administrativo: nº 123/2018 - Contrato: nº 341/2018 - 1º Termo Aditivo - Inexigibilidade: nº. 010/2018.
Partes: Município de Arapongas e VIACAO GARCIA LTDA, CNPJ nº 78.586.674/0001-07, representada por Estefano Boiko Junior, CPF nº 869.157.119-53.
Objeto: contratação direta da empresa Viação Garcia - Ltda, para fornecimento de passagens rodoviárias para atendimento de pessoas em situação de rua atendidas pelo Centro POP Vida Nova em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social.
Objeto do Termo Aditivo: revisão dos preços constantes no contrato, diante de reajuste nas tarifas autorizado pelo Departamento de Estradas e Rodagens - DER, e com fundamento no art. 65, II, "d" e § 5º da Lei nº 8.666/93, passando o item 01 - Vale Transporte intermunicipal Arapongas - Astorga, de R$ 4,20 para R$ 4,40 e o item 02 - Vale Transporte intermunicipal Apucarana - Rolândia de R$ 4,35 para R$ 4,55. Data e assinaturas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2018

O Município De Capanema, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: Modalidade: Tomada de Preços nº 12/2018. Tipo de Julgamento: Menor preço por item. Objeto: Contratação De Empresa Especializada Na Execução De Pavimentação Poliédrica Com Pedras Irregulares, Drenagem Pluvial E Terraplenagem Na Rua Tamoios Entre A Rua Rio Grande Do Norte E Av. Ataides Roberto Escher No Bairro São Cristóvão Em Capanema Pr. Em Atendimento Ao Contrato De Repasse Ogu Nº 856605/2017-Operação 1041530-91- Programa Planejamento Urbano. Valor da Licitação: R$ 387.001,82 Trezentos e Oitenta e Sete Mil e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos). Abertura das propostas:09:00 horas do dia 31/08/2018. Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de Souza, 1080- Capanema - Paraná - Centro. Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br.

Capanema-PR, 2 de agnsto de 2018.
AMÉRICO BELLÉ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 191/2018

Tipo: Menor Preço. Objeto: Registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, para a Contratação de Empresa para Executar Serviços de Limpeza das Caixas D' Água, bem como, A Higienização e a Desinfecção dos Reservatórios de Água Potável para os Diversos Órgãos da Administração Pública. Valor máximo: R$ 331.471,44. Abertura: 17/08/2018 às 09h00min. Acesso ao edital site: cascavel.atende.net. Informações: (45) 3321-2300.

Em 3 de agosto de 2018.
RENATO AUGUSTO DOS SANTOS
Diretor do Depto de Gestão de Compras e Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2018

Objeto: Aquisição de Ferramentas, Epi'S e Equipamentos, Para Uso das Secretarias Municipais de Interior e de Obras e Serviços Públicos - Recursos: Livres.
Emissão: 03 de Agosto de 2018.
Acolhimento das Propostas: Até 08h30 do Dia 20 de Agosto de 2018.
Abertura das Propostas: 08h31 do Dia 20 de Agosto de 2018.
Disputa: 09h00 do Dia 20 de Agosto de 2018.
Valor Máximo: R$ 171.154,25 (Cento e Setenta e Um Mil, Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos).
PRAZO DE RECURSO AO EDITAL: 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados na Superintendência de Suprimentos, sito à Praça Pedro Kaled, nº 22, Centro, Fone: (42) 2122 - 5046 - E-mail: licitacao.castro@gmail.com

JUCINEI IANKE
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 028/2018

Objeto: Construção de Abrigo de Resíduos Nos Postos de Saúde: Abapan (Pedro Machado de Souza), Bela Vista (Domingos Faustino Carvalho), Bom Jesus, Morada do Sol (Lineu Salgado), Prado Velho (Marcos Simão), Tronco (Derly Sebastião Prestes) e Vila Rio Branco - Sms.
Emissão: 03/08/2018.
Abertura: 22/08/2018.
Horário: 14:00 Horas.
Valor Máximo: R$ 140.856,32 (Cento e Quarenta Mil e Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados na Superintendência de Suprimentos, sito à Praça Pedro Kaled, nº 22, Centro, no tel: (42) 2122 5041, no site https://castro.atende.net/#!/ e no e-mail: licitacao.castro@gmail.com.

LINCOLN CÉSAR SCHMITKE
Presidente da Comissão de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2018

Objeto: Aquisição de Materiais e Equipamentos Laboratoriais Para Ações da Secretaria Municipal de Saúde - Recursos: Livres e Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Emissão: 03 de Agosto de 2018.
Acolhimento das Propostas: Até 08h30 do Dia 17 de Agosto de 2018.
Abertura das Propostas: 08h31 do Dia 17 de Agosto de 2018.
Disputa: 09h00 do Dia 17 de Agosto de 2018.
Valor Máximo: R$ 199.532,90 (Cento e Noventa e Nove Mil, Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Noventa Centavos).
PRAZO DE RECURSO AO EDITAL: 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados na Superintendência de Suprimentos, sito à Praça Pedro Kaled, nº 22, Centro, Fone: (42) 2122 - 5046 - E-mail: licitacao.castro@gmail.com

JUCINEI IANKE
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 98/2018

Objeto: Locação de Impressoras Para Impressão, Cópia e Digitalização de Documentos A Serem Utilizadas Pelas Diversas Secretarias Municipais - Recursos: Livres.
Emissão: 03/08/2018.
Abertura: 20/08/2018.
Horário: 14:00 Horas.
VALOR MÁXIMO: R$ 743.712,00 (setecentos e quarenta e três mil, setecentos e doze reais).
PRAZO DE RECURSO AO EDITAL: 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados na Superintendência de Suprimentos, sito à Praça Pedro Kaled, nº 22 - Centro, Fone: (42) 2122-5046 - Site http://castro.atende.net - E-mail: licitacao.castro@gmail.com.

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIÚVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2018
Reabertura

O MUNICÍPIO DE CURIÚVA, Estado do Paraná, através da Secretaria municipal de Educação e da Comissão de Pregão conforme portaria 07/2017, de conformidade com as Leis Federais n.º 8.666/93, 8.883/94, 10.520/2002 e 147/2014; Decretos Municipais 05/2006 e 046/2015 e alterações posteriores, torna público que se encontra a disposição dos interessados, a partir da data da publicação deste, até as 17h30min do dia 15/08/2018, a reabertura do Edital de Pregão Presencial objetivando a aquisição de aquisição de veículo sete lugares zero quilometro, a abertura dos envelopes será às 09h00min horas do dia 16/08/2018, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Curiúva. O Edital completo se encontra à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Curiúva à Av. Antônio Cunha, 81, no horário de expediente e no site www.curiuva.pr.gov.br

Curiúva PR, 2 de agosto de 2018.
NATA NAEL MOURA DOS SANTOS
Prefeito

LUCIANA MARÍLIA DA COSTA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR CAMARGO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2018
Repetição

Processo Nº 48/2018

O Município de Doutor Camargo, Estado do Paraná, torna público que fará realizar-se às 08h30min do dia 15 de Agosto de 2018, em sua sede à Rua Xavier da Silva, 1000, na sala de Sessão do Pregão da Prefeitura, a licitação na modalidade Pregão Presencial, visando à seleção de proposta mais vantajosa para aquisição de Equipamentos/Material Permanente para Unidade de Atenção Especializada e Unidades Básicas de Saúde, conforme PROPOSTA 08602.448000/1170-05-MS e Proposta 08602.448000/1170-06-MS, com o valor máximo e estimativa de consumo e descrições contidas no anexo I do edital. O Edital Nº 28/2018 com detalhes do Pregão Presencial tipo Menor Preço Por Item, estarão à disposição dos interessados, na Divisão de Licitação e no site do Município de Doutor Camargo.

Doutor Camargo-PR, 2 de agosto de 2018.
DANIELI DASSIE ZAMPARO
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL

AVISO DE LICITAÇAO
PREGAO PRESENCIAL Nº 33/2018

O Município de Farol, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, em sua sede às 09h00 do dia 15 de agosto de 2018, a licitação nº 33/2018, modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço para a Aquisição de Caminhão Compactador de Lixo, Objeto Vinculado Ao Convênio Funasa N.º Cv 0525/16 - Programa Saneamento Básico - Manejo de Resíduos Sólidos. O Qual Tem Por Objetivo A Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos A Fim de Contribuir Com A Limpeza da Cidade, Evitar Danos à Saúde dos Munícipes Além de Contribuir Com A Preservação do Meio Ambiente - Município de Farol/PRR,, conforme relacionado (s) no ANEXO I do Edital. www.farol.pr.gov.br Órgão Oficial Eletrônico Lei" 751/2015 - O edital completo e maiores informações poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Farol - PR, no Setor de Compras. Tel. (44)-3563-1101. Ou ainda em comprasfarol@gmail.com

Farol, 2 de agosto de 2018.
ADELSON FERNANDES DOS SANTOS
Pregoeiro

Contábil das instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF e os novos pronunciamentos, orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovados pelo Bacen (CPC 01, 03, 05, 10, 23, 24 e 25), especificamente aquelas aplicáveis a entidades cooperativas e a Lei do Cooperativismo nº 5.764 de 16 de dezembro de 1971 e Lei Complementar 130 de 17 de abril de 2009.
A autorização para a conclusão destas demonstrações financeiras foi concedida pela Diretoria em 02 de agosto de 2018.

NOTA 03 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS
As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração das demonstrações financeiras foram:

a) Apuração do resultado
Os ingressos e os dispêndios, assim como as receitas e as despesas, são registrados mensalmente de acordo com o regime de competência, que estabelece que os ingressos e os dispêndios e as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento, alocados de forma proporcional de acordo com os montantes do ingresso bruto de ato cooperativo e da receita bruta de ato não-cooperativo, quando não identificados com cada atividade.
De acordo com a Lei nº 5.764/71, o resultado é segregado e apresentado em atos cooperativos, aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados ou pelas cooperativas entre si, para a consecução de seus objetivos estatutários, e atos não cooperativos, aqueles que importam em operações com terceiros não associados.

b) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional e relações interfinanceiras à centralização financeira, cujo vencimento das operações na data da efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo.

Aplicações Interfinanceiras de liquidez
Representam operações a preços fixos referentes às compras de títulos com compromisso de revenda e aplicações em depósitos interfinanceiros e estão demonstradas pelo valor de resgate, líquidas dos rendimentos a apropriar correspondentes a períodos futuros.

d) Relações Interfinanceiros – Centralização financeira
Os recursos captados pela Cooperativa não investidos em suas atividades são centralizados através de repasses interfinanceiros para a Cooperativa Central, os quais são por ela utilizados para aplicações financeiras. Essas operações são caracterizadas como atos cooperativos, pela Lei nº 5.764/71 que define a política nacional do cooperativismo.

e) Operações de crédito
Estão demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos. As operações de crédito estão classificadas de acordo com análise da Administração quanto ao nível de risco, considerando a conjuntura econômica e os riscos específicos em relação às operações, aos devedores e aos garantidores, observando os parâmetros estabelecidos nas Resoluções nº 2.682/99 e nº 2.697/00 do CMN.
A atualização (âaccrualõ) das operações de crédito vencidas em até 60 dias é contabilizada em receitas de operações de crédito, e a partir do 61º dia, em rendas a apropriar. As operações classificadas como nível âHõ permanecem nessa classificação por seis meses, quando então são baixadas contra a provisão existente e controladas, por cinco anos, em contas de compensação, não mais figurando no balanço patrimonial.

f) Provisão para operações de crédito
A provisão para perdas com operações de crédito é fundamentada na análise das operações e leva em consideração a conjuntura econômica, a experiência passada, os riscos específicos e globais das carteiras, considerando os critérios de provisionamento, definidos nas Resoluções nº 2.682/99 e nº 2.697/00 do CMN, associados às avaliações procedidas pela Administração, na determinação dos riscos de crédito.

g) Demais ativos circulantes e realizáveis a longo prozo (não circulantes)
Demonstrados pelo custo de aquisição, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias pro rata dia incorridos e as variações cambiais, deduzidos das correspondentes provisões para perdas ou ajuste ao valor de mercado e rendas a apropriar.

h) Investimentos
Estão demonstrados ao custo de aquisição, ajustados por provisão para perdas quando aplicável.

i) Imobilizado de uso
Corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade. Está demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação do imobilizado de uso é computada pelo método linear, com base nas taxas anuais mencionadas na Nota âImobilizado de Uso e Intangívelõ, que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens.

j) Intangível
Corresponde a direitos adquiridos que têm por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção do Sistema ou exercidos com essa finalidade. Está demonstrado aos valores de custo e contempla gastos na aquisição e desenvolvimento de logiciais, ajustado por amortizações acumuladas, calculadas a partir do momento em que começam a serem usufruídos os benefícios respectivos, com base em taxas anuais que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens, conforme mencionado na Nota âImobilizado de Uso e Intangívelõ.

k) Redução ao valor recuperável de ativos
Os ativos são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo.

l) Depósitos a prozo
Estão demonstrados pelo seu valor de resgate, líquidos das despesas financeiras a decorrer.

m) Demais possivos circulantes e exigíveis a longo prazo (não circulantes)
Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos e as variações monetárias em base pro-rata dia incorridos, deduzidos das correspondentes despesas a apropriar.

n) Impostos e contribuições
As provisões para Imposto de Renda, Contribuição Social, Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS foram calculadas às alíquotas vigentes, considerando, para as respectivas bases de cálculo, a legislação pertinente a cada tributo.
As cooperativas estão sujeitas à tributação pelo Imposto de Renda e Contribuição Social quando auferirem resultados positivos em atos não cooperativos. Nesses casos, a provisão é constituída com base nas alíquotas vigentes, considerando as adições e exclusões e a compensação de prejuízos fiscais e de base negativa de CSLL, limitados a 30% do lucro tributável.

o) Ativos e Passivos contingentes
As práticas contábeis para registro, mensuração e divulgação de ativos e passivos contingentes estão consubstanciadas na Resolução nº 3.535/08 do CMN, a saber:
· Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota explicativa;
· Passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são divulgados, e aqueles classificados como de perdas remotas não são provisionados e/ou divulgados;
· As obrigações legais são registradas como exigíveis, independentemente da avaliação sobre as probabilidades de êxito.

p) Estimativos contábeis
As estimativas contábeis são determinadas pela Administração, considerando fatores e premissas estabelecidos com base em julgamento, que são revisados a cada semestre. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem as provisões para ajuste dos ativos ao valor provável de realização ou recuperação, as provisões para perdas, as provisões para contingências, marcação a mercado de instrumentos financeiros, entre outros. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Na elaboração dos Fluxos de Caixa, foram considerados como caixa e equivalentes de caixa os seguintes montantes:

	2018	2017
Disponibilidades	13.251	11.251
Relações interfinanceiras - Centralização financeira em Cooperativa Central	282.149	194.725
Total	295.372	206.976

A Centralização financeira é composta pela transferência das sobras de caixa das Cooperativas filiadas, sem prazo de resgate, e remunerados de acordo com as taxas praticadas no mercado, que na média de 2018 equivale a 99% do CDi.

NOTA 05 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO
A carteira de créditos está assim composta e classificada:
a) Composição da carteira de créditos por tipo de aperação

Operações de crédito	2018			2017
	Circulante	Não Circulante	Total	Total
Empréstimos e títulos descontados	184.383	109.797	294.180	231.280
Financiamentos	61.473	60.862	122.335	60.836
Financiamentos rurais e agroindustriais	176.948	2.662	179.610	153.715
Carteira Livre	250.472	157.527	407.999	349.083

Estão inclusos na base de cálculo da provisão para operações de crédito valores relativos a outros créditos, assim compostos:

Outros créditos	2018			2017
	Circulante	Não Circulante	Total	Total
Avais e Fianças Honrados	1.287	7	1.294	256
Valores por compra de valores e bens	12	-	12	17
Títulos e créditos a receber (i)	16.993	5	16.998	14.212
Total	18.292	12	18.304	12.485

(i) A rubrica refere-se a valores a receber de transações de cartões de crédito.

b) Composição da corteira de créditos por níveis de risco

Níveis de Risco	%	Carteira		Provisão para Operações de Crédito	
		2018	2017	2018	2017
Nível A	0,50	165.590	201.373	828	1.006
Nível B	1,00	232.098	151.730	2.320	1.517
Nível C	3,00	84.930	50.040	2.550	1.501
Nível D	10,00	13.806	15.120	1.939	1.512
Nível E	30,00	6.760	7.790	2.028	2.287
Nível F	50,00	5.222	5.437	2.611	2.719
Nível G	70,00	1.455	2.004	1.018	1.045
Nível H	100,00	19.009	19.756	19.009	19.798
Total		529.341	459.710	29.294	31.783

NOTA 06 – OUTROS CRÉDITOS – DIVERSOS
Os créditos diversos, classificados no grupo de outros créditos do ativo, estão assim compostos:

	2018	2017
Adiantamentos e antecipações salariais	921	809
Adiantamentos para pagamentos de nossa conta (i)	1.317	3.907
Devedores por compra de valores e bens	72	-
Devedores por depósitos em garantia	491	515
Impostos e contribuições a compensar	1.389	579
Títulos e créditos a receber	16.985	12.330
Valores Honrados	-	522
Caixa de correspondente	198	75
Operações com cartões	98	61
Pendências a regularizar	197	92
Outros	387	336
Total Circulante	21.985	19.280
Títulos e créditos a receber	5	7
Total realizável a longo prazo	5	7

(i) Refere-se à antecipação de valores para a Confederação Sicredi, a qual está elaborando investimentos em estruturas e plataformas de tecnologia, através de aquisição de bens (móveis, equipamentos, softwares, instalações, etc.) e de gastos com projetos específicos (aplicativos, produtos, etc.). Após sua conclusão os mesmos serão repassados para as Cooperativas.

NOTA 07 – OUTROS VALORES E BENS

	2018	2017
Bens não de uso próprio	1.553	1.332
Imóveis	1.459	1.183
Veículos e afins	94	210
Máquinas e equipamentos	7	-
Bens em regime especial	-	19
Material em estoque	166	46
Despesas antecipadas	449	386
Provisão (Redução do valor recuperável - Bens não de uso)	(19)	(2)
Total Circulante	2.149	1.962

Conforme determinações previstas no CPC 01, foi constituída provisão no montante de R$ 19 (2017 - R$ 2) de forma a assegurar que os ativos não estejam registrados por um valor superior àquele passível de ser recuperado por uso ou por venda.

NOTA 08 – INVESTIMENTOS

Registrados ao custo de aquisição	2018	2017
Cooperativa Central Sicredi PR/SP/RJ	14.368	12.833
Sicredi Participações S.A.	12.339	12.340
Outras Participações e Investimentos	3	3
Sicredi Fundos Garantidores	2	2
Outras Ações e Cotas	1	1
Total	26.658	25.180

NOTA 09 – IMOBILIZADO DE USO E INTANGÍVEL

	Taxas anuais de depreciação %	2018			2017
		Custo corrigido	Depreciação/ Amortização acumulada	Líquido	Líquido
Imobilizado de Uso	-	29.438	(10.345)	19.093	20.525
Instalações em Geral	10%	6.216	-	6.216	5.971
Terrenos	-	130	-	130	130
Edificações	4%	352	(139)	213	445
Instalações	10%	6.097	(2.697)	3.400	2.351
Móveis e equipamentos de uso	10%	8.787	(3.218)	5.568	4.958
Sistema de comunicação	10%	356	(126)	230	154
Sistema de processamento de dados	20%	6.441	(3.451)	2.990	1.967
Sistema de segurança	10%	428	(238)	190	154
Sistema de transporte	20%	720	(486)	234	417
Intangível		15.241	(6.940)	8.301	6.760
Investimentos Controladas		13.591	(6.940)	6.651	6.356
Total		44.869	(17.285)	27.584	26.885

(i) Valores reclassificados de âAdiantamentos para pagamentos de nossa contaõ para âOutros Ativos Intangíveisõ, no sub grupo Intangível, referente aos investimentos em tecnologia para desenvolvimento de softwares que já estão em uso pela Cooperativa, bem como investimentos para aquisições de imobilizado na Confederação, sendo amortizado com base nos benefícios econômicos futuros incorporados aos ativos quando consumidos pela entidade, por meio do seu uso.

NOTA 10 – OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS
As obrigações por repasses interfinanceiros operam com uma taxa até 8,5% a.a. com vencimentos até 21/06/2023, e os recursos são repassados pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A.

NOTA 11 – OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS
Os empréstimos são apresentados a seguir:

	2018	2017
Empréstimos no país - outras instituições	10.055	8.596
Cooperativa Central Sicredi PR/SP/RJ	10.055	8.596
Total circulante	10.055	8.596

NOTA 12 – OUTRAS OBRIGAÇÕES – DIVERSAS
As obrigações diversas, classificadas no passivo no grupo de outras obrigações estão assim compostas:

	2018	2017
Cheques administrativos	-	6
Obrigações por convênios oficiais	12	23
Provisão para pagamentos a efetuar	7.933	6.149
Provisão para passivos contingentes (Nota 15)	762	615
Provisão para garantias financeiras prestadas (i)	5.936	4.731
Rendas a regularizar	18	62
Operações com cartões	19.841	11.772
Demais Conveniadas	1.109	781
Credores diversos	1.303	1.101
Total circulante	31.829	25.569

(i) Refere-se a coobrigações assumidas pelas Cooperativas na realização de operações de seus cooperados junto ao Banco.

NOTA 13 – PASSIVOS CONTINGENTES
A Cooperativa possui passivos contingentes em andamento, sendo que os valores estimados e suas respectivas movimentações e provisões estão demonstrados no quadro a seguir, conforme a natureza dos passivos.

Natureza	Saldo Inicial de	Aumento Provisão	Baixa/Reversão de Provisão	Saldo Final do Período 30/06/2018
Trabalhista	424	111	(110)	425
Cível	333	105	(101)	337
Total	757	216	(211)	762

Em 30 de junho de 2018, a Cooperativa possuía também processos de natureza Trabalhista e Cível, cuja probabilidade de perda é possível no montante estimado de R$ 3.193 e R$ 855 (2017 - R$ 314 - Cível), respectivamente.

NOTA 14 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capitol Social
O capital social é dividido em quotas-partes de valor unitário equivalente a R$ 1,00 (um real), sendo que cada associado tem direito a um voto, independente do número de suas quotas-partes, e está assim composto:

	2018	2017
Capital Social	71.699	65.900
Total de associados	61.729	57.129

Em 30 de junho de 2018, a cooperativa aumentou seu capital social no montante de R$ 789 (2017 é R$ 4.130), sendo R$ 4.320 (2017 é R$ 4.761) via integralização de resultados e R$ 773 (2017 é R$ 1.056), via integralização de quotas-partes. No mesmo período houve baixas de capital, através do resgate de quotas-partes, no montante de R$ 4.304 (2017 é R$ 1.687).

NOTA 15 – OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS

	2018	2017
Recuperação de encargos e despesas	1.139	574
Ingressos depósitos intercooperativos (i)	8.597	15.440
Reversão de provisões operacionais	2.779	889
Outras rendas operacionais	814	898
Total	13.329	17.801

(i) Refere-se à receita com administração financeira, que é resultante da aplicação dos recursos captados, junto à Cooperativa Central.

NOTA 16 – OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS

	2018	2017
Descontos concedidos em renegociação e crédito	782	749
Contribuição O.C.E.	98	96
Contribuição Sicredi Fundos Garantidores	536	533
Contribuição Confederação Sicredi	4.396	3.387
Cooperativa Central Sicredi PR/SP/RJ	639	502
Encargos de administração financeira	57	74
Repasse administradora de Cartões	343	388
Depreciação e amortização (Rateio Confederação)	809	806
Outras provisões operacionais	2.031	1.809
Outras despesas operacionais	1.854	915
Total	11.446	9.311

NOTA 17 – COOBRIGAÇÕES EM GARANTIAS PRESTADAS
As garantias prestadas pela Cooperativa sob a forma de aval, fiança ou outras coobrigações estão assim compostas:

	2018	2017
Beneficiários de garantias prestadas (i)	286.162	193.510
Total	286.162	193.510

(i) Nas garantias prestadas estão incluSas as operações com recursos recebidos de instituições financeiras e repassados aos associados via Banco Cooperativo Sicredi S.A., em que a Cooperativa é intermediária e garantidora solidária por força de contrato firmado entre as partes. Os valores são compostos, em sua maioria, pelos programas do Finame e BNDES.

NOTA 18 – GERENCIAMENTO DE RISCOS
O Sistema Sicredi considera o gerenciamento de riscos prioritário na condução de suas atividades e negócios, adotando práticas em absoluta consonância com os preceitos dos Acordos de Basileia. Dessa maneira, possui áreas especializadas para o gerenciamento destes riscos, centralizadas no Banco Cooperativo Sicredi S.A. Entre os principais riscos gerenciados pela instituição, destacam-se o operacional, o de mercado, o de liquidez, o de alocação de capital e o de crédito. A descrição da estrutura completa e do processo de gerenciamento de riscos pode ser acessada por meio do sitio www.sicredi.com.br, no caminho âConheça o Sicredi \ Relatório \ Gestão de Riscosõ.

Adriana Conceição Borros Mees
Diretora Executiva
CPF: 609.782.289-87

José Carlos Steffen
Diretor de Negócios
CPF: 333.052.269-00

Fabio Junior Camera
Contador
CRC: PR-0052707/0-2
CPF: 025.334.169-83

Sicredi

FIM

Município de Capanema - PR

PORTARIA Nº 2.168, DE 08 DE AGOSTO DE 2018.

Redistribuição de Servidor Público Efetivo.

Considerando a necessidade de readequação de pessoal para atender demanda permanente de serviço na Secretaria Municipal de Educação, o Secretário Municipal de Administração de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e delegadas, nos termos do art. 2º, do Decreto nº 6.386, de 21 de fevereiro de 2017;

R E S O L V E:

Art. 1º Redistribuir o servidor Clemente Alberto de Wollau, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais I, matrícula nº 2.180-1, previsto na Lei Municipal nº 1.280/2010 e alterações posteriores, para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte para desempenho de suas atribuições.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de publicação.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração de Capanema, Estado do Paraná, aos 08 dias do mês de agosto de 2018.

Valdeci Alves dos Santos
Secretário de Administração

Conselho Municipal da Assistência Social

RESOLUÇÃO Nº 07/2018

SÚMULA: Aprovação do Plano Municipal de Assistência Social 2019 a 2021.

RESOLVE:

ARTIGO 1º Aprovar o Plano Municipal de Assistência Social 2019 a 2021 do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS, no uso de suas atribuições conforme Lei Municipal nº 1471/2013.

ARTIGO 2º Esta resolução entra em vigor a partir de data desta publicação.

Capanema 09 de agosto de 2018

Maria Olivia de Rosa
Presidente do CMAS

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº12/2018

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:
Modalidade: Tomada de Preços nº 12/2018
Tipo de Julgamento: Menor preço por item.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAÍDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856665/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO
Valor da Licitação: R$ 387.001,82 Trezentos e Oitenta e Sete Mil e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos).
Abertura das propostas:09:00 horas do dia 31/08/2018
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br.

Capanema-PR. 02/08/2018.
Américo Bellé- Prefeito Municipal

NOTIFICAÇÃO

Ao
Engenheiro Civil
Sr. Rubens Luis Rolando Souza

Com relação a Tomada de Preços nº 12/2018, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. Notifico o Engenheiro Civil Sr. Rubens Luis Rolando Souza da data da Visita Técnica que acontecerá no dia 27/08/2018, as 9 horas.

Capanema, 03 de agosto de 2018

Roselia Kriger Becker Pagani
Presidente da Comissão Pernamente de
Abertura e Julgamento de Licitações

03/08/18

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 19634
CREA-RS 158.280/D

153

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE DESPESAS

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 03/08/2018 **Edital n°: 12** **Tipo TOMADA DE PREÇOS**

FORNECEDOR :

TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME
29.193.121/0001-89
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 SALA - CEP: 85710000 - BAIRRO: CENTRO
CIDADE/UF: Santo Antônio do Sudoeste/PR

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (TOMADA DE PREÇOS N° **12**), devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93,** alterada pela Lei **8.883/94, e concordo com as condições do Edital.**

Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

Fl. 154

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE DESPESAS

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 06/08/2018 **Edital n°: 12** **Tipo TOMADA DE PREÇOS**

FORNECEDOR :

ELIZANDRO FOPPA - ME
07.200.203/0001-70
R PROJETADA A , 550 LOTE 01 QUADRA 129 - CEP: 85730000 - BAIRRO: INDUSTRIAL II
CIDADE/UF: Pranchita/PR

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (TOMADA DE PREÇOS N° **12**), devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93,** alterada pela Lei **8.883/94, e concordo com as condições do Edital.**

_____
Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br

De: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Enviado em: segunda-feira, 6 de agosto de 2018 16:59
Para: 'ALIANZA ENGENHARIA'
Assunto: RES: CADASTRO
Anexos: PROTOCOLO Elizandro Foppa.pdf; EDITAL TP 012-2018.pdf; bdi.pdf; composição custo.pdf; cronograma.pdf; eventograma PLE.pdf; memoria de cálculo.pdf; memorial descritivo.pdf; orçamento.pdf; QCI.pdf

Boa tarde, segue em anexos os arquivos referentes a Tomadas de preço 12/2018.
Por gentileza confirme o recebimento.

De: ALIANZA ENGENHARIA <alianzaeng@gmail.com>
Enviada em: segunda-feira, 6 de agosto de 2018 16:31
ara: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Re: CADASTRO

REFERENTE AO EDITAL DE LICITAÇÃO N° 12/2018
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

atenciosamente,

Jéssica Bonatto de Faveri

Alianza Engenharia e Artefatos
Rua Projetada A, 550, Bairro Industrial II
CEP: 85.730-000
Pranchita - Paraná
Fone: (46) 99904-5476 - (46) 99941-2139

<apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br> escreveu no dia segunda, 6/08/2018 à(s) 15:57:

Boa tarde, referente a qual Licitação você precisa dos arquivos?

Aguardo retorno.

Jeandra Wilmsen

Setor de Licitação

Município de Capanema - PR
Setor de Licitações

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE DESPESAS

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 06/08/2018 **Edital n°: 12** **Tipo TOMADA DE PREÇOS**

FORNECEDOR :

ELIZANDRO FOPPA - ME
07.200.203/0001-70
R PROJETADA A , 550 LOTE 01 QUADRA 129 - CEP: 85730000 - BAIRRO: INDUSTRIAL II
CIDADE/UF: Pranchita/PR

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (TOMADA DE PREÇOS **N° 12**), devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93,** alterada pela Lei **8.883/94, e concordo com as condições do Edital.**

ALIANZA ENGENHARIA E ARTEFATOS CNPJ: 07.200.203/0001-70

Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

ALIANZA ENGENHARIA E ARTEFATOS CNPJ: 07.200.203/0001-70

Município de Capanema - PR
Setor de Licitações

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE DESPESAS

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 08/08/2018 **Edital nº: 12** **Tipo TOMADA DE PREÇOS**

FORNECEDOR :

A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME
84.840.503/0001-65
AVENIDA BRASIL, 306 SALA 2 CXPST 21 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: Capanema/PR

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (TOMADA DE PREÇOS **Nº 12**), devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93,** alterada pela Lei **8.883/94, e concordo com as condições do Edital.**

Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

158

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Voltar

Registrar processo licitatório

Informações Gerais

Município: CAPANEMA

Entidade Executora: MUNICÍPIO DE CAPANEMA

Os campos Ano,Nº e Modalidade devem ser iguais aos informados (à informar) no SIM-AM

Ano*: 2018

Modalidade*: Tomada de Preços

Nº licitação/dispensa/inexigibilidade*: 12

Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de crédito

A licitação utiliza estes recursos? ☐

Número edital/processo*: 12

Descrição do Objeto*: PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO

Forma de Avalição: Menor Preço

Dotação Orçamentária*: 08002154511501115113504490 51

Preço máximo/Referência de preço - R$*: 387.001,82

Data de Lançamento do Edital: 10/08/2018

Data da Abertura das Propostas: 31/08/2018

Confirmar

CPF: 63225824968 (Logout)

Município de Capanema - PR
Setor de Licitações

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE DESPESAS

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 15/08/2018 **Edital n°: 12** **Tipo TOMADA DE PREÇOS**

FORNECEDOR :

VANDERLEI BAMPI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL
28.157.296/0001-78
RUA MAUA, 2555 - CEP: 85770000 - BAIRRO: CENTRO
CIDADE/UF: Realeza/PR

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (TOMADA DE PREÇOS **N° 12**), devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93,** alterada pela Lei **8.883/94, e concordo com as condições do Edital.**

_____
Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br

De:	apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em:	quarta-feira, 15 de agosto de 2018 15:15
Para:	'engenhariabampi@hotmail.com'
Assunto:	EDITAL E ARQUIVOS REFERENTES A TOMADA DE PREÇOS 012-2018
Anexos:	PROTOCOLO BAMPI.pdf; EDITAL TP 012-2018.pdf; eventograma PLE.pdf; memoria de cálculo.pdf; memorial descritivo.pdf; orçamento.pdf; QCI.pdf; bdi.pdf; composição custo.pdf; cronograma.pdf

BOA TARDE PREZADO VANDERLEI!
SEGUE EM ANEXO O EDITAL E PASTA TÉCNICA REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS 012-2018!
PEÇO QUE NOS DEVOLVA O PROTOCOLO DE ENTREGA ASSINADO POR EMAIL O MAIS BREVE POSSÍVEL!
POR GENTILEZA CONFIRME O RECEBIMENTO!

AICON
SETOR DE LICITAÇÕES – (46) 3552-1321
MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br

161

De: postmaster@outlook.com
Enviado em: quarta-feira, 15 de agosto de 2018 15:18
Para: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto: Entregue: EDITAL E ARQUIVOS REFERENTES A TOMADA DE PREÇOS 012-2018
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00126.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

engenhariabampi@hotmail.com

Assunto: EDITAL E ARQUIVOS REFERENTES A TOMADA DE PREÇOS 012-2018

0162

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE DESPESAS

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 28/08/2018 **Edital n°: 012** **Tipo Tomada de preços**

FORNECEDOR :

M. BIGATON & CIA LTDA - ME
07.517.372/0001-39
R AIMORÉS, 1887 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: Capanema/PR

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços N° **012**), devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93,** alterada pela Lei **8.883/94, e concordo com as condições do Edital.**

Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

TOMADA DE PREÇOS 12/2018
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL

O Prefeito Municipal Américo Bellé, torna pública, a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a retificação do Edital do Tomada de Preços nº 12/2018, com alterações descritas a seguir.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO

No item 2.1. DO EDITAL

ONDE LIA-SE

2.1. A presente licitação tem por objeto a execução, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da seguinte obra:

Local: NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO
Área da Pavimentação Poliédrica: 5.078,48m²
Prazo de Execução: 6 (Três) meses
Prazo de Vigência: 12 (Seis) meses
Capital social Mínimo: 38.700,18 (Trinta e oito mil, setecentos reais e dezoito centavos)
Preço Máximo Global: R$ R$ 387.001,82(Trezentos e oitenta e sete mil, um real e oitenta e dois centavos)

LEIA-SE:

1.1. A presente licitação tem por objeto a execução, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da seguinte obra:

Local: NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO
Área da Pavimentação Poliédrica: 5.078,48m²
Prazo de Execução: 6 (seis) meses
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses
Capital social Mínimo: 38.700,18 (Trinta e oito mil, setecentos reais e dezoito centavos)
Preço Máximo Global: R$ R$ 387.001,82(Trezentos e oitenta e sete mil, um real e oitenta e dois centavos)

Os demais itens permanecem inalterados.

Capanema, 30 de agosto de 2018

Américo Bellé- Prefeito Municipal

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

164

De:	roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em:	quinta-feira, 30 de agosto de 2018 11:23
Para:	'engenhariatonelli@gmail.com'; 'alianzaeng@gmail.com'; 'colussitictac@gmail.com'; 'engenhariabampi@hotmail.com'; 'escsaggin17 @hotmail.com'; 'esc.saggin40@hotmail.com'
Assunto:	EM ANEXO ERRATA DA TOMADA DE PREÇOS 12-2018- MUNICÍPI DE CAPANEMA
Anexos:	ERRATA 01.pdf

BOM DIA
SEGUE EM ANEXO PARA VOSSO CONHECIMENTO CÓPIA DA ERRADA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2018- MUNICÍPIO DE CAPANEMA.
ATENCIOSAMENTE,

›selia Kriger Becker Pagani
Pregoeira/ Presidente da Comissão Permanete
de Abertura e Julgamento de Licitações
Município de Capanema-PR
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080
Capanema – PR cep 85760-000
fone 46 3552 1321

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

De:	postmaster@outlook.com
Enviado em:	quinta-feira, 30 de agosto de 2018 11:23
Para:	roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto:	Entregue: EM ANEXO ERRATA DA TOMADA DE PREÇOS 12-2018- MUNICÍPI DE CAPANEMA
Anexos:	details.txt; Anexo sem título 00065.txt

000165

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

engenhariabampi@hotmail.com

Assunto: EM ANEXO ERRATA DA TOMADA DE PREÇOS 12-2018- MUNICÍPI DE CAPANEMA

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

166

De:	postmaster@outlook.com
Enviado em:	quinta-feira, 30 de agosto de 2018 11:23
Para:	roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto:	Entregue: EM ANEXO ERRATA DA TOMADA DE PREÇOS 12-2018- MUNICÍPI DE CAPANEMA
Anexos:	details.txt; Anexo sem título 00071.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

escsaggin17@hotmail.com

Assunto: EM ANEXO ERRATA DA TOMADA DE PREÇOS 12-2018- MUNICÍPI DE CAPANEMA

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: quinta-feira, 30 de agosto de 2018 11:23
Para: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00077.txt

167

The original message was received at Thu, 30 Aug 2018 11:22:39 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <alianzaeng@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer) <colussitictac@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer) <engenhariatonelli@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <engenhariatonelli@gmail.com>... relayed; expect no further notifications <colussitictac@gmail.com>... relayed; expect no further notifications <alianzaeng@gmail.com>... relayed; expect no further notifications ... while talking to hotmail-com.olc.protection.outlook.com.:
>>> DATA
<<< 452 4.5.3 Recipients belong to multiple regions ATTR38 [CY1NAM02FT062.eop-nam02.prod.protection.outlook.com]
<esc.saggin40@hotmail.com>... Deferred: 452 4.5.3 Recipients belong to multiple regions ATTR38 [CY1NAM02FT062.eop-nam02.prod.protection.outlook.com]

168

EXPEDIENTE

ORGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA
AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005,
LEI MUNICIPAL Nº 1.648/2018

COORDENAÇÃO/DIREÇÃO: Valdeci Alves dos Santos - Secretaria de Administração

DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO: Anderson Ferreira dos Passos
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Anderson Ferreira dos Passos
DRT Nº 9975/PR

APOIO TÉCNICO: Pedro Augusto Santana

PREFEITURA DE CAPANEMA
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000
Fone: 46 3552-1321
E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br / adm@capanema.pr.gov.br
Capanema - Paraná
Prefeito Municipal: Américo Bellé
Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer
Secretário de Administração: Valdeci Alves dos Santos
Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski
Secretária de Educação, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz
Secretária da Família e Desenvolvimento Social: Sandra Pagno
Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti
Secretário de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso
Secretário de Saúde: Jonas Welter
Secretário de Viação, Obras e Urbanismo: Clésio Novick
Chefe de Gabinete: Paulo de Souza

Controladora Geral do Município: Arieli Caciara Wons

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA
R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000
Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329
Fax: (46) 3552-3217
E-mail: capanemacamara@gmail.com
Capanema - Paraná
Vereador: Airton Marcelo Barth - Presidente
Vereador: Valdomiro Brizola - Vice-Presidente
Vereadora: Izolete Ap. Walker - 1ª Secretária
Vereador: Edson Wilmsen - 2º Secretário
Vereador: Delmar C. Balzan
Vereador: Ginésio J. Pinheiro
Vereador: Gilmar Pontin
Vereador: Paulo C. Lothermann
Vereador: Sergio Ullrich

ATOS LICITATÓRIOS

TOMADA DE PREÇOS 12/2018
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL

O Prefeito Municipal Américo Bellé, torna pública, a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a retificação do Edital do Tomada de Preços nº 12/2018, com alterações descritas a seguir.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO

No item 2.1. DO EDITAL
ONDE LIA-SE
2.1.A presente licitação tem por objeto a execução, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da seguinte obra:

Local: NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO
Área da Pavimentação Poliédrica: 5.078,48m²
Prazo de Execução: 6 (Três) meses
Prazo de Vigência: 12 (Seis) meses
Capital social Mínimo: 38.700,18 (Trinta e oito mil, setecentos reais e dezoito centavos)
Preço Máximo Global: R$ R$ 387.001,82(Trezentos e oitenta e sete mil, um real e oitenta e dois centavos)

LEIA-SE:
1.1.A presente licitação tem por objeto a execução, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da seguinte obra:

Local: NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO
Área da Pavimentação Poliédrica: 5.078,48m²
Prazo de Execução: 6 (seis) meses
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses
Capital social Mínimo: 38.700,18 (Trinta e oito mil, setecentos reais e dezoito centavos)
Preço Máximo Global: R$ R$ 387.001,82(Trezentos e oitenta e sete mil, um real e oitenta e dois centavos)

Os demais itens permanecem inalterados.

Capanema, 30 de agosto de 2018

Américo Bellé
Prefeito Municipal

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 33/2018

Ratifico em todos os seus termos e reconheço a Dispensa de Licitação para o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA CRIAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER DEMANA DE CADASTRO PARA VAGAS EM CMEIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA,

169

CREDENCIAMENTO

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
M. BIGATON & CIA LTDA - ME
CNPJ nº 07.517.372/0001-39
NIRE 41205523467 EM 25/07/2005

Folha 01

Os signatários deste instrumento:

1. MAURY BIGATON, brasileiro, casado, pelo Regime de Comunhão Universal de Bens, empresário, inscrito no CPF nº 368.902.789-68, portador do Documento de Identidade RG nº 1.496.984 - SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 860, Centro, CEP 85760-000;

2. MARCOS CESAR BIGATON, brasileiro, natural de Capanema, Paraná, solteiro, nascido em 09/08/1978, empresário, inscrito no CPF nº 027.409.389-85, portador do Documento de Identidade RG nº 7.077.215-9 - SSP/PR, residente e domiciliado à Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 860, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de M. BIGATON & CIA LTDA - ME, com sede na Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 860, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41205523467 em 25/07/2005 e posterior alteração sob nº 20100090460 em 14/01/2010, resolvem alterar o contrato social e posterior alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a Clausula Primeira da Segunda Alteração do Contrato Social Consolidado, onde mencionava: A sociedade gira sob o nome empresarial de M. BIGATON & CIA LTDA – ME e tem sede e domicílio na Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 860, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85.760-000, passando a ser: A sociedade gira sob o nome empresarial de M. BIGATON & CIA LTDA – ME e tem sede e domicílio na Rua Aimores, nº 1887, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000.

CLAUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Cláusula Segunda da Segunda Alteração do Contrato Social Consolidado, onde mencionava o valor e a distribuição do Capital: O valor do Capital que era R$ 70.000,00 (setenta mil reais) já integralizados é elevado para R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo o aumento é integralizado, neste ato, com utilização de Reserva de Lucros contabilizados na empresa, ficando assim,

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2018 10:33 SOB Nº 20180052055.
PROTOCOLO: 180052055 DE 16/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800357391. NIRE: 41205523467.
M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 01/02/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
M. BIGATON & CIA LTDA - ME
CNPJ nº 07.517.372/0001-39
NIRE 41205523467 EM 25/07/2005

distribuído entre os sócios da seguinte forma: R$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais) ao Sócio MAURY BIGATON e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao Sócio MARCOS CESAR BIGATON.

CLAUSULA TERCEIRA: O sócio MAURY BIGATON, que possui na sociedade 396,000 (trezentas e noventa e seis mil) quotas, de R$ 1,00 (um real), cada uma, totalizando R$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais), vende e transfere neste ato em moeda corrente do pais a quantia de 96,000 (noventa e seis mil) quotas já integralizadas, de R$ 1,00 (um) real, cada uma totalizando R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) ao sócio MARCOS CESAR BIGATON, que já integra a sociedade, dando plena, geral e rasa quitação da venda de quotas ora efetuadas, declarando este conhecer a situação econômico-financeira da sociedade, ficando desta forma sub-rogado nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento, ficando assim, distribuído entre os sócios da seguinte forma: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ao Sócio MAURY BIGATON e R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao Sócio MARCOS CESAR BIGATON.

Parágrafo Primeiro: Em virtude das modificações da Cláusula Segunda da Segunda Alteração do Contrato Social Consolidado, a Cláusula de Capital Social passa a ter a seguinte redação: O capital será de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas na empresa, pelos sócios:

SÓCIOS	PART.%	QUOTAS	VALORES EM R$
MAURY BIGATON	75%	300.000	300.000,00
MARCOS CESAR BIGATON	25%	100.000	100.000,00
TOTAL	100%	400.000	400.000,00

CLAUSULA QUARTA: Fica alterada a Clausula Terceira da Segunda alteração do Contrato Social Consolidado onde mencionava: O objeto social é CNAE (43.13/4-00) Terraplenagem, CNAE (42.13/8-00) Construção de Calçamento com Pedras Irregulares e Pavimentação, passando a ser: CNAE (43.13/4-00) Obras de Terraplenagem, CNAE (42.13/8-00) Construção de Calçamento com Pedras Irregulares e Pavimentação, CNAE (49.30/2-02) Transporte Maquinas Via Rodoviarias e CNAE (77.32/2-01) Locação de Veiculos e Maquinas.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2018 10:33 SOB Nº 20180052055
PROTOCOLO: 180052055 DE 16/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800357391. NIRE: 41205523467.
M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 01/02/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

172

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
M. BIGATON & CIA LTDA - ME
CNPJ nº 07.517.372/0001-39
NIRE 41205523467 EM 25/07/2005

CLÁUSULA QUINTA: Fica alterada a Clausula Sétima da Segunda Alteração do Contrato Social Consolidado onde mencionava: A administração da sociedade cabe ao sócio MAURY BIGATON, com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.
Parágrafo Único - Fica facultado ao administrador nomear procurador, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelo procurador assim nomeado, passando a ser: A administração da sociedade caberá ao sócio MARCOS CESAR BIGATON com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, individualmente, sem autorização e consentimento do outro sócio, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.
CLAUSULA SEXTA: O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.
CLÁUSULA SETIMA: Fica inclusa a Clausula: Os sócios terão participação nos lucros e nas perdas na proporção das quotas que possuírem na sociedade, sendo permitida a distribuição desproporcional dos lucros, sempre que assim deliberarem a totalidade dos quotistas em reunião especialmente para este fim.
CLÁUSULA OITAVA: Da Consolidação do Contrato - À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei nº 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2018 10:33 SOB Nº 20180052055.
PROTOCOLO: 180052055 DE 16/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800357391. NIRE: 41205523467.
M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 01/02/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
M. BIGATON & CIA LTDA - ME
CNPJ nº 07.517.372/0001-39
NIRE 41205523467 EM 25/07/2005

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
M. BIGATON & CIA LTDA – ME
CNPJ nº 07.517.372/0001-39
NIRE 41205523467 EM 25/07/2005

1- MAURY BIGATON, brasileiro, casado, pelo Regime de Comunhão Universal de Bens, empresário, inscrito no CPF nº 368.902.789-68, portador do Documento de Identidade RG nº 1.496.984 - SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 860, Centro, CEP 85760-000;

1. MARCOS CESAR BIGATON, brasileiro, natural de Capanema, Paraná, solteiro, nascido em 09/08/1978, empresário, inscrito no CPF nº 027.409.389-85, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.077.215-9 – SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 860, Centro, CEP 85760-000, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de M. BIGATON & CIA LTDA - ME, com sede na Rua Aimores, nº 1887, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41205523467 em 25/07/2005 e posterior alteração sob nº 20100090460 em 14/01/2010, resolvem consolidar o contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de M. BIGATON & CIA LTDA – ME e tem sede e domicílio na Rua Aimores, nº 1887, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real), integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS	PART.%	QUOTAS	VALORES EM R$
MAURY BIGATON	75%	300,000	300.000,00
MARCOS CESAR BIGATON	25%	100,000	100.000,00
TOTAL	100%	400,00	400.000,00

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2018 10:33 SOB Nº 20180052055.
PROTOCOLO: 180052055 DE 16/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800357391. NIRE: 41205523467.
M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 01/02/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
M. BIGATON & CIA LTDA - ME
CNPJ nº 07.517.372/0001-39
NIRE 41205523467 EM 25/07/2005

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto CNAE (43.13/4-00) Obras de Terraplenagem, CNAE(42.13/8-00) Construção de Calçamento com Pedras Irregulares e Pavimentação, CNAE (49.30/2-02) Transporte Maquinas Via Rodoviarias e CNAE (77.32/2-01) Locação de Veiculos e Maquinas.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Agosto de 2005 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá ao sócio MARCOS CESAR BIGATON com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, individualmente, sem autorização e consentimento do outro sócio, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

Parágrafo Único - Fica facultado ao administrador nomear procurador, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelo procurador assim nomeado.

CLAUSULA OITAVA: Os sócios terão participação nos lucros e nas perdas na proporção das quotas que possuírem na sociedade, sendo permitida a distribuição desproporcional dos lucros, sempre que assim deliberarem a totalidade dos quotistas em reunião especialmente para este fim.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro o administrador prestará contas justificadas de sua administração procedendo à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DECIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2018 10:33 SOB Nº 20180052055.
PROTOCOLO: 180052055 DE 16/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800357391. NIRE: 41205523467.
M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 01/02/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
M. BIGATON & CIA LTDA - ME
CNPJ nº 07.517.372/0001-39
NIRE 41205523467 EM 25/07/2005

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As deliberações relativas a todos os assuntos relevantes para a sociedade serão definidas na reunião de sócios.

Parágrafo Único - Quando as deliberações dos sócios forem formalizadas em alteração contratual, quando tomadas por todos os sócios e por esses assinadas, fica dispensada neste caso, a reunião de sócios conforme artigo 1.072 do Novo Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do outro sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar ao remanescente, por escrito, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo a este o direito de preferência na aquisição das mesmas.

Parágrafo Único - Se o sócio remanescente não usar do direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir as suas quotas a terceiro.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na Lei nº 10.406, de 10 de

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2018 10:33 SOB Nº 20180052055.
PROTOCOLO: 180052055 DE 16/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800357391. NIRE: 41205523467.
M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 01/02/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
M. BIGATON & CIA LTDA - ME
CNPJ nº 07.517.372/0001-39
NIRE 41205523467 EM 25/07/2005

Janeiro de 2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis. Ainda permanecendo dúvidas reger-se-á pelas normas da sociedade anônima.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Fica eleito o foro da cidade de Capanema, Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em via única.

Capanema - PR, 04 de Janeiro de 2018.

Maury Bigaton

Tab. Notas Capanema - PR

Marcos Cesar Bigaton

Tab. Notas Capanema - PR

TABELIONATO DE NOTAS - CAPANEMA - PR (46)3552.3710
Selo Digital: 5ANLr bmUDY Z6RVV4 Controle: 7Daeh 3KDe4
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por VERDADEIRA as assinaturas indicadas de MAURY BIGATON e MARCOS CESAR BIGATON. Dou fé.
Capanema-PR, 12 de janeiro de 2018.
Em Test° da Verdade
Daniela Ribeiro do Carmo - Escrevente

TABELIONATO DE NOTAS DE CAPANEMA • 85760-000 - CAPANEMA - PR •

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2018 10:33 SOB Nº 20180052055.
PROTOCOLO: 180052055 DE 16/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800357391. NIRE: 41205523467.
M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 01/02/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

177

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.517.372/0001-39 MATRIZ		25/07/2005

NOME EMPRESARIAL	M. BIGATON & CIA LTDA
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	********
PORTE	ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS	42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO	R AIMORES
NÚMERO	1887
COMPLEMENTO	
CEP	85.760-000
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO
MUNICÍPIO	CAPANEMA
UF	PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO	ESCSAGGIN15@HOTMAIL.COM
TELEFONE	(46) 3552-1342
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)	*****
SITUAÇÃO CADASTRAL	ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	25/07/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL	********
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **28/08/2018** às **15:46:04** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Rua Aimorés, nº 1887, Centro, Capanema – PR

Fone: (46) 3552-1428

CNPJ nº **07.517.372/0001-39**

11/178

ANEXO 11

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – MODELO

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa M. BIGATON & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.517.372/0001-39, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório Tomada de Preços nº 12/2018, realizado pelo Município de Capanema – PR.

Capanema, 30 de Agosto de 2018.

Tab. Notas Capanema - PR

MARCOS CESAR BIGATON
RG 7.077.215-9/CPF 027.409.389-85
Sócio Administrador

07.517.372/0001-39

M. BIGATON & CIA. LTDA.
- ME

R. AIMORÉS, 1887 - CENTRO
85760-000 - CAPANEMA - PR

TABELIONATO DE NOTAS - CAPANEMA - PR (46)3552

Selo Digital: fr5n2.2bTDY.XIRWH. Controle: Z5Leh.IDXfNJ
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura indicada MARCOS CESAR BIGATON. Dou fé. Capanema-PR, 30 agosto de 2018.
Em Test° da Verdade.
Daniela Ribeiro do Carmo - Escrevente

TABELIONATO DE NOTAS DE CAPANEMA - 85760-000 - CAPANEMA

SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 2 0552346-7	07.517.372/0001-39	25/07/2005	01/08/2005

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA AIMORES, 1887, CENTRO, CAPANEMA, PR, 85.760-000

Objeto Social
OBRAS DE TERRAPLENAGEM CONSTRUCAO DE CALCAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES E PAVIMENTACAO TRANSPORTE MAQUINAS VIA RODOVIARIAS E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS

Capital	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital: R$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS) Capital Integralizado: R$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)	Microempresa	Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
MARCOS CESAR BIGATON 027.409.389-85	100.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
MAURY BIGATON 368.902.789-68	300.000,00	SOCIO		XXXXXXXXXX

Último Arquivamento
Data: 01/02/2018 Número: 20180052055
Ato: ALTERAÇÃO
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXX

CAPANEMA - PR, 28 de agosto de 2018

18/513361-4

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 30/08/18

Carla E.F. Lucatelli
RG.: 3.463.294-4 / PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

FONE: (46) 3552 - 1706

Avenida Brasil, nº 306, Sala 2 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000

CNPJ: 84.840.503/0001-65 INSC EST: 903336005

09/180

ANEXO 01
CARTA CREDENCIAL

Capanema, 14 de agosto de 2018

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 12/2018.

Senhores

O abaixo assinado ALDEMIR COLUSSI, portador da carteira de identidade nº 2.004.536-1, na qualidade de responsável legal pela proponente A.A. COLUSSI & CIA LTDA ME, vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria que o senhor ALDO ALFREDO COLUSSI, carteira de identidade nº 2.180.712-5, é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e proposta de preços, para assinar as atas e demais documentos, e com poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitação em epígrafe.

TABELIONATO DE NOTAS - CAPANEMA - PR (46)3552.3710
Selo Digital: PXaLz.uJfrif.cJdJC. Controle: kkwr.TFpKL
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura indicada de ALDEMIR COLUSSI. Dou fé. Capanema-PR, 17 de agosto de 2018.
Em Test da Verdade.
Daniela Ribeiro do Carmo - Escrevente

Atenciosamente.

84.840.503/0001-65

A.A COLUSSI & CIA LTDA

Rua Padre Cirilo, 303
85760-000 Capanema PR


Tab. Notas Capanema - PR

ALDEMIR COLUSSI
RG: 2.004.536-1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 2.180.712-5



POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: **2.180.712-5** DATA DE EXPEDIÇÃO: 14/02/2018

NOME: **ALDO ALFREDO COLUSSI**

FILIAÇÃO: ALFIDES COLUSSI
DORINA ALBERTI COLUSSI

NATURALIDADE: CAPANEMA/PR DATA DE NASCIMENTO: 28/03/1961

DOC. ORIGEM: COMARCA=CAPANEMA/PR, DA SEDE
C.NASC=3681, LIVRO=A4, FOLHA=539

CPF: 407.983.219-20

CURITIBA/PR

MARCUS VINICIUS DA COSTA MICHELOTTO
DIRETOR

É PROIBIDO PLASTIFICAR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel
do original.
Capanema, 30/08/18

181

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
A. A. COLUSSI & CIA LTDA
CNPJ Nº 84.840.503/0001-65
NIRE: 41202633989 EM 24/09/1991

Os signatários deste instrumento:

1. ALDO ALFREDO COLUSSI, brasileiro, natural de Capanema, Paraná, solteiro nascido em 28/03/1961, empresário, inscrito no CPF nº 407.983.219-20, portador do Documento de Identidade RG nº 2.180.712-5 – SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Rua Padre Cirilo, s/nº, Centro, CEP 85760-000;
2. ALDEMIR COLUSSI, brasileiro, natural de Capanema/PR, casado pelo regime de Comunhão Universal de Bens, nascido em 24/05/1962, empresário, inscrito no CPF nº 524.947.489-68, portador do Documento de Identidade RG nº 2.004.536-1 – SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Rua Padre Cirilo, s/nº, Centro, CEP 85760-000, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de A. A. COLUSSI & CIA LTDA, com sede na Rua Padre Cirilo, nº 303, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41202633989 em 24/09/1991 e a última alteração sob nº: 20163079471 em 24/05/2016, inscrita no CNPJ nº 84.840.503/0001-65, resolvem alterar e consolidar o contrato social e posteriores alterações, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a Cláusula Segunda da Sexta Alteração do Contrato Social Consolidado, onde mencionava: A sociedade tem sua sede na Rua Padre Cirilo, nº 303, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, passa a ser: A sociedade tem sua sede na Avenida Brasil, nº 306, sala 2, caixa postal 21, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA: Da Consolidação do Contrato - À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei nº 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2017 09:20 SOB Nº 20177458399.
PROTOCOLO: 177458399 DE 13/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704495748. NIRE: 41202633989.
A. A. COLUSSI & CIA LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 23/11/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
A. A. COLUSSI & CIA LTDA
CNPJ Nº 84.840.503/0001-65
NIRE: 41202633989 EM 24/09/1991

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
A. A. COLUSSI & CIA LTDA
CNPJ Nº 84.840.503/0001-65
NIRE: 41202633989 em 24/09/1991

1. ALDO ALFREDO COLUSSI, brasileiro, natural de Capanema, Paraná, solteiro nascido em 28/03/1961, empresário, inscrito no CPF nº 407.983.219-20, portador do Documento de Identidade RG nº 2.180.712-5 – SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Rua Padre Cirilo, s/nº, Centro, CEP 85760-000;
2. ALDEMIR COLUSSI, brasileiro, natural de Capanema/PR, casado, pelo regime de Comunhão Universal de Bens, nascido em 24/05/1962, empresário, inscrito no CPF nº 524.947.489-68, portador do Documento de Identidade RG nº 2.004.536-1 – SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Rua Padre Cirilo, s/nº, Centro, CEP 85760-000, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de A. A. COLUSSI & CIA LTDA, com sede na Av. Brasil, nº 306, sala 2, Caixa Postal 21, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41202633989 em 24/09/1991 e a última alteração sob nº 20163079471 em 24/05/2016, inscrita no CNPJ nº 84.840.503/0001-65, resolvem consolidar o contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial A. A. COLUSSI & CIA LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na Av. Brasil, nº 306, sala 2, Caixa Postal 21, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social é (CNAE – 4313-4/00) Obras de terraplenagem, (CNAE – 4213-8/00) Construção de Calçamento com Pedras Irregulares, (CNAE – 4319-3/00) Pavimentação, Saneamento Básico, (CNAE – 4930-2/02) Transportes de Cargas e Máquinas via Rodoviária, (CNAE – 7732-2/01) Locação de Veículos e Máquinas, (CNAE

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2017 09:20 SOB Nº 20177458399.
PROTOCOLO: 177458399 DE 13/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704495748. NIRE: 41202633989.
A. A. COLUSSI & CIA LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 23/11/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
A. A. COLUSSI & CIA LTDA
CNPJ Nº 84.840.503/0001-65
NIRE: 41202633989 EM 24/09/1991

– 4752-1/00) Comércio de Aparelhos Eletroeletrônicos e (CNAE – 6612-6/04) Serviços de Comissões sobre Venda de Aparelhos Telefônicos inclusive Celulares.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), dividido em 800.000 (oitocentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País e bens móveis, assim subscritas:

SÓCIOS	PART.%	QUOTAS	VALORES EM R$
ALDEMIR COLUSSI	50%	400.000	400.000,00
ALDO ALFREDO COLUSSI	50%	400.000	400.000,00
TOTAL	100%	800.000	800.000,00

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Outubro de 1991, e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-la, no caso de algum quotista pretender ceder as que possui, observando o seguinte:

I – Os sócios deverão ser comunicados por escrito para se manifestarem á respeito da preferência no prazo de 60 (sessenta) dias;

II – Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou havendo sobras, poderão as quotas cedidas ou alienadas a terceiros.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade é exercida pelo sócio ALDEMIR COLUSSI, com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA: Ao término do exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA: As deliberações relativas a todos os assuntos relevantes para a

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2017 09:20 SOB Nº 20177458399.
PROTOCOLO: 177458399 DE 13/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704495748. NIRE: 41202633989.
A. A. COLUSSI & CIA LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 23/11/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
A. A. COLUSSI & CIA LTDA
CNPJ Nº 84.840.503/0001-65
NIRE: 41202633989 EM 24/09/1991

sociedade serão definidas na reunião de sócios.

Parágrafo Único – Quando as deliberações dos sócios forem formalizadas em alteração contratual, quando tomadas por todos os sócios e por esses assinadas, fica dispensada neste caso, a reunião de sócios conforme Art. 1.072 do Novo Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos outros sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de resolução verificada em Balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis. Ainda permanecendo dúvidas reger-se-á pelas normas da sociedade anônima.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2017 09:20 SOB Nº 20177458399.
PROTOCOLO: 177458399 DE 13/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704495748. NIRE: 41202633989.
A. A. COLUSSI & CIA LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 23/11/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
A. A. COLUSSI & CIA LTDA
CNPJ Nº 84.840.503/0001-65
NIRE: 41202633989 EM 24/09/1991

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro de Capanema, Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam a presente alteração em via única.

Capanema-PR, 07 de Novembro de 2017.

Aldo Alfredo Colussi

Aldemir Colussi

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2017 09:20 SOB Nº 20177458399.
PROTOCOLO: 177458399 DE 13/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704495748. NIRE: 41202633989.
A. A. COLUSSI & CIA LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 23/11/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

187

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001/ 001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
A. A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 2 0263398-9	84.840.503/0001-65	XXXXXXXXXX	01/10/1991

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
AVENIDA BRASIL, 306-SALA 2 CXPST 21, CENTRO, CAPANEMA, PR, 85.760-000

Objeto Social
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
- CONSTRUCAO DE CALCAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES;
- PAVIMENTACAO, SANEAMENTO BASICO;
- TRANSPORTES DE CARLAS E MAQUINAS VIA RODOVIARIA;
- LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS;
- COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS E;
- SERVICOS DE COMISSOES SOBRE VENDA DE APARELHOS TELEFONICOS INCLUSIVE CELULARES.

Capital	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital: R$ 800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS) Capital Integralizado: R$ 800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS)	Microempresa	Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
ALDO ALFREDO COLUSSI 407.983.219-20	400.000,00	SOCIO		XXXXXXXXXX
ALDEMIR COLUSSI 524.947.489-68	400.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX

Último Arquivamento
Data: 30/11/2017 Número: 20178216348
Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
Evento (s):

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXX

CAPANEMA - PR, 24 de agosto de 2018

18/513367-3

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia do original.
Capanema, 30/08/18

Carla E.F. Lucatelli
RG.: 3.463.294-4 / PR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

HABILITAÇÃO
EMPRESA
A.A. COLUSSI & CIA LTDA

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
A. A. COLUSSI & CIA LTDA
CNPJ Nº 84.840.503/0001-65
NIRE: 41202633989 EM 24/09/1991

Folha 01

Os signatários deste instrumento:

1. ALDO ALFREDO COLUSSI, brasileiro, natural de Capanema, Paraná, solteiro nascido em 28/03/1961, empresário, inscrito no CPF nº 407.983.219-20, portador do Documento de Identidade RG nº 2.180.712-5 – SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Rua Padre Cirilo, s/nº, Centro, CEP 85760-000;
2. ALDEMIR COLUSSI, brasileiro, natural de Capanema/PR, casado pelo regime de Comunhão Universal de Bens, nascido em 24/05/1962, empresário, inscrito no CPF nº 524.947.489-68, portador do Documento de Identidade RG nº 2.004.536-1 – SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Rua Padre Cirilo, s/nº, Centro, CEP 85760-000, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de A. A. COLUSSI & CIA LTDA, com sede na Rua Padre Cirilo, nº 303, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41202633989 em 24/09/1991 e a última alteração sob nº: 20163079471 em 24/05/2016, inscrita no CNPJ nº 84.840.503/0001-65, resolvem alterar e consolidar o contrato social e posteriores alterações, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a Cláusula Segunda da Sexta Alteração do Contrato Social Consolidado, onde mencionava: A sociedade tem sua sede na Rua Padre Cirilo, nº 303, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, passa a ser: A sociedade tem sua sede na Avenida Brasil, nº 306, sala 2, caixa postal 21, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA: Da Consolidação do Contrato - À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei nº 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2017 09:20 SOB Nº 20177458399.
PROTOCOLO: 177458399 DE 13/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704495748. NIRE: 41202633989.
A. A. COLUSSI & CIA LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 23/11/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
A. A. COLUSSI & CIA LTDA
CNPJ Nº 84.840.503/0001-65
NIRE: 41202633989 EM 24/09/1991

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
A. A. COLUSSI & CIA LTDA
CNPJ Nº 84.840.503/0001-65
NIRE: 41202633989 em 24/09/1991

1. ALDO ALFREDO COLUSSI, brasileiro, natural de Capanema, Paraná, solteiro nascido em 28/03/1961, empresário, inscrito no CPF nº 407.983.219-20, portador do Documento de Identidade RG nº 2.180.712-5 – SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Rua Padre Cirilo, s/nº, Centro, CEP 85760-000;
2. ALDEMIR COLUSSI, brasileiro, natural de Capanema/PR, casado, pelo regime de Comunhão Universal de Bens, nascido em 24/05/1962, empresário, inscrito no CPF nº 524.947.489-68, portador do Documento de Identidade RG nº 2.004.536-1 – SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Rua Padre Cirilo, s/nº, Centro, CEP 85760-000, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de A. A. COLUSSI & CIA LTDA, com sede na Av. Brasil, nº 306, sala 2, Caixa Postal 21, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41202633989 em 24/09/1991 e a última alteração sob nº 20163079471 em 24/05/2016, inscrita no CNPJ nº 84.840.503/0001-65, resolvem consolidar o contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial A. A. COLUSSI & CIA LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na Av. Brasil, nº 306, sala 2, Caixa Postal 21, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social é (CNAE – 4313-4/00) Obras de terraplenagem, (CNAE – 4213-8/00) Construção de Calçamento com Pedras Irregulares, (CNAE – 4319-3/00) Pavimentação, Saneamento Básico, (CNAE – 4930-2/02) Transportes de Cargas e Máquinas via Rodoviária, (CNAE – 7732-2/01) Locação de Veículos e Máquinas, (CNAE

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2017 09:20 SOB Nº 20177458399.
PROTOCOLO: 177458399 DE 13/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704495748. NIRE: 41202633989.
A. A. COLUSSI & CIA LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 23/11/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
A. A. COLUSSI & CIA LTDA
CNPJ Nº 84.840.503/0001-65
NIRE: 41202633989 EM 24/09/1991

– 4752-1/00) Comércio de Aparelhos Eletroeletrônicos e (CNAE – 6612-6/04) Serviços de Comissões sobre Venda de Aparelhos Telefônicos inclusive Celulares.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), dividido em 800.000 (oitocentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País e bens móveis, assim subscritas:

SÓCIOS	PART.%	QUOTAS	VALORES EM R$
ALDEMIR COLUSSI	50%	400.000	400.000,00
ALDO ALFREDO COLUSSI	50%	400.000	400.000,00
TOTAL	100%	800.000	800.000,00

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Outubro de 1991, e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-la, no caso de algum quotista pretender ceder as que possui, observando o seguinte:

I – Os sócios deverão ser comunicados por escrito para se manifestarem á respeito da preferência no prazo de 60 (sessenta) dias;

II – Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou havendo sobras, poderão as quotas cedidas ou alienadas a terceiros.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade é exercida pelo sócio ALDEMIR COLUSSI, com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA: Ao término do exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA: As deliberações relativas a todos os assuntos relevantes para a

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2017 09:20 SOB Nº 20177458399.
PROTOCOLO: 177458399 DE 13/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704495748. NIRE: 41202633989.
A. A. COLUSSI & CIA LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 23/11/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
A. A. COLUSSI & CIA LTDA
CNPJ Nº 84.840.503/0001-65
NIRE: 41202633989 EM 24/09/1991

sociedade serão definidas na reunião de sócios.

Parágrafo Único – Quando as deliberações dos sócios forem formalizadas em alteração contratual, quando tomadas por todos os sócios e por esses assinadas, fica dispensada neste caso, a reunião de sócios conforme Art. 1.072 do Novo Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos outros sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de resolução verificada em Balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis. Ainda permanecendo dúvidas reger-se-á pelas normas da sociedade anônima.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2017 09:20 SOB Nº 20177458399.
PROTOCOLO: 177458399 DE 13/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704495748. NIRE: 41202633989.
A. A. COLUSSI & CIA LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 23/11/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
A. A. COLUSSI & CIA LTDA
CNPJ Nº 84.840.503/0001-65
NIRE: 41202633989 EM 24/09/1991

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro de Capanema, Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam a presente alteração em via única.

Capanema-PR, 07 de Novembro de 2017.

Aldo Alfredo Colussi

Aldemir Colussi

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2017 09:20 SOB Nº 20177458399.
PROTOCOLO: 177458399 DE 13/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704495748. NIRE: 41202633989.
A. A. COLUSSI & CIA LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 23/11/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais
Informando seus respectivos códigos de verificação

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

194

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
84.840.503/0001-65 MATRIZ		24/09/1991

NOME EMPRESARIAL
A.A. COLUSSI & CIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUTORA COLUSSI	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 66.12-6-04 - Corretoras de contratos de mercadorias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV BRASIL	306	SALA 2 CXPST 21

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.760-000	CENTRO	CAPANEMA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ESCSAGGIN15@HOTMAIL.COM	(46) 3552-1342

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	19/04/2001

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **13/08/2018** às **09:55:29** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

© Copyright Receita Federal do Brasil - 13/08/2018

195

Município de Capanema
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **28/09/2018**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

NEGATIVA Nº: 3644/2018

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QE3JT442CBRT

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

Inscrição Municipal	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
12726	84.840.503/0001-65	90333600 - 50	114

ENDEREÇO

AVENIDA BRASIL, 306 - SALA 2 CXPST 21 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR

CNAE / ATIVIDADES

Obras de terraplenagem, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, ansporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Corretoras de contratos de mercadorias, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Certidão emitida no dia **Capanema, 30 de Julho de 2018.**
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: **9ZTMH282QE3JT442CBRT**

IMPRIMIR VOLTAR

196

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 84840503/0001-65
Razão Social: A A COLUSSI E CIA LTDA
Endereço: AV BRASIL 306 SALA 2 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/08/2018 a 12/09/2018

Certificação Número: 2018081408405167501599

Informação obtida em 24/08/2018, às 10:17:15.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

197

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 018512672-09

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **84.840.503/0001-65**
Nome: **A. A. COLUSSI & CIA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 11/12/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (13/08/2018 10:43:50)

198

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A.A. COLUSSI & CIA LTDA
CNPJ: 84.840.503/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:39:40 do dia 25/06/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/12/2018.
Código de controle da certidão: **6A4F.EE14.75AE.B895**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
C O M A R C A D E CAPANEMA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO
CAPANEMA/PR - 85760000

T I T U L A R
DIRCE STEVENS FACCIO
J U R A M E N T A D O S
VITOR HUGO PAGNO
PATRICIA MICHELA THIESEN

199

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL, FAMÍLIA, Ações: CONCORDATA E FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

A. A. COLUSSI E CIA LTDA - ME

CNPJ 84.840.503/0001-65, no período compreendido desde 14/07/1989, até a presente data.

CAPANEMA/PR, 16 de Agosto de 2018, 13:42:00

VITOR HUGO PAGNO

PODER JUDICIÁRIO
Juízo de Direito da Comarca de
Capanema - Estado do Paraná
Av. Parigot de Souza, 1212
Cartório do Contador, Distribuidor, Partidor,
Depositário Público e Avaliador Judicial
CNPJ 01.259.161/0001-67
Dirce Stevens Facclo - Titular

Custas = R$ 45,54
Página 0001/0001
*** VALIDADE PARA 30 DIAS ** - Criação da Comarca 29.11.1967*

Tabelionato de Protesto de Títulos de Capanema - PR

VERA SALETE TSCHÁ DE WALLAU
Tabeliã Designada

Rua Padre Cirilo, 1622, Centro - Capanema - PR - Fone / Fax: (46) 3552 1190 - email: protestocapanema@gmail.com
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 08:30 ÀS 11:00 HORAS - 13:00 ÀS 17:00 HORAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que revendo os livros de Protesto de Títulos existentes neste Tabelionato, neles não consta nenhum título protestado nos último(s) 05 (CINCO) anos em nome de **A.A. COLUSSI E CIA LTDA ME,** inscrito(a) no CNPJ 84.840.503/0001-65, empresa situada na Av Brasil, Centro em Capanema/PR.

O referido é verdade e dou fé.

Capanema(PR), 13 de Agosto de 2018.

Vera Salete Tschá de Wallau
Tabeliã Designada

Custas

Busca	R$	0,57	3,00 VRC's
Certidão	R$	12,93	67,00 VRC's
Furnapen	R$	2,81	15,00 VRC's
Funrejus	R$	3,38	18,00 VRC's
FADEP	R$	0,68	
ISSQN	R$	0,41	
Total	R$	20,78	102,00 VRC's

FUNARPEN
SELO DIGITAL
VPXMj.uRNCt.vpjjp
bZwvx.dmMI2
http://funarpen.com.br

TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE CAPANEMA - PR
VERA SALETE TSCHÁ DE WALLAU
TABELIÃ DESIGNADA
RUA PADRE CIRILO,712 - CENTRO
85760-000 - CAPANEMA - PR

fls. 201

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A.A. COLUSSI & CIA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 84.840.503/0001-65
Certidão nº: 155984979/2018
Expedição: 13/08/2018, às 10:52:25
Validade: 08/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A.A. COLUSSI & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **84.840.503/0001-65, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos com Efeito de Negativa

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 113867/2018 **Validade:** 31/08/2018

Razão Social: A. A. COLUSSI E CIA LTDA - ME
CNPJ: 84840503000165
Num. Registro: 10868 **Registrada desde :** 29/10/1991
Capital Social: R$ 800.000,00
Endereço: AV. BRASIL, 306 SALA 2 CENTRO
Município/Estado: CAPANEMA-PR **CEP:** 85760000
Objetivo Social:
CNAE 4313-4/00 - Obras de terraplenagem. CNAE 4213-8/00 - Construção de calçamento com pedras irregulares. CNAE 4319-3/00 - Pavimentação, Saneamento Básico. CNAE 4930-2/02 - Transportes de cargas e máquinas via rodoviária. CNAE 7732-2/01 - Locação de veículos e máquinas. CNAE 4752-1/00 - Comércio de aparelhos eletroeletrônicos. CNAE 6612-6/04 - Serviços de comissões sobre venda de aparelhos telefônicos inclusive celulares.

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - IURI FELIPE MANICA COLUSSI
Carteira: PR-163950/D Data de Expedição: 21/08/2017
Desde: 15/09/2017 Carga Horária: 2: H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 305008/2018, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 13/08/2018 11:16:16

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

fls: 203

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **113865/2018** Validade: 09/02/2019

Nome Civil: IURI FELIPE MANICA COLUSSI
Carteira - CREA-PR Nº :PR-163950/D
Registro Nacional : 1716751004
Registrado(a) desde : 21/08/2017

Filiação : ALDEMIR COLUSSI
SILVANI MANICA COLUSSI
Data de Nascimento : 29/08/1994
Carteira de Identidade : 87149064 CPF : 04969689989
Naturalidade : FRANCISCO BELTRAO/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA
Data da Colação de Grau : 09/08/2017 Diplomação : 11/09/2017
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2018.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÃ‡Ã•ES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 305011/2018.

Emitida via Internet em 13/08/2018 11:15:56

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

fls 204

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

IURI FELIPE MANICA COLUSSI
Carteira Profissional:PR-163950/D
Acervo Técnico Nº.:**4772/2018**
Selos de autenticidade:**A 056519**

RNP Nº.:1716751004
Protocolo Nº.:**2018/00323915**

ART Nº.....:20183820669 0..... Registrada:20/08/2018.....
ART Substituída.....:20183761662 0 .....
Empresa Executora...:A. A. COLUSSI E CIA LTDA - ME.....
Contratante(s).....:CLOVIS LUIZ SALVATTI - CNPJ/CPF: 332.802.319-49.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.:OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS.....
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO.....
Serviço Contratado..:EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM.....
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO.....
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE.....
Dimensão.....:8.200,00 M2..... Área Existente:0,00 M2 .....
Área Ampliada.....:0,00 M2 ..... Área de Reforma:0,00 M2 .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:RURAL, S/N LINHA PIEDADE AREA RURAL DE FRANCISCO BELTRAO L. 84.....
Município/Estado....:FRANCISCO BELTRAO/PR.....
Data de Início.....:20/04/2018..... Data de Conclusão:15/08/2018.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES E OBRA DE ARTES, DRENAGEM PLUVIAL, MEIO-FIO E BOCA DE BUEIRO. 1200 METROS LINEARES DE TUBULAÇÃO PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS. 10400 MTS3 (METROS CÚBICOS) DE ESCAVAÇÃO E ATERRO COM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA.....
Observação.....:.....

205

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL
IURI FELIPE MANICA COLUSSI
Carteira Profissional:PR-163950/D
Acervo Técnico Nº.:**4772/2018**
Selos de autenticidade:**A 056519**

RNP Nº:1716751004
Protocolo Nº.:**2018/00323915**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
IURI FELIPE MANICA COLUSSI
Carteira Profissional:PR-163950/D
Acervo Técnico Nº.:**4772/2018**
Selos de autenticidade:**A 056519**

RNP Nº.:1716751004
Protocolo Nº.:**2018/00323915**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2018/00323915.

Emitida via Internet em 27/08/2018 10:53:40 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

09/2017

Contrato que entre si fazem de um lado a empresa **A.A COLUSSI & CIA. LTDA**. Com sede e foro na cidade de Capanema – PR, inscrita no CGC/MF sob o n° 84.840.503/0001-65, neste ato representa pelo sócio gerente **Sr. Aldo Alfredo Colussi**, doravante chamado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado o **Sr. Iuri Felipe Manica Colussi**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da C.I. **8.714.906-4** registrado no CREA-Pr 163950/D residente e domiciliado na Rua Padre Cirilo, Bairro Centro, na cidade de Capanema PR, doravante chamado simplesmente **CONTRATADO**, de acordo com as cláusulas a seguir:

PRIMEIRA: Pelo presente, o **CONTRATADO** assume o encargo de responsável técnico da **CONTRATANTE** perante o CREA, responsabilizando-se como Engenheiro Civil pelos serviços competentes ao ramo de atividade contratuais da empresa Contratante.

SEGUNDA: O presente contrato, tem prazo de 4 (quatro) anos, iniciando em 04 de Setembro de 2017 até 04 de Setembro de 2021, podendo a qualquer momento ser rescindido por qualquer uma das partes , mediante aviso com 30 dias de antecedência.

TERCEIRA: Pelo serviços prestados o **CONTRATADO** receberá mensalmente o valor de **R$1.874,00** (um mil, oitocentos e setenta e quatro reais) e cumprirá uma carga horária de 02 (duas) horas diárias de trabalho compreendendo das 13h00min às 15h00min horas de segunda a sexta-feira.

§ ÚNICO: O pagamento pelos serviços prestados serão pagos no escritório da empresa conforme recibo até o quinto dia útil posterior ao mês gerador do fato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas conhecedoras dos termos nele contidos.

CAPANEMA- PR, 04 DE SETEMBO DE 2017.

Tab. Nots Capanem.

Sr. ALDO ALFREDO COLUSSI
Contratante

Testemunhas

JOSEANE A. S. MULLER
Cpf: 093.976.2196-63

FABIO RIBEIRO
Cpf: 066.144.719-70

1º CARTÓRIO MARCZEWSKI

Eng . Civil: IURI F. MANICA COLUSSI
Contratado

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 17 / 08 / 2018

Clovis Luiz Salvatti
CPF: 332.802.319-49
Rua Minas Gerais, 1258, Alvorada
Francisco Beltrão, Paraná, 85601060

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins que a empresa A. A. Colussi & Cia Ltda Me, CNPJ: 848405030001-65, com sede na Avenida Brasil, 306, Capanema, Paraná, registrada no CREA-PR sob n° 10868, tendo como responsável técnico o engenheiro civil, Iuri Felipe Manica Colussi, CREA-PR de n° 163950/D, residente e domiciliado na rua Padre Cirilo, 730, Centro, Capanema, Paraná, executou para o Sr. Clóvis Luiz Salvatti, CPF n° 332.802.319-49, serviços técnicos de arruamento, conforme descrição nos campos abaixo.

LOCAL DA OBRA

Área rural de Francisco Beltrão, Linha Piedade, Lote 84, Gleba 50.

DESCRIÇÃO DA OBRA

Execução de pavimentação poliédrica com pedras irregulares com 8200 m2 (metros quadrados), 1200 metros lineares de tubulação para escoamento de águas pluviais e 10400 m3 (metros cúbicos) de escavação e aterro com material de primeira categoria.

ART CREA-PR n° 20183820669 **DATA DE INÍCIO** 20/04/2018
DATA DE TÉRMINO 15/08/2018

Declaramos que todos os requisitos de qualidade técnica foram cumpridos, sendo esta á expressão da verdade datamos e assinamos o presente.

Capanema/PR, 20 de agosto de 2018

Clovis Luiz Salvatti
CPF: 332.802.319-49

Lei 11.226 de 18/07/2005 - SELO DE AUTENTICIDADE - CAPANEMA - PR
SELO FUNARPEN
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FOI63264

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 056519

Tab. Notas Capanema - PR

TABELIONATO DE NOTAS
CAPANEMA - PARANÁ
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia confere
com seu original. Dou fé.
27 AGO. 2018
Daniela Ribeiro do Carmo
Escrevente

Capanema, 27 de agosto de 2018.

ATESTADO DE VISITA

Atesto que a empresa AA COLUSSI & CIA LTDA-ME, Cnpj nº 84.840.503/0001-65, que o ENGENHEIRO CIVIL IURI FELIPE MANICA COLUSSI CREA PR 163950/D, responsável técnico da referida empresa, visitou o local da obra **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDEO DO NORTE E AVENIDA ATAÍDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRSITÓVÃO EM CAPANEMA-PR, EM ANTENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017 – OPERAÇÃO 1041530-91 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBNO.**, no endereço especificas conforme consta no edital da referida tomada de preço 12/2018.

Atenciosamente,

Engº. Rubens Luis Rolando Souza
CREA RS 88296/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO MUNICÍPIO

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR

A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

FONE: (46) 3552 - 1706

Avenida Brasil, nº 306, Sala 2 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000

CNPJ: 84.840.503/0001-65 INSC EST: 903336005

FLS: 210

ANEXO 10
DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE

Iuri Felipe Manica Colussi, CPF nº 049.696.899-89, CREA nº 163950/D, declara que é conhecedor das condições constantes no Tomada de Preços nº 12/2018 e que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA, CNPJ nº848405030001-65, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU N 856605/2017 – OPERAÇÃO 1041530-91-PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.

Capanema, 14 de agosto de 2018.

84.840.503/0001-65
A.A COLUSSI & CIA LTDA
Rua Padre Cirilo, 303
85760-000 Capanema PR

Iuri. F. M. Colussi
Engº Civil
CREA-PR163.950/D

Iuri Felipe M. Colussi

Iuri Felipe Manica Colussi
RG: 8714906-4

A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

FONE: (46) 3552 - 1706

Avenida Brasil, nº 306, Sala 2 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000

CNPJ: 84.840.503/0001-65 INSC EST: 903336005

211

ANEXO 04

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 12/2018

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA nº	Data do registro	Assinatura do profissional
IURI FELIPE MANICA COLUSSI	ENG CIVIL	163950/D	21/08/2017	

Iuri. F. M. Colussi Engº Civil CREA-PR163.950/D

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das Leis Trabalhistas vigentes.

Capanema-PR, 14 de agosto de 2018.

84.840.503/0001-65

A.A COLUSSI & CIA LTDA

Rua Padre Cirilo, 303
85760-000 Capanema PR

ALDEMIR COLUSSI
2.004.536-1/524.947.489-68
SÓCIO PROPRIETÁRIO

A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

FONE: (46) 3552 - 1706

Avenida Brasil, nº 306, Sala 2 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000

CNPJ: 84.840.503/0001-65 INSC EST: 9033360050

212

ANEXO 12

DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Referência:

Município de Capanema - PR

Tomada de Preços N° 12/2018

A.A. COLUSSI E CIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF nº 84.840.503/0001-65, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) ALDEMIR COLUSSI, portador(a) do documento de identidade RG nº 2.004.536-1, emitido pela SSP/PR , e do CPF nº 524.947.489-68, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no 8.7.5, alínea "g" do edital de licitação, que possui todos equipamentos mínimos e dispõe de pessoal técnico para a execução do objeto da licitação.

I **I. Caminhão basculante;**

II **II. Rolo vibratório pra compactação;**

III **III. Ferramentas manuais (carrinhos, pás, picaretas, enxadas, soquetes, martelos etc.);**

IV **IV. Mão-de-obra suficiente para a execução do contrato no prazo pactuado.**

Analisando os compromissos e contratos de prestação de serviços vigentes na data da Sessão Pública, DECLARA também que os equipamentos acima e pessoal estão disponíveis para execução da obra objeto deste certame licitatório, não possuindo outros compromissos ou contratos que cumulativamente possam necessitar de tais equipamentos e pessoal, e consequentemente colocar em risco o cumprimento dos prazos de execução desta obra.

Capanema – PR, 28 de agosto de 2018.

84.840.503/0001-65

A.A COLUSSI & CIA LTDA

Rua Padre Cirilo, 303

85760-000 Capanema PR

Nome: Aldemir Colussi
RG 2.004.536-1
CPF: 524.947.489-68
Cargo: Sócio proprietario

A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

FONE: (46) 3552 - 1706

Avenida Brasil, nº 306, Sala 2 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000

CNPJ: 84.840.503/0001-65 INSC EST: 9033360050

0213

ANEXO 13

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2018
PROPONENTE: **A. A. COLUSSI E CIA LTDA-ME**

MUNICIPIO / LOCAL: NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR.	ÁREA CONSTRUIDA: **5.078,48m²**
LOTE: 01	PRAZO DE EXECUÇÃO: **180 DIAS**

ITEM	DESCRIMINAÇAO DOS VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS		PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)							
			30	60	90	120	150	180	210	240
1	MOTONIVELADORA	Utilização	X	X						
		Quantidade	01	01						
2	PÁ CARREGADEIRA	Utilização	X	X	X	X	X	X		
		Quantidade	01	01	01	01	01	01		
3	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	Utilização	X	X						
		Quantidade	01	01						
4	CAMINHÃO BASCULANTE	Utilização	X	X	X	X	X	X		
		Quantidade	02	03	03	03	03	02		
5	ROLO COMPACTADOR	Utilização	X	X	X	X	X	X		
		Quantidade	01	01	01	01	01	01		
6	RETRO ESCAVADEIRA	Utilização	X	X	X					
		Quantidade	01	01	01					
7		Utilização								
		Quantidade								

84.840.503/0001-65
A.A COLUSSI & CIA LTDA
Rua Padre Cirilo, 303
85760-000 Capanema PR

A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

FONE: (46) 3552 - 1706

Avenida Brasil, nº 306, Sala 2 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000

CNPJ: 84.840.503/0001-65 INSC EST: 903336005

214

ANEXO 05
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 12/2018

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Tomada de Preços nº 12/2018, instaurado pelo Município de Capanema-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como, que nossa empresa não possui menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

84.840.503/0001-65

Capanema-PR, 14 de agosto de 2018.

A.A COLUSSI & CIA LTDA

Rua Padre Cirilo, 303
85760-000 Capanema PR

ALDEMIR COLUSSI
2.004.536-1/524.947.489-68
SÓCIO PROPRIETÁRIO

A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

FONE: (46) 3552 - 1706

Avenida Brasil, nº 306, Sala 2 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000

CNPJ: 84.840.503/0001-65 INSC EST: 903336005

ANEXO 02

Declaração de Regularidade no Ministério do Trabalho

DECLARAÇÃO DE* REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO *EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Referência:

Município de Capanema - PR

Tomada de Preços nº 12/2018.

A.A. COLUSSI & CIA LTDA , inscrita no CNPJ/MF nº 848405030001/65 , por intermédio de seu representante legal, o Sr. ALDEMIR COLUSSI , portador do documento de identidade RG nº 2.004.536-1, emitido pela SSP/PR , e do CPF nº 524.947.489-68 , DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Capanema-PR, 14 de agosto de 2018.

84.840.503/0001-65

A.A COLUSSI & CIA LTDA

Rua Padre Cirilo, 303

85760-000 Capanema PR

ALDEMIR COLUSSI

2.004.536-1/524.947.489-68

SÓCIO PROPRIETÁRIO

A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

FONE: (46) 3552 - 1706

Avenida Brasil, nº 306, Sala 2 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000

CNPJ: 84.840.503/0001-65 INSC EST: 9033360050

ANEXO 11

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa A. A. COLUSSI E CIA LTDA –ME (denominação da Pessoa Jurídica), inscrita no CNPJ sob o nº 84.840.503/0001-65, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório Tomada de Preços nº 2/2017, realizado pelo Município de Capanema – PR.

Capanema – PR, 14 de agosto de 2018.

84.840.503/0001-65

A.A COLUSSI & CIA LTDA

Rua Padre Cirilo, 303

85760-000 Capanema PR

Tab. Notas Capanema - PR

ALDEMIR COLUSSI

RG: 2.004.536-1

SÓCIO PROPRIETÁRIO

TABELIONATO DE NOTAS - CAPANEMA - PR (46)3552.3710

Selo Digital: 6r5n2.2bim.8TdJC Controle: kKRvr.IpTyX

Consulte esse selo em http://funarpen.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura indicada de ALDEMIR COLUSSI. Dou fé. Capanema-PR, 30 de agosto de 2018.

Em Test da Verdade

Patrícia Francieli Weiller - Escrevente

TABELIONATO DE NOTAS DE CAPANEMA - 85760-000 - CAPANEMA - PR

A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

FONE: (46) 3552 - 1706

Avenida Brasil, nº 306, Sala 2 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000

CNPJ: 84.840.503/0001-65 INSC EST: 903336005

217

ANEXO 08

TERMO DE RENÚNCIA

À Comissão de Licitações

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 12/2018

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Tomada de Preços nº 12/2018, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

Capanema-PR, 14 de agosto de 2018.

84.840.503/0001-65
A.A COLUSSI & CIA LTDA
Rua Padre Cirilo, 303
85760-000 Capanema PR

ALDEMIR COLUSSI
2.004.536-1/524.947.489-68
SÓCIO PROPRIETÁRIO

HABILITAÇÃO
EMPRESA
M.BIGATON & CIA
LTDA

219

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
M. BIGATON & CIA LTDA - ME
CNPJ nº 07.517.372/0001-39
NIRE 41205523467 EM 25/07/2005

Os signatários deste instrumento:

1. MAURY BIGATON, brasileiro, casado, pelo Regime de Comunhão Universal de Bens, empresário, inscrito no CPF nº 368.902.789-68, portador do Documento de Identidade RG nº 1.496.984 - SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 860, Centro, CEP 85760-000;

2. MARCOS CESAR BIGATON, brasileiro, natural de Capanema, Paraná, solteiro, nascido em 09/08/1978, empresário, inscrito no CPF nº 027.409.389-85, portador do Documento de Identidade RG nº 7.077.215-9 - SSP/PR, residente e domiciliado à Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 860, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de M. BIGATON & CIA LTDA - ME, com sede na Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 860, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41205523467 em 25/07/2005 e posterior alteração sob nº 20100090460 em 14/01/2010, resolvem alterar o contrato social e posterior alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a Clausula Primeira da Segunda Alteração do Contrato Social Consolidado, onde mencionava: A sociedade gira sob o nome empresarial de M. BIGATON & CIA LTDA – ME e tem sede e domicílio na Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 860, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85.760-000, passando a ser: A sociedade gira sob o nome empresarial de M. BIGATON & CIA LTDA – ME e tem sede e domicílio na Rua Aimores, nº 1887, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000.

CLAUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Cláusula Segunda da Segunda Alteração do Contrato Social Consolidado, onde mencionava o valor e a distribuição do Capital: O valor do Capital que era R$ 70.000,00 (setenta mil reais) já integralizados é elevado para R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo o aumento é integralizado, neste ato, com utilização de Reserva de Lucros contabilizados na empresa, ficando assim,

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2018 10:33 SOB Nº 20180052055.
PROTOCOLO: 180052055 DE 16/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800357391. NIRE: 41205523467.
M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 01/02/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

distribuído entre os sócios da seguinte forma: R$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais) ao Sócio MAURY BIGATON e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao Sócio MARCOS CESAR BIGATON.

CLAUSULA TERCEIRA: O sócio MAURY BIGATON, que possui na sociedade 396,000 (trezentas e noventa e seis mil) quotas, de R$ 1,00 (um real), cada uma, totalizando R$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais), vende e transfere neste ato em moeda corrente do pais a quantia de 96,000 (noventa e seis mil) quotas já integralizadas, de R$ 1,00 (um) real, cada uma totalizando R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) ao sócio MARCOS CESAR BIGATON, que já integra a sociedade, dando plena, geral e rasa quitação da venda de quotas ora efetuadas, declarando este conhecer a situação econômico-financeira da sociedade, ficando desta forma sub-rogado nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento, ficando assim, distribuído entre os sócios da seguinte forma: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ao Sócio MAURY BIGATON e R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao Sócio MARCOS CESAR BIGATON.

Parágrafo Primeiro: Em virtude das modificações da Cláusula Segunda da Segunda Alteração do Contrato Social Consolidado, a Cláusula de Capital Social passa a ter a seguinte redação: O capital será de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas na empresa, pelos sócios:

SÓCIOS	PART.%	QUOTAS	VALORES EM R$
MAURY BIGATON	75%	300.000	300.000,00
MARCOS CESAR BIGATON	25%	100.000	100.000,00
TOTAL	100%	400.000	400.000,00

CLAUSULA QUARTA: Fica alterada a Clausula Terceira da Segunda alteração do Contrato Social Consolidado onde mencionava: O objeto social é CNAE (43.13/4-00) Terraplenagem, CNAE (42.13/8-00) Construção de Calçamento com Pedras Irregulares e Pavimentação, passando a ser: CNAE (43.13/4-00) Obras de Terraplenagem, CNAE (42.13/8-00) Construção de Calçamento com Pedras Irregulares e Pavimentação, CNAE (49.30/2-02) Transporte Maquinas Via Rodoviarias e CNAE (77.32/2-01) Locação de Veiculos e Maquinas.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2018 10:33 SOB Nº 20180052055.
PROTOCOLO: 180052055 DE 16/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800357391. NIRE: 41205523467.
M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 01/02/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
M. BIGATON & CIA LTDA - ME
CNPJ nº 07.517.372/0001-39
NIRE 41205523467 EM 25/07/2005

CLÁUSULA QUINTA: Fica alterada a Clausula Sétima da Segunda Alteração do Contrato Social Consolidado onde mencionava: A administração da sociedade cabe ao sócio MAURY BIGATON, com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Único - Fica facultado ao administrador nomear procurador, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelo procurador assim nomeado, passando a ser: A administração da sociedade caberá ao sócio MARCOS CESAR BIGATON com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, individualmente, sem autorização e consentimento do outro sócio, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

CLAUSULA SEXTA: O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SETIMA: Fica inclusa a Clausula: Os sócios terão participação nos lucros e nas perdas na proporção das quotas que possuírem na sociedade, sendo permitida a distribuição desproporcional dos lucros, sempre que assim deliberarem a totalidade dos quotistas em reunião especialmente para este fim.

CLÁUSULA OITAVA: Da Consolidação do Contrato - À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei nº 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2018 10:33 SOB Nº 20180052055.
PROTOCOLO: 180052055 DE 16/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800357391. NIRE: 41205523467.
M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 01/02/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
M. BIGATON & CIA LTDA - ME
CNPJ nº 07.517.372/0001-39
NIRE 41205523467 EM 25/07/2005

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
M. BIGATON & CIA LTDA – ME
CNPJ nº 07.517.372/0001-39
NIRE 41205523467 EM 25/07/2005

1- MAURY BIGATON, brasileiro, casado, pelo Regime de Comunhão Universal de Bens, empresário, inscrito no CPF nº 368.902.789-68, portador do Documento de Identidade RG nº 1.496.984 - SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 860, Centro, CEP 85760-000;

1. MARCOS CESAR BIGATON, brasileiro, natural de Capanema, Paraná, solteiro, nascido em 09/08/1978, empresário, inscrito no CPF nº 027.409.389-85, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.077.215-9 – SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 860, Centro, CEP 85760-000, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de M. BIGATON & CIA LTDA - ME, com sede na Rua Aimores, nº 1887, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41205523467 em 25/07/2005 e posterior alteração sob nº 20100090460 em 14/01/2010, resolvem consolidar o contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de M. BIGATON & CIA LTDA – ME e tem sede e domicílio na Rua Aimores, nº 1887, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real), integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS	PART.%	QUOTAS	VALORES EM R$
MAURY BIGATON	75%	300,000	300.000,00
MARCOS CESAR BIGATON	25%	100,000	100.000,00
TOTAL	100%	400,00	400.000,00

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2018 10:33 SOB Nº 20180052055.
PROTOCOLO: 180052055 DE 16/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800357391. NIRE: 41205523467.
M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 01/02/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
M. BIGATON & CIA LTDA - ME
CNPJ nº 07.517.372/0001-39
NIRE 41205523467 EM 25/07/2005

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto CNAE (43.13/4-00) Obras de Terraplenagem, CNAE(42.13/8-00) Construção de Calçamento com Pedras Irregulares e Pavimentação, CNAE (49.30/2-02) Transporte Maquinas Via Rodoviarias e CNAE (77.32/2-01) Locação de Veiculos e Maquinas.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Agosto de 2005 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá ao sócio MARCOS CESAR BIGATON com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, individualmente, sem autorização e consentimento do outro sócio, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

Parágrafo Único - Fica facultado ao administrador nomear procurador, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelo procurador assim nomeado.

CLAUSULA OITAVA: Os sócios terão participação nos lucros e nas perdas na proporção das quotas que possuírem na sociedade, sendo permitida a distribuição desproporcional dos lucros, sempre que assim deliberarem a totalidade dos quotistas em reunião especialmente para este fim.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro o administrador prestará contas justificadas de sua administração procedendo à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DECIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2018 10:33 SOB Nº 20180052055.
PROTOCOLO: 180052055 DE 16/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800357391. NIRE: 41205523467.
M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 01/02/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
M. BIGATON & CIA LTDA - ME
CNPJ nº 07.517.372/0001-39
NIRE 41205523467 EM 25/07/2005

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As deliberações relativas a todos os assuntos relevantes para a sociedade serão definidas na reunião de sócios.

Parágrafo Único - Quando as deliberações dos sócios forem formalizadas em alteração contratual, quando tomadas por todos os sócios e por esses assinadas, fica dispensada neste caso, a reunião de sócios conforme artigo 1.072 do Novo Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do outro sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar ao remanescente, por escrito, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo a este o direito de preferência na aquisição das mesmas.

Parágrafo Único - Se o sócio remanescente não usar do direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir as suas quotas a terceiro.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na Lei nº 10.406, de 10 de

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2018 10:33 SOB Nº 20180052055.
PROTOCOLO: 180052055 DE 16/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800357391. NIRE: 41205523467.
M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 01/02/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

225

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
M. BIGATON & CIA LTDA - ME
CNPJ nº 07.517.372/0001-39
NIRE 41205523467 EM 25/07/2005

Janeiro de 2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis. Ainda permanecendo dúvidas reger-se-á pelas normas da sociedade anônima.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Fica eleito o foro da cidade de Capanema, Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em via única.

Capanema - PR, 04 de Janeiro de 2018.

Maury Bigaton

Tab. Notas Capanema - PR

Marcos Cesar Bigaton

Tab. Notas Capanema - PR

TABELIONATO DE NOTAS - CAPANEMA - PR (46)3552.3710
Selo Digital: 5ANLr bmUDY Z6RVV4 Controle: 7Dann 3Kbt4
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por VERDADEIRA as assinaturas indicadas de MAURY BIGATON e MARCOS CESAR BIGATON. Dou fé.
Capanema-PR, 12 de janeiro de 2018.
Em Test° da Verdade
Daniela Ribeiro do Carmo - Escrevente

TABELIONATO DE NOTAS DE CAPANEMA - 85760-000 - CAPANEMA - PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2018 10:33 SOB Nº 20180052055.
PROTOCOLO: 180052055 DE 16/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800357391. NIRE: 41205523467.
M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 01/02/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRACAO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

226

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001 / 001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 2 0552346-7	07.517.372/0001-39	25/07/2005	01/08/2005

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA AIMORES, 1887, CENTRO, CAPANEMA, PR, 85.760-000

Objeto Social
OBRAS DE TERRAPLENAGEM CONSTRUCAO DE CALCAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES E PAVIMENTACAO TRANSPORTE MAQUINAS VIA RODOVIARIAS E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS

Capital	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital: R$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS) Capital Integralizado: R$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)	Microempresa	Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
MARCOS CESAR BIGATON 027.409.389-85	100.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
MAURY BIGATON 368.902.789-68	300.000,00	SOCIO		XXXXXXXXXX

Último Arquivamento
Data: 01/02/2018 Número: 20180052055
Ato: ALTERAÇÃO
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXX

CAPANEMA - PR, 28 de agosto de 2018

18/513361-4

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original
Capanema, 30/08/18

Carla E.E. Lucatelli
RG.: 3.463.294-4 / PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

041/227

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 2 0552346-7	07.517.372/0001-39	25/07/2005	01/08/2005

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA AIMORES, 1887, CENTRO, CAPANEMA, PR, 85.760-000

Objeto Social
OBRAS DE TERRAPLENAGEM CONSTRUCAO DE CALCAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES E PAVIMENTACAO TRANSPORTE MAQUINAS VIA RODOVIARIAS E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS

Capital	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital: R$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS) Capital Integralizado: R$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)	Microempresa	Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
MARCOS CESAR BIGATON 027.409.389-85	100.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
MAURY BIGATON 368.902.789-68	300.000,00	SOCIO		XXXXXXXXXX

Último Arquivamento
Data: 01/02/2018 Número: 20180052055
Ato: ALTERAÇÃO
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXX

CAPANEMA - PR, 28 de agosto de 2018

18/513361-4

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 30/08/18

Carla E.F. Lucatelli
RG.: 3.463.294-4 / PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.517.372/0001-39 MATRIZ		25/07/2005

NOME EMPRESARIAL	M. BIGATON & CIA LTDA
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	********
PORTE	ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS	42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA	206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AIMORES	1887	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.760-000	CENTRO	CAPANEMA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ESCSAGGIN15@HOTMAIL.COM	(46) 3552-1342

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)	*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	25/07/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **30/08/2018** às **08:39:43** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

229

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: M. BIGATON & CIA LTDA
CNPJ: 07.517.372/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:19:58 do dia 04/06/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/12/2018.
Código de controle da certidão: **CA9B.5899.DBB9.2DFE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

044/230

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07517372/0001-39
Razão Social: M BIGATON E CIA LTDA
Endereço: AV' PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA 860 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/08/2018 a 19/09/2018

Certificação Número: 2018082103394702443744

Informação obtida em 28/08/2018, às 16:24:35.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

231

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 018520511-44

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **07.517.372/0001-39**
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 12/12/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (14/08/2018 10:40:36)

232

Município de Capanema
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **21/09/2018**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

NEGATIVA Nº: 3280/2018

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QE5XT4424Q92

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Inscrição Municipal	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
26921	07.517.372/0001-39		0105

ENDEREÇO

R AIMORÉS, 1887 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR

CNAE / ATIVIDADES

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Obras de terraplenagem, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

Certidão emitida no dia **Capanema, 23 de Julho de 2018.**
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: **9ZTMH282QE5XT4424Q92**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CAPANEMA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO
CAPANEMA/PR - 85760000

TITULAR
DIRCE STEVENS FACCIO
JURAMENTADOS
VITOR HUGO PAGNO
PATRICIA MICHELA THIESEN

233

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL, FAMÍLIA, Ações: CONCORDATA E FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

M. BIGATON E CIA LTDA

CNPJ 07.517.372/0001-39, no período compreendido desde 14/07/1989, até a presente data.

CAPANEMA/PR, 27 de Agosto de 2018, 16:06:04

VITOR HUGO PAGNO

PODER JUDICIÁRIO
Juízo de Direito da Comarca de Capanema - Estado do Paraná
Av. Parigot de Souza, 1212
Cartório do Contador, Distribuidor, Partidor, Depositário Público e Avaliador Judicial
CNPJ 01.259.161/0001-67
Dirce Stevens Faccio - Titular

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 30 / 08 / 18

Custas = R$ 45,54
Página 0001/0001

** VALIDADE PARA 30 DIAS ** - Criação da Comarca 29.11.1967

Tabelionato de Protesto de Títulos de Capanema - PR

VERA SALETE TSCHÁ DE WALLAU
Tabeliã Designada

Rua Padre Cirilo, 1622, Centro - Capanema - PR - Fone / Fax: (46) 3552 1190 - email: protestocapanema@gmail.com
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 08:30 ÀS 11:00 HORAS - 13:00 ÀS 17:00 HORAS

Fls. 234

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que revendo os livros de Protesto de Títulos existentes neste Tabelionato, neles não consta nenhum título protestado nos último(s) 05 (CINCO) anos em nome de **M. BIGATON & CIA LTDA,** inscrito(a) no CNPJ 07.517.372/0001-39, empresa situada na Rua Aimorés, 1887 em Capanema/PR.

O referido é verdade e dou fé.

Capanema(PR), 30 de Agosto de 2018.

Vera Salete Tschá de Wallau
Tabeliã Designada

Custas

Busca	R$	0,57	3,00 VRC´s
Certidão	R$	12,93	67,00 VRC´s
Furnapen	R$	2,81	15,00 VRC´s
Funrejus	R$	3,38	18,00 VRC´s
FADEP	R$	0,68	
ISSQN	R$	0,41	
Total	R$	20,78	102,00 VRC´s

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que o documento é cópia fiel do original.
Capanema, 30/08/18

FUNARPEN
SELO DIGITAL
TPXIo.uRNpk.7sjju
OeKZx.wqPxU
http://funarpen.com.br

TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE CAPANEMA - PR
VERA SALETE TSCHÁ DE WALLAU
TABELIÃ DESIGNADA
RUA PADRE CIRILO, 1712 - CENTRO
CAPANEMA - PR

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

235

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. BIGATON & CIA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.517.372/0001-39
Certidão nº: 157309322/2018
Expedição: 28/08/2018, às 16:26:39
Validade: 23/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. BIGATON & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.517.372/0001-39, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 120772/2018 **Validade:** 23/02/2019

Razão Social: M. BIGATON & CIA LTDA - ME
CNPJ: 07517372000139
Num. Registro: 55983 **Registrada desde :** 20/11/2013
Capital Social: R$ 400.000,00
Endereço: RUA AIMORES, 1887 CENTRO
Município/Estado: CAPANEMA-PR **CEP:** 85760000
Objetivo Social:
CNAE (43.13/4-00) - Obras de Terraplenagem. CNAE (42.13/8-00) - Construção de calçamento com pedras irregulares e pavimentação. CNAE (49.30/2-02) - Transporte máquinas via rodoviárias. CNAE (77.32/2-01) - Locação de veículos e máquinas.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2018.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - JOÃO PEDRO MARKUS
Carteira: PR-144320/D Data de Expedição: 19/02/2015
Desde: 15/08/2017 Carga Horária: 4: H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 325128/2018, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

237

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **120770/2018** Validade: 23/02/2019

Nome Civil: JOÃO PEDRO MARKUS
Carteira - CREA-PR Nº :PR-144320/D
Registro Nacional : 1714045340
Registrado(a) desde : 19/02/2015

Filiação : ELTON ADEMIR MARKUS
ROSEMAR MARIA LUCIO MARKUS
Data de Nascimento : 30/07/1993
Carteira de Identidade : 73448271 CPF : 06211886977
Naturalidade : REALEZA/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL
FACULDADE ASSIS GURGACZ
Data da Colação de Grau : 29/01/2015 Diplomação : 29/01/2015
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
63508 - MARKUS ENGENHARIA - EIRELI - ME
Desde: 26/05/2017 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

55983 - M. BIGATON & CIA LTDA - ME
Desde: 15/08/2017 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2018.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÃ‡Ã•ES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 325122/2018.

014238

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL
JOÃO PEDRO MARKUS
Carteira Profissional:PR-144320/D
Acervo Técnico Nº.:**6388/2017**
Selos de autenticidade:**A 050553**

RNP Nº:1714045340
Protocolo Nº.:**2017/00399314**

239

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

JOÃO PEDRO MARKUS
Carteira Profissional:PR-144320/D
Acervo Técnico Nº.:**6388/2017**
Selos de autenticidade:**A 050553**

RNP Nº.:1714045340
Protocolo Nº.:**2017/00399314**

ART N°.....:20173983415 0..... Registrada:12/09/2017.....
Empresa Executora...:M. BIGATON & CIA LTDA - ME.....
Contratante(s).....:ATLÂNTICO INCORPORADORA II LTDA - ME - CNPJ/CPF: 22.154.776/0001-07.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.:OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS.....
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO.....
Serviço Contratado..:EXECUÇÃO.....
EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM.....
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO.....
OUTROS.....
FISCALIZAÇÃO (OBRAS PÚBLICAS/OBRAS PRÓP).....
Dimensão.....:11.438,60 M2..... Área Existente:0,00 M2 .....
Área Ampliada.....:0,00 M2 ..... Área de Reforma:0,00 M2 .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:LOTEAMENTO RESIDENCIAL ATLÂNTICO II, S/N SÃO JOSÉ OPERÁRIO.....
Município/Estado....:CAPANEMA/PR.....
Data de Início.....:15/09/2017..... Data de Conclusão:06/11/2017.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES (CALÇAMENTO) NUM TOTAL DE 11.438,6M² COMPREENDENDO AS RUAS OTTILIA ROYER, RUA PARAÍSO, RUA BETO MARCELLO ENTRE OTÁVIO KISCHNER E MINAS GERAIS E ENTRE RUA MINAS GERAIS E DIVISA. RUA NATALINO CENSI ENTRE OTÁVIO KISCHNER E DIVISA E RUA ATLÂNTICO ENTRE OTÁVIO KISCHNER E LOTE 51-A. EXECUÇÃO DE 1.480 METROS LINEARES DE MEIO FIO EM CONCRETO. EXECUÇÃO DE 1.655 METROS LINEARES DE GALERIAS PLUVIAIS TERRAPLENAGEM (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA) NUM VOLUME TOTAL DE 5.000 METROS CÚBICOS PARA NIVELAMENTO DE VIAS E ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA GALERIAS PLUVIAIS.....
Observação.....:.....

000240

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
JOÃO PEDRO MARKUS
Carteira Profissional:PR-144320/D
Acervo Técnico Nº.:**6388/2017**
Selos de autenticidade:**A 050553**

RNP Nº.:1714045340
Protocolo Nº.:**2017/00399314**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2017/00399314.

Emitida via Internet em 27/08/2018 09:33:35 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

241

CONTRATO PARTICULAR DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Os signatários do presente M. BIGATON & CIA LTDA – ME , inscrita no CNPJ sob o nº 07.517.372/0001-39, com sua sede na cidade de Capanema-PR situado a Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza - 860, com o objeto de engenharia civil – Terraplenagem, Construção de calçamento com pedras irregulares e pavimentação, neste ato denominada CONTRATANTE e, do outro lado JOÃO PEDRO MARKUS, Engenheiro Civil portador do RG nº 7.344.827-1, CREA/PR - 144320/D, residente da cidade de Capanema-PR na Rua tamoio 1600 centro, neste ato simplesmente denominado CONTRATADO, têm justo e acertado pelo que aceitam e outorgam, mediante e de acordo com as clausulas e condições adiantes estipuladas:

PRIMEIRA: A contratante neste ato e por instrumento contrata o Contratado para Responsabilidade Técnica de engenharia da empresa, para execução dos serviços pertinentes a atividade empresarial.

SEGUNDA: O Prazo deste contrato é a partir de 01/08/2017 com vencimento em 01/08/2020.

TERCEIRA: A carga horária ora contratada é de 4hs (quatro) por dia, ou seja, de segunda a sexta feira das 8:00 as 12:00 que o contratado se obriga a executar os serviços mensalmente a partir da data estipulada.

QUARTA: Todos os trabalhos a serem executados deverão seguir sempre de acordo com as normas estabelecidas pelo CREA-PR.

QUINTA: O valor mensal dos serviços de responsabilidade técnica que a contratante pagará é de R$: 3.748,00 (três mil setecentos e quarenta e oito reais), pagamentos este que deverão ser comprovados mediante recibos.

SEXTA: Para a solução de questões oriundas deste contrato, elegem em comum acordo o foro desta comarca.

E estando assim justos contratados, datam e assinam o presente instrumento em 03 (três vias) de igual teor e forma, obrigando-se fielmente a cumpri-lo em todas as suas clausulas.

Prefeitura Municipal de Capanem
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 19 12 2017

Capanema, 01 de agosto de 2017.

Tab. Notas Capanema - PR

CONTRATANTE – M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Tab. Notas Capanema - PR

CONTRATADO - JOÃO PEDRO MARKUS

TABELIONATO DE NOTAS - CAPANEMA - PR | (46)355
Selo Digital: 4O6.IH.zO.uF.YeJx4.Controle: 7Dump.tYKHw
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por SEMELHANÇA as assinaturas indicadas de MAURY BIGATON e JOÃO PEDRO MARKUS. Dou fé.
Capanema-PR, 19 de dezembro de 2017.
Em Test°_____da Verdade
Daniela Ribeiro do Carmo - Escrevente

TABELIONATO DE NOTAS • CAPANEMA • PR • 85760-000

AV. BRASIL, 863 – CENTRO
85760-000 – Capanema – PR
CNPJ: 22.154.776/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa M. BIGATON & CIA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ 07.517.372/0001-39, com sede Av. Pedro Viriato Parigot de Souza 860, centro, Capanema/PR, através de seu responsável técnico, o Engenheiro Civil João Pedro Markus, CREA-PR 144320/D, foi contratada por Atlântico Incorporadora II LTDA, inscrita no CNPJ: 22.154.776/0001-07, localizada na Avenida Brasil 863, centro Capanema/PR, executou dentro das normas legais o serviço de PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, na obra denominada Residencial Atlântico II, situada no município de Capanema/PR rodovia BR-163, KM-54, bairro São José Operário, para realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes característica.

Endereço da obra: LOTEAMENTO RESIDENCIAL ATLÂNTICO II – Rodovia BR-163 Km – 54 - SÃO JOSÉ OPERÁRIO - CEP 85760-000, Capanema/PR.

Empresa contratada: M. BIGATON & CIA LTDA – ME. CNPJ: 07.517.372/0001-39

Empresa Contratante: Atlântico Incorporadora II LTDA - ME. CNPJ: 22.154.776/0001-07

Proprietário: Atlântico Incorporadora II LTDA - ME. CNPJ: 22.154.776/0001-07

ART nº 20173983415

Responsável técnico:

Engenheiro Civil João Pedro Markus, CREA-PR 144320/D.

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

243

ATLÂNTICO INCORPORADORA II LTDA – ME
AV. BRASIL, 863 – CENTRO
85760-000 – Capanema – PR
CNPJ: 22.154.776/0001-07

RELAÇÃO DE SERVIÇOS.

Pavimentação poliédrica com pedras irregulares (calçamento) 11.438,6m². (onze mil quatrocentos e trinta e oito metros e seis centímetros quadrados).

Execução de 1.480 metros lineares de meio fio em concreto. (mil quatrocentos e oitenta metros)

Execução de 1.655 metros lineares de galerias pluviais para drenagem das águas da chuva. (mil seiscentos e cinquenta e cinco metros).

Terraplenagem (movimentação de terra) num volume de 5.000m³ para nivelamento de vias e escavação de valas. (cinco mil metros cúbicos).

Período de execução: 15/09/2017 a 15/11/2017

Capanema, 16 de novembro 2017

22.154.776/0001-07
ATLÂNTICO INCORPORADORA II LTDA ME
Av. Brasil,863 - Centro
85760-000 - Capanema - PR

ATLÂNTICO INCORPORADORA II LTDA - ME
CNPJ: 22.154.776/0001-07

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 050553

244

Capanema, 27 de agosto de 2018.

ATESTADO DE VISITA

Atesto que a empresa M BIGATON & CIA LTDA-ME, Cnpj nº 07.517.372/0001-39, que o ENGENHEIRO CIVIL JOÃO PEDRO MARKUS CREA PR 144320/D, responsável técnico da referida empresa, visitou o local da obra **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDEO DO NORTE E AVENIDA ATAÍDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRSITÓVÃO EM CAPANEMA-PR, EM ANTENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017 – OPERAÇÃO 1041530-91 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBNO.**, no endereço específicas conforme consta no edital da referida tomada de preço 12/2018.

Atenciosamente,

Rubens Luis Rolando Souza
Eng° Civil Município de Capanema-PR

Engº. Rubens Luis Rolando Souza
CREA RS 88296/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO MUNICÍPIO

ANEXO 10
DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE

JOAO PEDRO MARKUS, CPF nº 062.118.869-77, CREA n° PR – 144320/D, declara que é conhecedor das condições constantes no Tomada de Preços nº 12/2018 e que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa M. BIGATON & CIA LTDA - ME, CNPJ nº 07.517.372/0001-39, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO

Capanema, 30 de Agosto de 2018.

JOÃO PEDRO MARKUS
RG 73448271/CPF 062.118.869-77
Engenheiro Civil

JOÃO PEDRO MARKUS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 144320/D
CPF: 062.118.869-77

M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Rua Aimorés, nº 1887, Centro, Capanema – PR

Fone: (46) 3552-1428

CNPJ nº **07.517.372/0001-39**

246

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 12/2018

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA nº	Data do registro	Assinatura do profissional
JOAO PEDRO MARKUS	ENGENHEIRO CIVIL	PR – 144320/D	19/02/2015	

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das Leis Trabalhistas vigentes.

Capanema, 30 de Agosto de 2018.

MARCOS CESAR BIGATON
RG 7.077.215-9/CPF 027.409.389-85
Sócio Administrador

07.517.372/0001-39
M. BIGATON & CIA. LTDA.
- ME
R. AIMORÉS, 1887 - CENTRO
85760-000 - CAPANEMA - PR

M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Rua Aimorés, nº 1887, Centro, Capanema – PR
Fone: (46) 3552-1428

CNPJ nº **07.517.372/0001-39**

11/12/17

ANEXO 12

DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Referência:

Município de Capanema - PR
Tomada de Preços N° 12/2018

M. BIGATON & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF n° 07.517.372/0001-39, por intermédio de seu representante legal, o Srº MARCOS CESAR BIGATON, portador do documento de identidade RG n° 7.077.215-9, emitido pela SSP/ PR, e do CPF nº 027.409.389-85, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no 8.7.5, alínea "g" do edital de licitação, que possui todos equipamentos mínimos e dispõe de pessoal técnico para a execução do objeto da licitação.

I. Caminhão basculante;

II. Rolo vibratório pra compactação;

III. Ferramentas manuais (carrinhos, pás, picaretas, enxadas, soquetes, martelos etc.);

IV. Mão-de-obra suficiente para a execução do contrato no prazo pactuado.

Analisando os compromissos e contratos de prestação de serviços vigentes na data da Sessão Pública, DECLARA também que os equipamentos acima e pessoal estão disponíveis para execução da obra objeto deste certame licitatório, não possuindo outros compromissos ou contratos que cumulativamente possam necessitar de tais equipamentos e pessoal, e consequentemente colocar em risco o cumprimento dos prazos de execução desta obra.

Capanema, 30 de Agosto de 2018.

MARCOS CESAR BIGATON
RG 7.077.215-9/CPF 027.409.389-85
Sócio Administrador

07.517.372/0001-39
M. BIGATON & CIA. LTDA.
- ME
R. AIMORÉS, 1887 - CENTRO
85760-000 - CAPANEMA - PR

ANEXO 13

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

TOMADA DE PREÇOS Nº: 12/2018

PROPONENTE:

MUNICÍPIO / LOCAL: RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AVENIDA ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA - PR.	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES,DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLANAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AVENIDA ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRITÓVÃO EM CAPANEMA, - PR, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017 – OPERAÇÃO 1041530 – 91 – PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.	ÁREA CONSTRUÍDA: 5.078,48 m²
LOTE: Lote 01, Empreitada Global	PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS		Prazo de Execução (dias)							
			30	60	90	120	150	180	210	240
1	CAMINHAO BASCULANTE	Utilização	02	02	02	02	02	02		
		Quantidade	04	04	04	04	04	04		
2	ROLO VIBRATÓRIO	Utilização	X	X	01	01	01	01		
		Quantidade	01	01	01	01	01	01		
3	FERRAMENTAS MANUAIS	Utilização	25	25	25	25	25	25		
		Quantidade	35	35	35	35	35	35		
4	MAO – DE - OBRA	Utilização	06	06	06	06	06	06		
		Quantidade	08	08	08	08	08	08		
5		Utilização								
		Quantidade								
6		Utilização								
		Quantidade								

M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Rua Aimorés, nº 1887, Centro, Capanema – PR

Fone: (46) 3552-1428

CNPJ nº **07.517.372/0001-39**

MARCOS CESAR BIGATON RG 7.077.215-9/CPF 027.409.389-85 SÓCIO ADMINISTRADOR	JOÃO PEDRO MARKUS RG 7.344.827-1/CPF 062.118.869-77 CREA – PR – 144320/D ENGENHEIRO CIVIL

07.517.372/0001-39
M. BIGATON & CIA. LTDA.
- ME
R. AIMORÉS, 1887 - CENTRO
85760-000 - CAPANEMA - PR

JOÃO PEDRO MARKUS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 144320/D
CPF: 062.118.869-77

Capanema, 30 de Agosto de 2018.

M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Rua Aimorés, nº 1887, Centro, Capanema – PR

Fone: (46) 3552-1428

CNPJ nº **07.517.372/0001-39**

04/250

ANEXO 05

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 12/2018

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Tomada de Preços nº 12/2018, instaurado pelo Município de Capanema-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como, que nossa empresa não possui menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Capanema, 30 de Agosto de 2018.

MARCOS CESAR BIGATON
RG 7.077.215-9/CPF 027.409.389-85
Sócio Administrador

07.517.372/0001-39

M. BIGATON & CIA. LTDA.
- ME

R. AIMORÉS, 1887 - CENTRO
85760-000 - CAPANEMA - PR

M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Rua Aimorés, nº 1887, Centro, Capanema – PR

Fone: (46) 3552-1428

CNPJ nº **07.517.372/0001-39**

Fls. 251

ANEXO 02

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Referência:

Município de Capanema - PR
Tomada de Preços nº 12/2018.

M. BIGATON & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF nº 07.517.372/0001-39, por intermédio de seu representante legal, o Srº MARCOS CESAR BIGATON, portador do documento de identidade RG nº 7.077.215-9, emitido pela SSP/ PR, e do CPF nº 027.409.389-85, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Capanema, 30 de Agosto de 2018.

MARCOS CESAR BIGATON
RG 7.077.215-9/CPF 027.409.389-85
Sócio Administrador

07.517.372/0001-39
M. BIGATON & CIA. LTDA.
- ME
R. AIMORÉS, 1887 - CENTRO
85760-000 - CAPANEMA - PR

ANEXO 07
DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO BDI

CAIXA

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Gestor / Programa / Ação / Modalidade	Município/UF
1041530-91	Ministério das Cidades / Planejamento Urbano	Capanema-PR

Proponente	Objeto	Empreendimento/Apelido
Prefeitura Municipal de Ca	Pavimentação Poliedrica com Pedras Irregulares em Vias Públicas Urbanas	Calçamentto Tamoios

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)

ITENS		*SIGLAS*	*VALORES*
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		AC	3,80%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO		S+G	0,32%
TAXA DE RISCO		R	0,50%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS		DF	1,02%
TAXA DE LUCRO		L	6,64%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	I	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
	ISS (legislação municipal)		3,00%
	CPRB (INSS)		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU			20,73%
BDI RESULTANTE			**26,85%**

FÓRMULA UTILIZADA: $$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 100,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 3,00%

Observações:

Rubens Luis Rolando Souza
Prof. Qual. Municipal Capanema-PR
CREA/RS 088296/D

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome: Rubens Luis Rolando Souza
CREA/CAU: RS 88.296/D
ART/RRT: 20171998970

Data: 19/07/2018

M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Rua Aimorés, nº 1887, Centro, Capanema – PR

Fone: (46) 3552-1428

CNPJ nº **07.517.372/0001-39**

14 / 253

ANEXO 11

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – MODELO

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa M. BIGATON & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.517.372/0001-39, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório Tomada de Preços nº 12/2018, realizado pelo Município de Capanema – PR.

Capanema, 30 de Agosto de 2018.

Tab. Notas Capanema - PR

MARCOS CESAR BIGATON
RG 7.077.215-9/CPF 027.409.389-85
Sócio Administrador

07.517.372/0001-39

M. BIGATON & CIA. LTDA.
- ME

R. AIMORÉS, 1887 - CENTRO
85760-000 - CAPANEMA - PR

TABELIONATO DE NOTAS - CAPANEMA - PR (46)3552.
Selo Digital: frsn2.2bIDY.XIRWH. Controle: Z5Leh.DXfNJ
Consulte este selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura indicada
MARCOS CESAR BIGATON. Dou fé. Capanema-PR, 30
agosto de 2018.
Em Test[illegible] da Verdade.
Daniela Ribeiro do Carmo - Escrevente

TABELIONATO DE NOTAS DE CAPANEMA - 85760-000 - CAPANEMA

M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Rua Aimorés, nº 1887, Centro, Capanema – PR
Fone: (46) 3552-1428

CNPJ nº **07.517.372/0001-39**

254

ANEXO 08

TERMO DE RENÚNCIA

À Comissão de Licitações

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 12/2018

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Tomada de Preços nº 12/2018, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

Capanema, 30 de Agosto de 2018.

MARCOS CÉSAR BIGATON
RG 7.077.215-9/CPF 027.409.389-85
Sócio Administrador

07.517.372/0001-39
M. BIGATON & CIA. LTDA.
- ME
R. AIMORÉS, 1887 - CENTRO
85760-000 - CAPANEMA - PR

fls. 255

PROPOSTAS DE PREÇO

A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

FONE: (46) 3552 - 1706

Avenida Brasil, nº 306, Sala 2 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000

CNPJ: 84.840.503/0001-65 INSC EST: 9033360050

Fl. 256

ANEXO 06

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

A.A. COLUSSI E CIA LTDA-ME
AV. BRASIL,306 SALA 2 TEL: (46) 3552-1706
CNPJ: 84.840.503/0001-65 IE: 90.333.600-50

Capanema – PR, 14 de agosto de 2018.

À Comissão de Licitações
Referente: Edital de Tomada de Preços nº 12/2018.
Prezados Senhores
Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO
O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de R$ 385.806,65 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), sendo R$ 77.161,33 (SETENTA E SETE MIL CENTO E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) referentes à mão-de-obra e R$ 308.645,32 (TREZENTOS E OITO MIL, SEICENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) referentes ao fornecimento do material.
O prazo de execução do objeto da licitação é de 180 dias, contados a partir do 10° dia após a assinatura do contrato.
O prazo de validade da proposta de preços é de 06 (SEIS) meses (no mínimo 06 (seis) meses, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.
Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.
Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

Iuri. F. M. Colussi
Engº Civil
CREA-PR163.950/D

ALDEMIR COLUSSI
RG: 2.004.536-1
SÓCIO PROPRIETÁRIO

84.840.503/0001-65
A.A COLUSSI & CIA LTDA
Rua Pedra Cinfo, 303
85760-000 Capanema
PR

IURI FELIPE MANICA COLUSSI
CREA Nº: 16395/D

257

EMPRESA: A. A. COLUSSI E CIA LTDA -ME
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL,306 - CENTRO CAPANEMA - P
CNPJ: 84.840.503/0001-65 I.E. : 90.333.600-50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES EM VIAS PUBLICAS
CALÇAMENTO: RUA TAMOIOS
EXTENSÃO: 846,41 M TOTAL: 5078,48,00 M2
DATA BASE SINAPI: 03/2017 (DESONERADO)
DATA : 28 DE AGOSTO 2018

BDI PADRÃO	26,85%
BDI DIFERENCIADO 1	4,71%
BDI DIFERENCIADO 2	
BDI ZERO	0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DD SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	R$ CUSTO UNITÁRIO	R$ UNITÁRIO COM BDI	R$ VALOR TOTAL COM BDI
							TOTAL	385.806,65
1.0			PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA					385.806,65
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.023,63
1.1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	322,78	409,45	1.023,63
1.2			TERRAPLANAGEM					69.008,87
1.2.1	SINAPI	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	6.418,34	0,45	0,57	3.658,45
1.2.2	SINAPI	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	1.837,75	6,64	8,42	15.473,86
1.2.3	Composição	5	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE 1A CATEGORIA 200-400	M3	4.718,69	4,49	5,69	26.849,35
1.2.4	SINAPI	41722	COMPACTAÇÃO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL- PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	4.718,69	3,85	4,88	23.027,21
1.3			DRENAGEM					135.474,75
1.3.1	SINAPI	83338	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	386,96	2,29	2,91	1.126,05
	SINAPI	94317	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	232,80	12,95	16,43	3.824,90
1.3.3	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO ARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	286,50	145,66	184,77	52.936,61
1.3.4	SINAPI	92214	TUBO DE CONCRETO ARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	182,00	217,80	276,28	50.282,96
1.3.5	SINAPI	92216	TUBO DE CONCRETO ARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	15,00	293,66	372,50	5.587,50
1.3.6	SINAPI	83690	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6 CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1,98	472,75	599,69	1.187,39
1.3.7	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10 CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UNIDADE	23,00	703,65	892,58	20.529,34
1.4			PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES					115.180,10
1.4.1	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTADA DE SUBLEITO ATÉ 20 CM ESPESSURA	M2	5.078,48	1,16	1,47	7.465,37
1.4.2	Composição	4	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTD POLIÉDRICO	M2	761,77	1,55	1,96	1.493,07
1.4.3	SINAPI	72979	EXTRAÇÃO, CARGA,PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZAÇAO PEDREIRA	M2	5.078,48	10,26	13,01	66.071,02
1.4.4	SINAPI	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA EM LEITD NATURAL (UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016	TXKM	7.963,06	0,80	1,01	8.042,69
1.4.5	Composição	3	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	M2	761,77	0,37	0,47	358,03
1.4.6	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADD, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	806,04	31,05	39,39	31.749,92
1.5			SINALIZAÇÃO VERTICAL					5.713,12
1.5.1	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UNIDADE	3,00	78,95	100,14	300,42
1.5.2	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIDA	M2	1,57	552,63	701,01	1.100,59
1.5.3	Composição	1	SUPORTE METALICO GALVANIZADO, D=2,5" COM ALETAS ANTI GIRO	UNIDADE	11,00	309,04	392,01	4.312,11
1.6			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					17.298,96
1.6.1	SINAPI	83338	ESCAVACAO MECANICA A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	44,89	2,29	2,91	130,63
1.6.2	SINAPI	94317	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	44,89	12,95	16,43	737,54
1.6.3	SINAPI	85389	REMOÇAO TUBULAÇAO FF C/ DN 400 A 600MM EXCLUINDO ESCAVACAO/REATERRO	M	56,11	78,73	99,87	5.603,71
1.6.4	SINAPI	92831	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIAMETRD DE 1500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	4,00	603,37	765,38	3.061,52
1.6.6		2	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO (BSTC) 1,50 M	UNIDADE	2,00	3.060,92	3.882,78	7.765,56
1.7			PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADAS					42.107,22
1.7.1	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.193,60	1,16	1,47	1.754,59
1.7.2	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	59,68	533,03	676,15	40.352,63
			TOTAL GERAL DA OBRA					385.806,65

OBSERVAÇÕES:

Declaro que os custos unitarios adotados atendem ao regime de contribuição previdenciaria, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Publica, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.

DATA:
30/08/2018

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:

Iuri Felipe M. Colussi

Iuri. F. M. Colussi
Engº Civil
CREA-PR163.950/D

EMPRESA:

84.840.503/0001-65

A.A COLUSSI & CIA LTDA

Rua Padre Cirilo, 303
85760-000 Capanema PR

EMPRESA: A. A. COLUSSI E CIA LTDA -ME
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL,306 - CENTRO CAPANEMA - PR
CNPJ: 84.840.503/0001-65 I.E. : 90.333.600-50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES EM VIAS PUBLICAS
CALÇAMENTO: RUA TAMOIOS
EXTENSÃO: 846,41 M TOTAL: 5078,48,00 M2
DATA BASE SINAPI: 03/2017 (DESONERADO)
DATA : 28 DE AGOSTO 2018

NÍVEL	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	PREÇO UNIT (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
META	1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
SERVIÇO	1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	2,50	409,45	1.023,63
META	2	DRENAGEM DN 60 ESCAVAÇÃO/REATERRO				
SERVIÇO	2.1	DN 60	M	286,50	195,01	55.870,30
META	3	DRENAGEM DN 80 ESCAVAÇÃO/REATERRO				
SERVIÇO	3.1	DN 80	M	182,00	286,52	52.146,67
META	4	ORENAGEM DN 100 ESCAVAÇÃO/REATERRO				
SERVIÇO	4.1	DN 100	M	15,00	382,74	5.741,12
META	5	BOCA LOBO/DISSIPADORES DE ENERGIA				
SERVIÇO	5.1	BOCA LOBO/DISSIPADORES DE ENERGIA	UNID	23,00	944,21	21.716,72
META	6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
SERVIÇO	6.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	UNID	1,00	17.298,96	17.298,96
META	7	TERRAPLANAGEM				
SERVIÇO	7.1	TERRAPLANAGEM	M2	6.418,34	10,75	69.008,87
META	8	PAVIMENTAÇÃD ENTRE RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ				
SERVIÇO	8.1	PAVIMENTAÇÃO ENTRE RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ	M2	1.817,90	22,68	41.229,97
META	9	PAVIMENTAÇÃO ENTRE CEARÁ/PIAUÍ				
SERVIÇO	9.1	PAVIMENTAÇÃO ENTRE CEARÁ/PIAUÍ	M2	1.939,09	22,68	43.978,63
META	10	PAVIMENTAÇÃO ENTRE PIAUÍ/ATAIDES ROBERTO ESCHER				
SERVIÇO	10.1	PAVIMENTAÇÃO ENTRE PIAUÍ/ATAIDES ROBERTO ESCHER	M2	1.321,49	22,68	29.971,44
META	11	CALÇADAS ENTRE RIO GRANDE DD NORTE/CEARÁ				
SERVIÇO	11.1	CALÇADAS ENTRE RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ	M2	489,21	29,31	14.340,17
META	12	CALÇADAS ENTRE CEARÁ/PIAUÍ				
SERVIÇO	12.1	CALÇADAS ENTRE CEARÁ/PIAUÍ	M2	655,43	23,60	15.468,07
META	13	CALÇADAS ENTRE PIAUÍ/ATAÍDES ESCHER				
SERVIÇO	13.1	CALÇADAS ENTRE PIAUÍ/ATAÍOES ESCHER	M2	195,22	63,00	12.298,98
META	14	SINALIZAÇÃO				
SERVIÇO	14.1	SINALIZAÇÃO	UNID	1,00	5.713,12	5.713,12

FRENTES DE OBRA	SERVIÇOS PRELIMINARES	DN 60	DN 80	DN 100	BOCA LOBO/DISSIPADORES DE ENERGIA	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	TERRAPLANAGEM	PAVIMENTAÇÃO RIO GRANDE DO SUL	PAVIMENTAÇÃO ENTRE CEARÁ/PIAUÍ	PAVIMENTAÇÃO ENTRE PIAUÍ/ATAIDES ROBERTO ESCHE	CALÇADA RIO GRANDE DO NORTE	CALÇADAS ENTRE CEARÁ/PIAUÍ	CALÇADAS ENTRE PIAUÍ/ATAÍDES ESCHER	SINALIZAÇÃO VERTICAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	2,50													
2 - DRENAGEM DN 60 ESCAVAÇÃO/REATERRO		286,50												
3 - ORENAGEM DN 80 ESCAVAÇÃO/REATERRO			182,00											
4 - DRENAGEM DN 100 ESCAVAÇÃO/REATERRO				15,00										
5 - DRENAGEM BOCAS DE LOBO/DISSIPADORES					23,00									
6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1,00								
7 - TERRAPLANAGEM							6.418,34							
8 - PAVIMENTAÇÃO ENTRE RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ								1.817,90						
9 - PAVIMENTAÇÃO ENTRE PIAUÍ/ATAÍDES ESCHER									1.939,09					
10 - PAVIMENTAÇÃO ENTRE PIAUÍ/ATAÍDES ESCHER										1.321,49				
11 - CALÇADAS ENTRE RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ											489,21			
12 - CALÇADAS ENTRE CEARÁ/PIAUÍ												655,43		
13 - CALÇADAS ENTRE PIAUÍ/ATAÍDES ESCHER													195,22	
14 - SINALIZAÇÃO														1,00

Iuri Felipe M. Colussi

Iuri. F. M. Colussi
Engº Civil
CREA-PR163.950/D

84.840.503/0001-65
A.A COLUSSI & CIA LTDA
Rua Padre Cirilo, 303
85760-000 Capanema PR

EMPRESA: A. A. COLUSSI E CIA LTDA -ME
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL,306 - CENTRO CAPANEMA -
CNPJ: 84.840.503/0001-65 I.E. : 90.333.600-S0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES EM VIAS PUBLICAS
CALÇAMENTO: RUA TAMOIOS
EXTENSÃO: 846,41 M TOTAL: 5078,48,00 M2
DATA BASE SINAPI: 03/2017 (DESONERADO)
DATA : 28 DE AGOSTO 2018

		SERVIÇOS PRELIMINARES	DN 60	DN 80	DN 100	BOCA LOBO/DISSIPADORES DE ENERGIA	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	TERRAPLANAGEM	PAVIMENTAÇÃO RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ	PAVIMENTAÇÃO ENTRE CEARÁ/PIAUÍ	PAVIMENTAÇÃO ENTRE PIAUÍ/ATAIDES ROBERTO ESCHER	CALÇADA RIO GRANDE DO NORTE	CALÇADAS ENTRE CEARÁ/PIAUÍ	CALÇADAS ENTRE PIAUÍ/ATAÍDES ESCHER	SINALIZAÇÃO VERTICAL
	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nº DO EVENTO	TÍTULOS DOS EVENTOS														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1													
2	DRENAGEM DN 60 ESCAVAÇÃO/REATERRO		1												
3	DRENAGEM DN 80 ESCAVAÇÃD/REATERRO			1											
4	DRENAGEM DN 100 ESCAVAÇÃO/REATERRO				2										
5	DRENAGEM BOCAS DE LOBO/DISSIPAÇÃO					2									
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						3								
7	TERRAPLANAGEM							1							
8	PAVIMENTAÇÃO ENTRE RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ								3						
9	PAVIMENTAÇÃO ENTRE CEARÁ/PIAUÍ									4					
10	PAVIMENTAÇÃO ENTRE PIAUÍ/ATAIDES ROBERTO ESCHER										5				
11	CALÇADAS ENTRE RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ											6			
12	CALÇADAS ENTRE CEARÁ/PIAUÍ												6		
13	CALÇADAS ENTRE PIAUÍ/ATAÍDES ESCHER													6	
14	SINALIZAÇÃO														6

CRONOGRAMA		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
PARCELA	%	46,15%	7,12%	15,17%	11,40%	7,77%	12,39%
	R$	178.049,47	27.457,84	58.528,93	43.978,63	29.971,44	47.820,34
ACUMULADO	%	46,15%	53,27%	68,44%	79,84%	87,61%	100%
	R$	178.049,47	205.507,31	264.036,24	308.014,87	337.986,31	385.806,65

Iuri Felipe M. Colussi
Iuri. F. M. Colussi
Engº Civil
CREA-PR163.950/D

84.840.503/0001-65
A.A COLUSSI & CIA LTDA
Rua Padre Cirilo, 303
85760-000 Capanema PR

A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

FONE: (46) 3552 - 1706

Avenida Brasil, nº 306, Sala 2 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000

CNPJ: 84.840.503/0001-65 INSC EST: 9033360050

ANEXO 07

DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO BDI

Tipo de obra: Pavimentação Poliédrica com pedras irregulares em vias Publicas Urbanas
(conforme Acórdão 2622/2013 – TCU)
Construção de Rodovias e Ferrovias (também para recapeamento, Pavimentação e Praças)

SIGLAS	ITEM COMPONENTE DO BDI		VALORES (%)
AC	TAXA DE RATEIO ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,80%
R	TAXA DE RISCOS		0,50%
S+G	TAXA DE SEGURO + GARANTIA DO EMPREENDIMENTO		0,32%
DF	TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS		1,02%
L	TAXA DE LUCRO		6,64%
I	TAXA DE TRIBUTOS	PIS	0,65%
		COFINS	3,00%
		ISS	3,00%
		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB (INSS)	4,50%

BDI % RESULTANTE=	26,85%

BDI conforme Acórdão 2622/2013 – TCU

FÓRMULA UTILIZADA: $BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$

Declaro que, conforme legislação tributaria municipal, a base de calculo do iss corresponde a 100,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 3,00%.

Iuri Felipe M. Colussi

Responsável técnico pela Elaboração do orçamento:

NOME: IURI FELIPE MANICA COLUSSI

CREA-PR Nº:163950/D

Iuri. F. M. Colussi
Engº Civil
CREA-PR163.950/D

84.840.503/0001-65

A.A COLUSSI & CIA LTDA

Rua Padre Cirilo, 303
85760-000 Capanema PR

Município de Capanema - 2018

Classificação por Fornecedor

Tomada de preços 12/2018

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 1724-8 A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME	CNPJ: 84.840.503/0001-65 Telefone: (46) 3552 - 1102 Status: Classificado							385.806,65	
Email: esc.saggin4@hotmail.com									
Lote 001 - Lote 001								385.806,65	
001	54108 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM	UN	1,00	Classificado	A.A.COLUSSI & CIA LTDA		385.806,65	385.806,65	*
	PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR								

VALOR TOTAL: 385.806,65

Município de Capanema - PR

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA, E JULGAMENTO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº: 12/2018

Aos trinta e um dias de agosto de 2018, às nove horas e vinte minutos , no MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com endereço a Av. Pedro Viriato Parigot de Souza nº 1080, centro, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Municipalidade, designada pela Portaria nº 6905, de 30/11/2017, constituída pelos Srs. , ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI, ROSELI STROZAK MARCON e VALDECI ALVES DOS SANTOS, com o objetivo de julgar a Licitação Pública, sob a modalidade Tomada de preços, veiculado através do nº 012, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. A Comissão atestou o comparecimento da empresa, A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME, representada pelo Sr. Aldo Alfredo Colussi, M. BIGATON & CIA LTDA - ME, representada pelo Sr. Marcos Cesar Bigaton. Inicialmente a Comissão de Licitação, de acordo com o Edital, deu-se a abertura do envelope nº 01, contendo a documentação das proponentes, a qual foi conferida e rubricada pela Comissão. Examinada a documentação, a Comissão julgou habilitada as empresas. A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME e M.BIGATON & CIA LTDA ME. As proponentes nada arguiram e firmaram Termo de Renúncia ao direito de impugna-los, razão pela qual foi encerrada a fase de habilitação e dado prosseguimento à sessão. Abertos os envelope Nº 02, contendo as propostsa de preços das proponentes habilitadas, foi a mesma conferida e rubricada pela Comissão. De acordo com o Edital, a Comissão de Licitação chegou a seguinte classificação Por item:

A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR	A.A.COLUSSI & CIA LTDA	UN	1,00	385.806,65	385.806,65
TOTAL							385.806,65

Tendo em vista que a intimação do ato de julgamento das propostas nos termos do Art. 110 da Lei 8.666/93, o prazo recursal previsto no Art. 109, I, alínea, não houve manifestação de interesse em interpor recurso. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e assinada a presente Ata pela Comissão de Licitação.

ROSELI STROZACK MARCOM
Membro
779.895.549-68

ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI
Presidente
632.258.249-68

VALDECI ALVES DOS SANTOS
Membro
499.450.256-00

A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

M. BIGATON & CIA LTDA - ME

ANEXO 06
CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

M. BIGATON & CIA LTDA – ME, inscrita no CNPJ n° 07.517.372/0001-39,
sito a Rua Aimores, n° 1887, Centro, Capanema, Paraná.
Capanema, 30 de Agosto de 2018.
À Comissão de Licitações
Referente: Edital de Tomada de Preços nº 12/2018.
Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de R$ 386.765,87 (trezentos e oitenta e seis mil e setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), sendo R$ 154.706,35 (cento e cinquenta e quatro mil e setecentos e seis reais e trinta e cinco centavos) referentes à mão-de-obra e R$ 232.059,52 (duzentos e trinta e dois mil e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) referentes ao fornecimento do material.

O prazo de execução do objeto da licitação é de 6 (seis) meses, contados a partir do 10° dia após a assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de preços é de 12 (doze) meses (no mínimo 06 (seis) meses, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

07.517.372/0001-39
M. BIGATON & CIA. LTDA.
- ME
R. AIMORÉS, 1887 - CENTRO
85760-000 - CAPANEMA - PR

MARCOS CESAR BIGATON
RG 7.077.215-9/CPF 027.409.389-85
Sócio Administrador

M. BIGATON & CIA LTDA - ME
CAPANEMA/PR
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES EM VIAS PÚBLICAS, COMPREENDIDO NA RUA TAMIOS ENTRE RUA RIO GRANDE DO NORTE E ATAÍDE ROBERTO ESCHER.

RESUMO DOS QUANTITATIVOS

Item	Descriminação	Unid	Quantidade	R$ UNITARIO	R$ TOTAL
1	**PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA**				**386.765,87**
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1.1	Placa de Obra em chapa de aco Galvanizado	m2	2,50	410,77	1.026,93
					1.026,93
1.2	**TERRAPLENAGEM**				
1.2.1	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	6.418,34	0,57	3.658,45
1.2.2	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	1.837,75	8,45	15.528,99
1.2.3	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE CATEGORIA 200-400	m³	4.718,69	5,71	26.943,72
1.2.4	COMPACTAÇÃO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	m³	4.718,69	4,85	22.885,65
					69.016,81
1.3	**DRENAGEM**				
1.3.1	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M³.	M³	386,96	2,92	1.129,92
1.3.2	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DE CAÇAMBA DA RETRO: 0.26M³/POTÊNCIA: 88HP), LARGURA ATÉ 0,8M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.	M³	232,80	16,48	3.836,54
1.3.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	286,50	185,37	53.108,51
1.3.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRD DE 800MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	182,00	277,17	50.444,94
1.3.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 1000MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	15,00	373,70	5.605,50
1.3.6	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL. MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA.	M³	1,98	601,61	1.191,19
1.3.7	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	Unid	23,00	895,45	20.595,35
					135.911,95
1.4	**PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES**				
1.4.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESSURA	M²	5.078,48	1,47	7.465,37
1.4.2	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M²	761,77	1,97	1.500,69
1.4.3	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAD PEDREIRA.	M²	5.078,48	13,05	66.274,16
1.4.4	TRANSPORTECOM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³. EM VIA URBANNA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TONXKM).	TXKM	7.963,06	1,01	8.042,69
1.4.5	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICO	M²	761,77	0,47	358,03
1.4.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS	M	806,04	39,51	31.846,64
					115.487,58
1.5	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**				
1.5.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	Unid	3,00	100,47	301,41
1.5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAMA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M²	1,57	703,26	1.104,12
1.5.3	SUPERTE METÁLICO GALVANIZADO D=2,5* COM ALETAS ANTI GIRO	Unid	11,00	393,27	4.325,97
					5.731,50
1.6	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				
1.6.1	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA,CAPACIDADE 0,78M³	M³	44,89	2,92	131,08
1.6.2	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DE CAÇAMBA DA RETRO: 0.26M³/POTÊNCIA: 88HP), LARGURA ATÉ 0,8M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.	M³	44,89	16,48	739,79
1.6.3	REMOCAO DE TUBULACAO FF C/ DN 400 A 600MM EXCLUINDO ESCAVACAO/ATERRO	M	56,11	100,19	5.621,66
1.6.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	4,00	767,84	3.071,36
1.6.5	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO (BSTC) 1,50M.	Unid	2,00	3.895,25	7.790,50
					17.354,39
1.7	**PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADAS**				
1.7.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M²	1.193,60	1,47	1.754,59
1.7.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M³	59,68	678,32	40.482,14
					42.236,73
	TOTAL GERAL DA OBRA				**386.765,87**

MARCOS CESAR BIGATON
RG: 7.077.215-9

07.517.372/0001-39
M. BIGATON & CIA. LTDA. - ME
R. AIMORÉS, 1887 - CENTRO
85760-000 - CAPANEMA - PR

ENG. CIVIL JOÃO PEDRO MARKUS
RG: 7.344.827-1
CREA-PR: 144320/D

JOÃO PEDRO MARKUS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 144320/D
CPF: 062.118.869-77

M. BIGATON & CIA LTDA - ME
CAPANEMA/PR

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES EM VIAS PÚBLICAS, COMPREENDIDO NA RUA TAMIOS ENTRE RUA RIO GRANDE DO NORTE E ATAÍDE ROBERTO ESCHER.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item	Descriminação	R$ Totel	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	TDTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.026,93	100,00% **1.026,93**						
2	DN 60- ecavação resterro	56.051,41	100,00% **56.051,41**						
3	DN 80 - escavação resterro	52.314,42	100,00% **52.314,42**						
4	DN 100 - eecavação reatsrro	5.759,58		100,00% **5.759,58**					
5	BOCAS DE LOBO/DISSIPADORES	21.786,54		100,00% **21.786,54**					
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	17.354,39			100,00% **17.354,39**				
7	TERRAPLENAGEM	69.016,81	100,00% **69.016,81**						
8	PAV. ENTRE RIO GRANDE DO NORTE E CEARÁ	41.340,10			100,00% **41.340,10**				
9	PAV. ENTRE CEARÁ E PIAUÍ	44.096,03				100,00% **44.096,03**			
10	PAV. ENTRE PIAUÍ E ATAÍDES ROBERTO ESCHER	30.051,45					100,00% **30.051,45**		
11	CALÇADAS E RAMPAS ENTRE R. GRANDE NORTE/CEARÁ	14.384,28						100,00% **14.384,28**	
12	CALÇADAS E RAMPAS ENTRE CEARÁ E PIAUÍ	15.515,65						100,00% **15.515,65**	
13	CALÇADAS E RAMPAS ENTRE CEARÁ E PIAUÍ	12.336,80						100,00% **12.336,80**	
14	SINALIZAÇÃO	5.731,50						100,00% **5.731,50**	
TOTAL		**386.765,87**	**178.409,57**	**27.546,12**	**58.694,49**	**44.096,03**	**30.051,45**	**47.968,23**	**386.765,87**

MARCOS CESAR BIGATON
RG:7.077.215-9

ENG. CIVIL JOÃO PEDRO MARKUS
RG: 7.344.827-1
CREA-PR: 144320/D

JOÃO PEDRO MARKUS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 144320/D
CPF: 062.118.869-7

CNPJ 81.317.372/0001-39
M. BIGATON & CIA. LTDA. - ME
R. AMORES, 1997 - CENTRO
85760-000 - CAPANEMA - PR

PROPONENTE: M. BIGATON & CIA LTDA - ME
MUNICIPIO: CAPANEMA - PARANÁ
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES EM VIAS PÚBLICAS
LOCALIDADE: RUA TAMOIOS ENTRE RIO GRANDE DO NORTE E ATAÍDE ESCHER

ITENS				SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL				AC	3,80%
TAXA DE SEGURO E GARANTA DO EMPREENDIMENTO				S+G	0,32%
TAXA DE RISCO				R	0,50%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS				DF	1,02%
TAXA DE LUCRO				L	6,64%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)			I	0,65%
	cofins (geralmente 3,00%)				3,00%
	ISS (legislação municipal)				3,00%
	CPRB (INSS)				4,50%
BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 - TCU					20,73%
BDI RESULTANTE					**26,85%**

ENGENHEIRO CIVIL JOÃO PEDRO MARKUS
CREA-PR: 144320/D

JOÃO PEDRO MARKUS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 144320/D
CPF: 062.118.869-77

PORTARIA N° 7.181, DE 31 DE AGOSTO DE 2018.

Termo de Homologação e Ato Adjudicatório Tomada de Preços n° 12/2018.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, **Considerando** que o procedimento licitatório está de acordo com a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43;

RESOLVE:

Art. 1° Homologar o Edital de Licitação modalidade Tomada de Preços n° ***12***/2018 e Adjudico, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU N° 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.

Art. 2° Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério menor preço por item;

VENCEDORES						
Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME	1	1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR	A.A.COLUSSI & CIA LTDA	1,00	385.806,65

Art. 3° Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Tomada de Preços N° 12/2018, é de R$ 385.806,65 (Trezentos e Oitenta e Cinco Mil, Oitocentos e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

Art. 4° Homologo a presente licitação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná aos trinta e um dias de agosto de 2018

Amérieo Bellé
Prefeito Municipal

CONTRATO Nº 329/2018
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execução de Obra, sem vínculo empregatício, de um lado o **MUNICÍPIO DE CAPANEMA**, com sede e Prefeitura à Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **AMÉRICO BELLÉ.** De outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 84.840.503/0001-65, com endereço a Rua AVENIDA BRASIL, 306 SALA 2 CXPST 21 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, na cidade de Capanema/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a) ALDEMIR COLUSSI inscrito no CPF nº524.947.489-68, residente e domiciliado em RUA PADRE CIRILO, S/Nº - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, doravante denominada CONTRATADA, vêm firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, obedecidas às condições estabelecidas na licitação realizada na modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº** 12/2018, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

1. CLÁUSULA **PRIMEIRA** - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.**, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos referentes à licitação Tomada de Preços 12/2018.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de **Tomada de Preços Nº 12/2018,** juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

2. CLÁUSULA **SEGUNDA** - DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O preço global para a execução do objeto deste contrato é de R$ **385.806,65 Trezentos e Oitenta e Cinco Mil, Oitocentos e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos)**.

2.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.1.2. O valor global deste contrato não será reajustado, salvo nas hipóteses previstas em lei.

3. CLÁUSULA **TERCEIRA** - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

DOTAÇÕES					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2018	1350	08.002.15.451.1501.1151	000	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
2018	1355	08.002.15.451.1501.1151	870	4.4.90.51.00.00	Do Exercício

3.2. Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício subsequente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

4. CLÁUSULA **QUARTA** - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

4.1. As obras serão executadas nos locais e na forma descritos no projeto básico dos empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificações que acompanham o edital.

4.2. O prazo para a conclusão da obra é de no máximo **6 (seis) meses**,

4.2.1. O prazo de execução dos serviços terá início **10° (décimo) dia a partir da Ordem de Início da Obra, concedida nos termos da Cláusula Quarta, do Contrato de Repasse nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO e deverá respeitar o cronograma físico-financeiro previsto no projeto básico.**

4.3. Os serviços deverão ser iniciados no máximo até o 10° (décimo) dia **a partir da Ordem de Início da Obra, concedida nos termos da Cláusula Quarta, do Contrato de Repasse nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO e deverá respeitar o cronograma físico-financeiro previsto no projeto básico.**

4.4. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no Projeto Básico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.5. Somente será admitida alteração do prazo quando:

a) houver alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;

b) houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos do CONTRATANTE;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execução;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusão da obra devido à hipótese de suspensão da execução, nos termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como decorrentes de força maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

5. CLÁUSULA **QUINTA** - DA VIGÊNCIA

5.1. O prazo de vigência do Contrato será de **12 (doze) meses**, contados a partir da data da assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigência previsto no item acima terá início na data de .31/08/2018. e encerramento em 30/08/2019.

5.3. O prazo de vigência de contrato é maior do que o prazo para a execução da obra devido à necessidade de realizar medições, pagamentos e prestação de contas, entre outros procedimentos.

5.4. Na hipótese de necessidade de aditivo de prorrogação contratual, será discriminado o novo prazo de vigência do contrato e o novo prazo para execução da obra.

6. CLÁUSULA **SEXTA** - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mão-de-obra, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços e demais atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. **Elaborar e disponibilizar à CONTRATANTE os projetos executivos** desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução da obra, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada deverá apresentar ao Departamento de Engenharia do Município, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, um cronograma de dimensionamento de mão-de-obra, isto é, relação nominal de todo o pessoal técnico que irá executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma físico da obra.

6.1.2.2. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Básico (memorial descritivo), apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos;

6.1.2.3. O projeto executivo deverá ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a partir da assinatura do contrato.

6.1.2.4. A não elaboração do projeto executivo pela empresa contratada ensejará a aplicação das multas previstas neste edital, bem como, na hipótese de haver necessidade de aditivos contratuais por inconsistências encontradas entre o projeto básico e a execução da obra, verificadas após o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao "risco", da composição do BDI apresentado pela empresa, será descontado do valor final de um possível aditivo.

6.1.3. Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496, de 1977;

6.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Projeto Básico, nos termo do artigo 111 da Lei nº 8.666, de 1993;

6.1.4.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra;

6.1.5. Assegurar à CONTRATANTE:

6.1.5.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

6.1.5.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

6.1.6. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, no prazo determinado.

6.1.7. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

6.1.8. Atentar, em relação ao material, para todas as disposições e especificações constantes no Projeto Básico.

6.1.9. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

6.1.10. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento da obra, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação da obra em relação ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execução da obra, para possibilitar a sua fiscalização.

6.1.11. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste instrumento e as especificações constantes no projeto básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção,

pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.12. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA.

6.1.13. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

6.1.14. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

6.1.15. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos documentos relativos à execução da reforma.

6.1.16. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

6.1.17. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

6.1.18. Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigações inerentes à execução dos serviços ora contratados.

6.1.19. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

6.1.20. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e telefônicas.

6.1.21. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra.

6.1.22. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachás, com fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's;

6.1.23. Manter sediado junto à Administração, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

6.1.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Administração;

6.1.25. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração;

6.1.26. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

6.1.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços, fora das suas especificações;

6.1.28. Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

6.1.29. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do patrimônio público;

6.1.30. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Projeto Básico ou neste contrato;

6.1.31. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a sua habilitação e qualificação no certame licitatório;

6.1.32. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados utilizados na execução dos serviços.

6.1.33. Fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos para a execução da obra;

6.1.34. Examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de serviços para uma proposta de preços completa e satisfatória;

6.1.35. Providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS.

7. CLÁUSULA **SÉTIMA** - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato e demais documentos da licitação;

7.1.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei n° 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em interrupção na execução do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato;

7.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

7.1.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

7.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das normas ambientais vigentes;

7.1.9. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Básico e seus anexos;

7.1.10. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8. CLÁUSULA **OITAVA** - DAS VEDAÇÕES

8.1. É vedado à CONTRATADA:

8.1.1. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, bem como a associação do contratado com outrem, bem como a cessão ou transferência, total ou parcial, de qualquer encargo, obrigação ou direito relativo ao objeto desta licitação.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

8.1.3. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

9. CLÁUSULA **NONA** - DO PAGAMENTO E DAS MEDIÇÕES

9.1. O prazo e a forma do pagamento estão previstos no item 21 do edital.

9.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada, inspecionada e aprovada pela fiscalização.

9.2.1.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

9.2.1.2. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitação antecipada do valor respectivo.

9.2.2. A CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados.

9.2.2.1. No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

9.2.2.2. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

9.2.3. Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

9.3. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

9.3.1. O "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente executados.

9.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos, havendo desconformidade na execução dos serviços identificada pelo Departamento de Engenharia ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

9.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

9.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

$$I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso.

10. CLÁUSULA **DÉCIMA** - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1. O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

10.2. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

10.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (*sessenta*) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) obra(s) será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas, e somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11. CLÁUSULA **DÉCIMA PRIMEIRA** - DA FISCALIZAÇÃO

11.1. A fiscalização se dará conforme o item 20 do edital.

12. CLÁUSULA **DÉCIMA SEGUNDA** - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE

12.1. Qualquer modificação que se faça necessária durante o andamento das obras/serviços, seja nos projetos, detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a critério do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizará por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras/serviços para melhor adequação técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alterações posteriores.

12.2. Caso venha a ser necessário nas obras/serviços contratada a realização de serviços adicionais não previstos originalmente, o novo custo global será definido com base nos preços unitários constantes da Tabela de Preços Unitários vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada pelos órgãos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condições da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3. No caso de acréscimo de serviços, a Ordem de Serviço Correspondente somente será expedida após a formalização do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido às formalidades legais.

12.4. Em caso de prorrogação contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu causa à prorrogação, fica ajustado que a correção dos valores será pelo índice INPC/IBGE.

12.5. O aditivo de prorrogação da execução da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o cronograma físico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execução, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

12.6. Todos os fatos que ensejam a suspensão ou paralisação da obra devem necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual será juntada ao processo licitatório.

13. CLÁUSULA **DÉCIMA TERCEIRA** - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. As penalidades cabíveis estão pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital.

14. CLÁUSULA **DÉCIMA QUINTA** - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

14.1. Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios.

14.2. Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que eles devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade.

14.3. Em nenhuma hipótese será admitido emprego de servidores públicos municipais bem como equipamentos, veículos e máquinas públicas na execução da presente obra, sob pena de rescisão contratual e apuração quanto à improbidade administrativa de agentes públicos.

15. CLÁUSULA **DÉCIMA SEXTA** - DA SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual – EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs.

15.2. O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA.

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

15.4. Deverão ser observadas pela contratada todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n° 3.214, de 08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77.

15.5. O CONTRATANTE estará autorizado a interditar serviços ou parte destes em caso do não-cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução da obra.

15.6. Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente(s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

16. CLÁUSULA **DÉCIMA SÉTIMA** - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato.

16.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

16.3. A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.

16.4. A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

16.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil, especialmente a denunciação da lide, se for o caso.

16.6. A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

16.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum título.

17. CLÁUSULA **DÉCIMA OITAVA** - MEDIDAS ACAUTELADORAS

17.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784/99, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

18. CLÁUSULA **DÉCIMA NONA** - DA RESCISÃO CONTRATUAL

18.1. Os motivos para a rescisão do presente Contrato estão pormenorizados no item 24 do edital.

18.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

18.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

18.4. Quando a rescisão ocorrer com base nas alíneas "m" a "q" do item 23.1, do edital, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

18.5. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução dos valores das multas e indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

19. CLÁUSULA **VIGÉSIMA** - DOS CASOS OMISSOS

19.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/90, na Lei Complementar nº 123/06, e na Lei nº 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

20. CLÁUSULA **VIGÉSIMA**- DA PUBLICAÇÃO

20.1. A publicação resumida do instrumento de contrato no Diário Oficial do Município será providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

21. CLÁUSULA **VIGÉSIMA SEGUNDA** - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

21.1. A troca eventual de documentos e correspondências entre o **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** será feita através de protocolo, nos termos do item 28.6 do edital.

22. CLÁUSULA **VIGÉSIMA SEGUNDA** - DO FORO

22.1. As questões decorrentes da utilização do presente Instrumento que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, Comarca de Capanema - PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Capanema, 31 de agosto de 2018.

Amérieo Bellé
PREFEITO MUNICIPAL

A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME
Detentora da Ata (NOME)
ALDEMIR COLUSSI
Representante Legal

EXPEDIENTE

ORGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA
AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005,
LEI MUNICIPAL Nº 1.648/2018

COORDENAÇÃO/DIREÇÃO: Valdeci Alves dos Santos - Secretaria de Administração

DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO: Anderson Ferreira dos Passos
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Anderson Ferreira dos Passos
DRT Nº 9975/PR

APOIO TÉCNICO: Pedro Augusto Santana

PREFEITURA DE CAPANEMA
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000
Fone: 46 3552-1321
E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br / adm@capanema.pr.gov.br
Capanema - Paraná
Prefeito Municipal: Américo Bellé
Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer
Secretário de Administração: Valdeci Alves dos Santos
Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski
Secretária de Educação, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz
Secretária da Família e Desenvolvimento Social: Sandra Pagno
Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti
Secretário de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso
Secretário de Saúde: Jonas Welter
Secretário de Viação, Obras e Urbanismo: Clésio Novick
Chefe de Gabinete: Paulo de Souza

Controladora Geral do Município: Arieli Caciara Wons

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA
R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000
Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329
Fax: (46) 3552-3217
E-mail: capanemacamara@gmail.com
Capanema - Paraná
Vereador: Airton Marcelo Barth - Presidente
Vereador: Valdomiro Brizola - Vice-Presidente
Vereadora: Izolete Ap. Walker - 1ª Secretária
Vereador: Edson Wilmsen - 2º Secretário
Vereador: Delmar C. Balzan
Vereador: Ginésio J. Pinheiro
Vereador: Gilmar Pontin
Vereador: Paulo C. Lothermann
Vereador: Sergio Ullrich

ATOS LICITATÓRIOS

PORTARIA N° 7.181, DE 31 DE AGOSTO DE 2018.

Termo de Homologação e Ato Adjudicatório Tomada de Preços nº 12/2018.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43;

RESOLVE:
Art. 1º Homologar o Edital de Licitação modalidade Tomada de Preços nº 12/2018 e Adjudico, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.
Art. 2º Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério menor preço por item;
VENCEDORES

Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME	1	1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR	A.A.COLUSSI & CIA LTDA	1,00	385.806,65

Art. 3º Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Tomada de Preços Nº 12/2018, é de R$ 385.806,65 (Trezentos e Oitenta e Cinco Mil, Oitocentos e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos).
Art. 4º Homologo a presente licitação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná aos trinta e um dias de agosto de 2018

Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO N° 329/2018
Tomada de preços Nº 012/2018
Data da Assinatura: 31/08/2018.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO..
Valor total: R$385.806,65 (Trezentos e Oitenta e Cinco Mil, Oitocentos e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 7.179, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

Concede Licença Especial a servidora efetiva Elizete Maria Keil Becker.

O Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e:

CONSIDERANDO o requerimento, protocolizado na Prefeitura Municipal sob nº 2.292/2018;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 74-C, da Lei Municipal nº 877/2001, alterada pela Lei Complementar nº 004/2012, de 09 de abril de 2012;

EXPEDIENTE

ORGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA
AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005,
LEI MUNICIPAL Nº 1.648/2018

COORDENAÇÃO/DIREÇÃO: Valdeci Alves dos Santos - Secretaria de Administração

DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO: Anderson Ferreira dos Passos
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Anderson Ferreira dos Passos
DRT Nº 9975/PR

APOIO TÉCNICO: Pedro Augusto Santana

PREFEITURA DE CAPANEMA
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000
Fone: 46 3552-1321
E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br / adm@capanema.pr.gov.br
Capanema - Paraná
Prefeito Municipal: Américo Bellé
Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer
Secretário de Administração: Valdeci Alves dos Santos
Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski
Secretária de Educação, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz
Secretária da Família e Desenvolvimento Social: Sandra Pagno
Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti
Secretário de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso
Secretário de Saúde: Jonas Welter
Secretário de Viação, Obras e Urbanismo: Clésio Novick
Chefe de Gabinete: Paulo de Souza

Controladora Geral do Município: Arieli Caciara Wons

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA
R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000
Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329
Fax: (46) 3552-3217
E-mail: capanemacamara@gmail.com
Capanema - Paraná
Vereador: Airton Marcelo Barth - Presidente
Vereador: Valdomiro Brizola - Vice-Presidente
Vereadora: Izolete Ap. Walker - 1ª Secretária
Vereador: Edson Wilmsen - 2º Secretário
Vereador: Delmar C. Balzan
Vereador: Ginésio J. Pinheiro
Vereador: Gilmar Pontin
Vereador: Paulo C. Lothermann
Vereador: Sergio Ullrich

OUTRAS PUBLICAÇÕES

ERRATA

Na edição 0106 deste Diário Oficial, de 03 de setembro de 2018, no cabeçalho das páginas 2 e 3, observando a grafia das datas da publicação, faz-se as seguintes correções:

ONDE LÊ-SE
SEGUNDA-FEIRA, 31 DE SETEMBRO DE 2018

LEIA-SE
SEGUNDA-FEIRA, 03 DE SETEMBO DE 2018

Os demais itens permanecem inalterados.

CONVOCAÇÃO

Américo Bellé, Prefeito Municipal de Capanema, no uso de suas atribuições, considerando o Despacho Inaugural da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Capanema-PR de 29 de agosto de 2018, de indicação do Dr. Nielson Norberto de Azeredo, Promotor de Justiça, Convoca: os secretários municipais de Educação, de Saúde e Assistência Social com todos os participantes da Rede de Proteção da Criança e do adolescente, para capacitação sobre o papel da Rede de Proteção nas suas atribuições e responsabilidades, na Casa da Cultura dia 28 de setembro das 8h30 às 17 horas.

Capanema, 31 de agosto de 2018.

Américo Bellé
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 04

A Secretaria de Saúde do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, segundo o disposto nas Leis Municipais: Lei nº 1.608/2017, de 13 de março de 2017, Lei nº 1.637/2018, de 28 de fevereiro de 2018, visando a contratação de servidores públicos, em Regime Celetista para suprir demanda temporária, excepcional e eventual do Município, convoca os candidatos abaixo relacionados, para tomar posse junto ao Departamento de Recursos Humanos, no prazo de 10 (dez) dias. O não comparecimento no prazo estipulado implicará na perda dos direitos sobre a vaga em questão:

ODONTÓLOGO

Classif	Nome do Candidato
1º	Julli Ana Roso Gerber

ASSISTENTE SOCIAL

Classif	Nome do Candidato
1º	Josefina Hettwer

Capanema, 03 de setembro de 2018.

Jonas Welter
Secretário de Saúde

Município de Capanema - PR

PORTARIA Nº 7.181, DE 31 DE AGOSTO DE 2018.

Termo de Homologação e Ato Adjudicatório Tomada de Preços nº 12/2018.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, **Considerando** que o procedimento licitatório está de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43;

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o Edital de Licitação modalidade Tomada de Preços nº 12/2018 e Adjudico, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.

Art. 2º Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando a vencedora pelo critério menor preço por item;

VENCEDORES						
Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME	1	1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR	A.A COLUSSI & CIA LTDA	1.00	385.806,65

Art. 3º Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Tomada de Preços Nº 12/2018, é de R$ 385.806,65 (Trezentos e Oitenta e Cinco Mil, Oitocentos e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

Art. 4º Homologo a presente licitação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná aos trinta e um dias de agosto de 2018

Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 329/2018
Tomada de preços Nº 012/2018

Data da Assinatura: 31/08/2018.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO..
Valor total: R$385.806,65 (Trezentos e Oitenta e Cinco Mil, Oitocentos e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Município de Capanema - PR
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte

CONVOCAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação vem através deste, fazer a convocação para escolha de vagas remanescentes relativa ao ano de 2018.

O convocado deverá comparecer na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Padre Cirilo, 1589, dia 03/09/2018 às 8horas 30minutos, conforme classificação a seguir:

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
LISTAGEM AMPLA CONCORRÊNCIA

Classificação	Nome candidato	RG
53.	CLEONICE MARIA HENZ MULLER	4.098.968-4
54.	NOELI ZANON ISEPP	6.566.711-5

Capanema, 31 de agosto de 2018

Zaida Teresinha Parabocz
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Município de Capanema - PR

PORTARIA Nº 7.179, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

Concede Licença Especial a servidora efetiva Elizete Maria Keil Becker.

O Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e:

CONSIDERANDO o requerimento, protocolizado na Prefeitura Municipal sob nº 2.292/2018;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 74-C, da Lei Municipal nº 877/2001, alterada pela Lei Complementar nº 004/2012, de 09 de abril de 2012;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder 03 (três) meses de Licença Especial a servidora efetiva Elizete Maria Keil Becker, ocupante de cargo de Agente Comunitária de Saúde, matrícula nº 2.275-1, nomeada pelo Decreto nº 4.870/2011, referente ao período aquisitivo 2012 a 2017, a ser usufruída no período de 01/09/2018 a 01/12/2018, com todos as direitos e vantagens de carga.

Art. 2º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município Capanema, Estado do Paraná, aos 30 dias do mês de agosto de 2018.

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Município de Capanema - PR

PORTARIA Nº 7.180, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

Redistribuição de Servidora Pública Efetiva.

Considerando o disposto no artigo 41, da Lei Municipal nº 877/2001 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Capanema;

Considerando a PERÍCIA MÉDICA – Validação do Atestado, realizada pela Clínica PROSAÚDE – Medicina do Trabalho / Perícia Médica, que concluiu pelo afastamento temporário do trabalho de elevação de peso e/ou flexão de coluna vertebral;

RESOLVE:

Art. 1º Redistribuir a servidora Nelsa Passani, ocupante do cargo de Atendente de Creche, matrícula nº 2.050-1, prevista na Lei Municipal nº 1.280/2010 e alterações posteriores, para a Escola Municipal Raciel de Queiroz, na função de auxiliar de Professor pelo período de 90 dias, do dia 31/08/2018 a 28/11/2018.

Art. 2º a presente Portaria entra em vigor na data da publicação.

Capanema, Estado do Paraná, aos 30 dias do mês de agosto de 2018.

Valdeci Alves dos Santos
Secretário de Administração

Município de Capanema - PR

PORTARIA Nº 7.177, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

Concede Licença Maternidade a servidora pública Ilizete Lurdes Watte Fagionato.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder 120 (cento e vinte) dias de Licença Maternidade, a partir do dia 28 de agosto de 2018 a 25 de dezembro 2018, a Atendente de Creche Ilizete Lurdes Watte Fagionato, matrícula 2.081-1.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 28 de agosto de 2018.

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 30 dias do mês de agosto de 2018.

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Município de Capanema - PR

PORTARIA Nº 7.176 DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

Dispensa Servidor lotado na Função Gratificada de Chefe de Serviço Gerais.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 39, inciso I, da Lei Municipal nº 877/2001.

RESOLVE:

Art. 1º Dispensar o servidor Juliano Bertani da Função Gratificada de Chefe de Serviços Gerais, símbolo CT – F3, prevista no Anexo I, da Lei Municipal nº 1.280/2010, alterada pela Lei 1.575, de 17 de dezembro de 2015.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 01 de agosto de 2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná, aos 30 dias do mês de agosto de 2018.

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Município de Capanema - PR

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2018

Ratifico em todos os seus termos e reconheço a **Dispensa de Licitação** para o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA CRIAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER DEMANA DE CADASTRO PARA VAGAS EM CMEIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA , conforme parecer Jurídico fundamentado no Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93.

Art. 24. É dispensável a licitação:
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

VALOR TOTAL: **R$** 7.760,00(Sete Mil, Setecentos e Sessenta Reais)

Capanema - PR, 30 de agosto de 2018

Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 328/2018
Processo dispensa Nº 033/2018
Data da Assinatura: 30/08/2018.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: PREVISEME SOFTWARE E TRATAMENTO DE DADOS LTDA.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA CRIAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER DEMANA DE CADASTRO PARA VAGAS EM CMEIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA
Valor total: R$7.760,00 (Sete Mil, Setecentos e Sessenta Reais)
Américo Bellé
Prefeito Municipal

284

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS

ART Nº 20171998970
Vínculo empregatício com empresa pública e/ou órgão público
ART Principal

Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA (CPF:513.358.830-53) — Nº Carteira: RS-88296/D
Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO. — Nº Visto Crea: 13967
Empresa contratada: — Nº Registro:
Contratante: MUNICIPIO DE CAPANEMA — CPF/CNPJ: 75.972.760/0001-60
Endereço:AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA 1080 CENTRO
CEP: 85760000 CAPANEMA PR Fone:
Local da Obra/Serviço: RUA TAMOIOS S/N — Quadra:S/N — Lote:S/N
SÃO CRISTÓVÃO - CAPANEMA PR — CEP: 85760000

Tipo de Contrato	5	VINCULO EMPREGATÍCIO
Ativ. Técnica	19	PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
Área de Comp.	1102	OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS
Tipo Obra/Serv	045	**ARRUAMENTO**
Serviços contratados	017	PROJETO DE TERRAPLENAGEM
	018	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
	019	PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE
	130	OUTROS
	169	FISCALIZAÇÃO (OBRAS PÚBLICAS/OBRAS PRÓP)
Guia N	301	VINCULO EMPREGATÍCIO COM ÓRGÃO PÚBLICO
ART Nº 20171998970		

Dimensão: 5078,48 M2
Dados Compl.: 0
Data Início: 12/05/2017
Data Conclusão: 31/12/2017
Base de cálculo: TABELA TAXA MÍNIMA — Vlr Taxa: R$ 81,53 — Entidade de Classe: 402

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc
PROJETO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL, CALÇADAS, ORÇAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E FISCALIZAÇÃO REFERENTE A PROPOSTA DO SICONV Nº 18271/2017 MINISTÉRIO DAS CIDADES A SEREM EXECUTADOS NA RUA TAMOIOS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA-PR

Insp.: 4650
11/05/2017
CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante — Américo Belle Prefeito Municipal

Assinatura do Profissional — Rubens Luis Rolando Souza Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR Matrícula n.º 1943-1 CREA-RS 88.296/D

2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se à apresentação nos órgãos de administração pública, cartórios e outros.
Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067
A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) foi instituída pela Lei Federal 6496/77, e sua aplicação está regulamentada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolução 1025/09.

UZA

10490.81290 43010.200244 01719.989707 4 71870000008153

o	Vencimento	Valor do documento
010002017199897-0	11/06/2017	R$ 81,53

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

132-893356112-7

12/MAI/2017 HORA DF 14:07:37

LOT. 14.03410-2 TERM 044736
LOCALIDADE: CAPANEMA
AG. VINCULADA: 1256

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO CAIXA

CÓDIGO DO CEDENTE: 81294
NOSSO NÚMERO: 0
DATA DE VENCIMENTO: 11JUN2017
VALOR DO PAGAMENTO: 81,53

1049081290 43010200244
01719989707 4 71870000008153

132-893356112-7

VIA DO CLIENTE

Município de Capanema - PR

Ofício nº 248/2018

À Caixa Econômica Federal
REGOV Cascavel/PR

Capanema, 10 de Setembro de 2018

Assunto: Encaminhamento de documentos referentes à Licitação na modalidade **Tomada de Preços nº 12/2018,** que originou o 329/2018 com a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA-ME, do Município de Capanema-PR, o qual firmou o Contrato de Repasse nº 856605-2017 MINISTÉRIO DAS CIDADES.

Senhora Gerente,

1. Informamos que o regime de execução será por Administração Indireta, para execução da(s) meta(s) NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91-PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO

.

2. Para atendimento aos dispositivos legais, encaminhamos a seguinte documentação:

a) Publicação do resumo do edital	X Sim	Não	Não se aplica
b) Homologação e adjudicação	X Sim	Não	Não se aplica
c) Justificativa de dispensa de processo licitatório (se for o caso), com embasamento legal e a respectiva publicação	Sim	Não	X Não se aplica
d) Planilha orçamentária proposta pela empresa vencedora	X Sim	Não	Não se aplica
e) Cronograma físico-financeiro proposto pela empresa vencedora	X Sim	Não	Não se aplica
f) Contrato de Execução e/ou Fornecimento (CTEF) ou outro instrumento hábil: carta-contrato, nota de empenho de despesas, autorização de compra ou ordem de execução de serviço, com a publicação do respectivo extrato.	X Sim	Não	Não se aplica
g) planilha de composição do BDI da empresa executora, conforme Acórdão do TCU, de acordo com as faixas de admissibilidade exigidas.	X Sim	Não	Não se aplica
h) Extrato do CTEF publicado	X Sim	Não	Não se aplica
i) Ordem de serviço e/ou fornecimento	Sim	X Não	Não se aplica
j) ART/RRT de Execução por parte da empresa contratada, com comprovante de recolhimento;	Sim	X Não	Não se aplica

k) ART/RRT de Fiscalização por parte da Prefeitura com comprovante de recolhimento;	X Sim	Não	Não se aplica
l) Declaração emitida pelo contratado de Atendimento à Lei de Licitações afirmando que a licitação ou o processo de dispensa atendeu a todos os dispositivos constantes na legislação em vigor, em especial à Lei 8.666/93 e suas alterações inclusive quanto à forma de publicação (modelo CAIXA)	X Sim	Não	Não se aplica
m) Declaração emitida pelo contratado, atestando que a empresa vencedora da licitação não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento as normas vigentes, em especial a IN STN nº. 01/97, de 15/01/1997, e Portaria Interministerial 507/2011 (modelo CAIXA);	X Sim	Não	Não se aplica
n) Declaração de atendimento ao Decreto nº 7.983/2013 (modelo CAIXA)	Sim	X Não	Não se aplica
o) Declaração de atendimento ao Decreto nº 7.888/2013 (apenas para Termos de Compromisso PAC Mobilidade Urbana)	Sim	X Não	Não se aplica

3. Declaro, sob as penas da Lei, que os documentos ora encaminhados apresentam-se em conformidade com o disposto normativo e legal.

4. Diante do exposto, solicitamos autorização para o início da obra de EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA-PR, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.

.

Atenciosamente.

Américo Bellé
Prefeito Municipal
CPF 240.595.879-15

Declaração de Atendimento ao Processo Licitatório – Transferência Voluntária, Cogente ou Renúncia de Receita

DECLARAÇÃO

Capanema, 10 de setembro de 2018

Declaro sob as penas da Lei que a licitação Tomada de Preços nº 12/2018, com edital publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Capanema na data de 03/08/2018, no Diário Oficial da União na data de 06/08/2018 e Jornal o Trombeta na data de 10/08/2018 cuja empresa vencedora foi A.A. COLUSSI & CIA LTDA-ME, para EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, no âmbito do Contrato de Repasse nº 856605/2017 , firmado com o Município de Capanema, atendeu a todos os dispositivos constantes na legislação em vigor, em especial à Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e sua regulamentação, inclusive quanto à forma de publicação.

Américo Bellé
Prefeito Municipal
CPF 240.595.879-15

288

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, em atendimento as normas vigentes, em especial a IN STN nº. 01/97, de 15/01/1997, e suas alterações e Portaria Interministerial 507/2011 que a empresa vencedora da licitação para execução do objeto do contrato de Repasse nº **856605/2017** não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Capanema, 10 de setembro de 2018

Américo Bellé
Prefeito Municipal
CPF 240.595.879-15

CAIXA

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Representação Executiva Negocial de Governo Cascavel
Rua Souza Naves, 3891 – Bairro Centro
85.810-070 – Cascavel - PR

Ofício nº 3626 / 2018 / REGOV/CV

Cascavel, 22 de Novembro de 2018

A Sua Excelência o Senhor
Américo Bellé
Prefeito Municipal
Município de Capanema

Assunto: Crédito de recurso - Autoriza Início Obra
Ref.: CR 856605/2017/MCIDADES/CAIXA
Objeto: Pavimentação com Pedras Irregulares em Vias Públicas Urbanas
Vigência: 21/10/2021
Conta corrente: 1256.006.00647240-5
Prazo envio de medição: entre o dia 01 e 07 de cada mês

Senhor Prefeito Municipal,

1. Tendo em vista o crédito de recurso em 13/11/2018 o Convenente está autorizado a iniciar a obra, conforme valores aprovados:
Valor de Repasse R$ 245.850,00
Valor de contrapartida R$ 139.956,65
Valor de investimento R$ 385.806,65

2. Para solicitação da 1ª inspeção técnica/desembolso deverá ser atendidos as pendências:

- Apresentar outorga para utilização de recursos hídricos referente à destinação da drenagem pluvial.
- Apresentar prorrogação da validade ou nova DLAE, visto que a DLAE nº 16786 teve sua validade expirada em 28/08/2018.

3. Conforme cláusula do contrato de repasse é motivo para rescisão do instrumento a inexistência de execução financeira após 180 dias da liberação da primeira parcela, portanto esse Município deve observar as providências necessárias para que **a 1ª OBTV pagamento ao fornecedor esteja concluído no SICONV até 12/05/2018.**

4. De acordo com a Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 424/2016, Art. 66º, para Contrato de Repasse nível I (Obras e serviços de engenharia com valor de Repasse de R$

CAIXA

243.750,00 a R$ 749.999,99) e nível IV (para execução de custeio ou aquisição de equipamentos com valores de repasse de R$ 97.500,00 a R$ 749.999,99), formalizados com data posterior 02/01/2017, é vedada a repactuação de metas e etapas, portanto o saldo remanescente será objeto de devolução após conclusão do objeto contratado.

5. Para a solicitação de autorização de saque o Convenente apresentar os documentos relacionados a seguir, observando o período de envio entre o dia 01 e 07 de cada mês:

Documento	Quantidade de vias	Quando apresentar
Ofício de Solicitação de Recursos assinado pelo Senhor Prefeito Municipal ou Representante Legal	02	Todas as solicitações de autorização de saque
BM - Boletim de Medição ou PLE - Planilha de Levantamento de Eventos devidamente atestado pelo Engenheiro fiscal do convenente sob assinatura e carimbo	01	Todas as solicitações de autorização de saque
RRE - Relatório Resumo do Empreendimento, conforme QCI, devendo ser anexado no SICONV – aba anexos da execução	02	Todas as solicitações de autorização de saque - via física e anexar ao SICONV aba Anexos
ART/RRT do(s) responsável pela Execução	01	1ª autorização de saque
Ordem de Serviço ou documento equivalente, emitido pelo Contratado m ou outra forma de autorização de início definida no CTEF	02	1ª autorização de saque

6. A Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 424/2016 prevê o procedimento simplificado para obras com valor de repasse inferior a R$ 750.000,00 com inspeções técnicas, mediante visita aos locais de intervenção, quando verificado nos documentos de pedido de inspeção pelo município a execução física acumulada de 50% e 100%.

6.1 Na execução de obras e serviços de engenharia, a liberação dos recursos fica condicionada à apresentação pelo convenente dos boletins de medição com valor superior a 10% do piso mínimo dos níveis previstos na portaria.

6.2 De acordo com Art. 57 da referida Portaria no caso de quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica, o convenente será comunicado quanto a suspensão da liberação dos recursos, e do prazo de até 45 dias para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos e caso de não atendimento será registrado inadimplência no SICONV e iniciado processo de instauração de Tomada de Contas Especial TCE.

7. Referente à vistoria de ateste de medição, a atividade de fiscalização realizada pelo Agente Promotor/Executor não deve ser confundida com a atividade de acompanhamento de obra exercida pelo engenheiro/arquiteto da CAIXA, pois este profissional é responsável, exclusivamente, pela conferência por ocasião da vistoria, da realização das etapas de obras indicadas na **medição fornecida pelo proponente.**

CAIXA

7.1 O objetivo da visita técnica é verificar a situação da obra, observar a evolução física, e assegurar a correta aplicação dos recursos financeiros para o cumprimento do Contrato de Repasse, não conferindo à CAIXA, ou aos profissionais de engenharia e arquitetura que dela participam, a responsabilidade pela qualidade de execução dos serviços.

8. A placa de obra deverá estar afixada na obra com identificação do Programa, de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, sendo obrigatória a sua manutenção durante o período de execução da obra, (conforme modelo fornecido pela CAIXA no link http://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-manual-visual-placas-adesivos-obras/Manual_PlacadeObras.pdf.

8.1 A placa deve ser afixada pelo Contratado em local visível, mantida em bom estado de conservação durante todo o período de execução do objeto, e deve ser substituída ou recuperada pelo Contratado, quando verificado o seu desgaste ou precariedade.

9. A conta corrente 1256.006.00647240-5, Agência Capanema do Paraná, destina-se, exclusivamente, às movimentações financeiras dos recursos pertinentes, Repasse e contrapartida, ao Contrato de Repasse vinculado e quando autorizada pela CAIXA.

9.1 O recurso creditado é aplicado automaticamente em fundos e atendendo à IN STN 001/1997 e Portaria Interministerial caso o prazo previsto de uso/desbloqueio seja superior a 30 dias deverá ser comandada a aplicação, via SICONV, em caderneta de poupança.

10. Para Contrato de Repasse inserido no SICONV o Convenente deve observar as orientações listadas abaixo para autorização de desbloqueio, comunicando a CAIXA tão logo concluídas:

- Aporte do valor da contrapartida prevista para a parcela;
- Classificação do recurso no Portal de Convênios;
- Incluir documento de liquidação e valores de acordo com a parcela ou total atestado, contendo verificação de autenticidade e identificação da pessoa responsável pela conferência, e devidos registros quanto ao número do contrato e nome do programa e no caso de equipamentos, observar orientações quadro acima;
- Notas fiscais com retenção de tributos realizados por OBTV Tributos, anexar cópia da(s) respectiva(s) guia(s);
- Preencher relatório de Documentos de Liquidação Incluídos e enviar para análise, comunicando o envio.

10.1 No caso de DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) obrigatoriamente deve também conter a informação: "*Atesto a verificação das formalidades da NF-e, descritas no Portal Nacional da NF-e (http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/), ou no sítio da Secretaria da Fazenda do Estado ou Município de origem da mercadoria*", podendo ser por carimbo ou manuscrita, sob assinatura e carimbo do responsável do município.

10.2 Caso não conste no DANFE o registro do contrato de repasse/programa, o Contratado deverá obrigatoriamente efetuar o registro por meio de Carta de Correção Eletrônica –

CAIXA

CC-e, também disponível no Portal Nacional da NF-e (http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/) e anexar ao SICONV, juntamente com a Nota fiscal.

11. Os documentos relativos ao Contrato de Repasse devem ser mantidos arquivados em pasta própria e em boa ordem no próprio local de contabilização, à disposição dos órgãos de controle interno e externo.

12. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

Respeitosamente,

PAULO AUGUSTO SCHADE
Coordenador de Filial
Representação da Gerência Executiva e Negocial de Governo Cascavel/PR

FÁBIO DANTAS CASSALI
Gerente de Filial Substituto Eventual
Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/PR

Município de Capanema - PR
Secretaria de Planejamento e Gestão de Projetos

Capanema, 23 de novembro de 2018

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO
CONTRATO Nº329/2018

Prezado Diretor,

Com relação a obra para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO NORTE E AVENIDA ATAÍDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA-PR EM ATEMDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 856605/2017 OPERAÇÃO 1041530-91 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO,** conforme projetos especificados no processo licitatório Tomada de Preços nº 12/2018 no município de Capanema, expedimos o presente ofício como **ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS CONTRATADOS**, com validade a partir da data do recebimento deste.

Os elementos técnicos necessários à execução da obra estão de posse da empreiteira.

Atenciosamente,

Rubens Luis Rolando Souza
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA RS 88.296/D

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Ao
Diretor
AA COLUSSI & CIA LTDA-ME
De Acordo, em 23/11/18

114 294

NOTIFICAÇÃO


A Empresa
AA COLUSSI & CIA LTDA -ME
CNPJ Nº 84.840.503/0001-65


Com relação ao contrato Administrativo nº 329/2018 cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO NORTE E AVENIDA ATAÍDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA-PR EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 856605/2017 OPERAÇÃO 1041530-91 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, oriundo do certame licitatório Tomada de preços 12/2018, no que tange a obra paralisada segue o seguinte.

Foi assinado a ordem de Início dos Serviços em 28 de novembro de 2018 com a empresa começando os serviços de drenagem e terraplenagem ainda em dezembro de 2018.


Na qualidade de fiscal de contrato em vistoria no local da intervenção constatou se que a obra está paralisada desde dezembro de 2018, como é demonstrado pelas fotos na sequência.

Cabe observar que o prazo de execução vence em 11 de março de 2019, já a vigência vencerá em 30 de agosto de 2019.

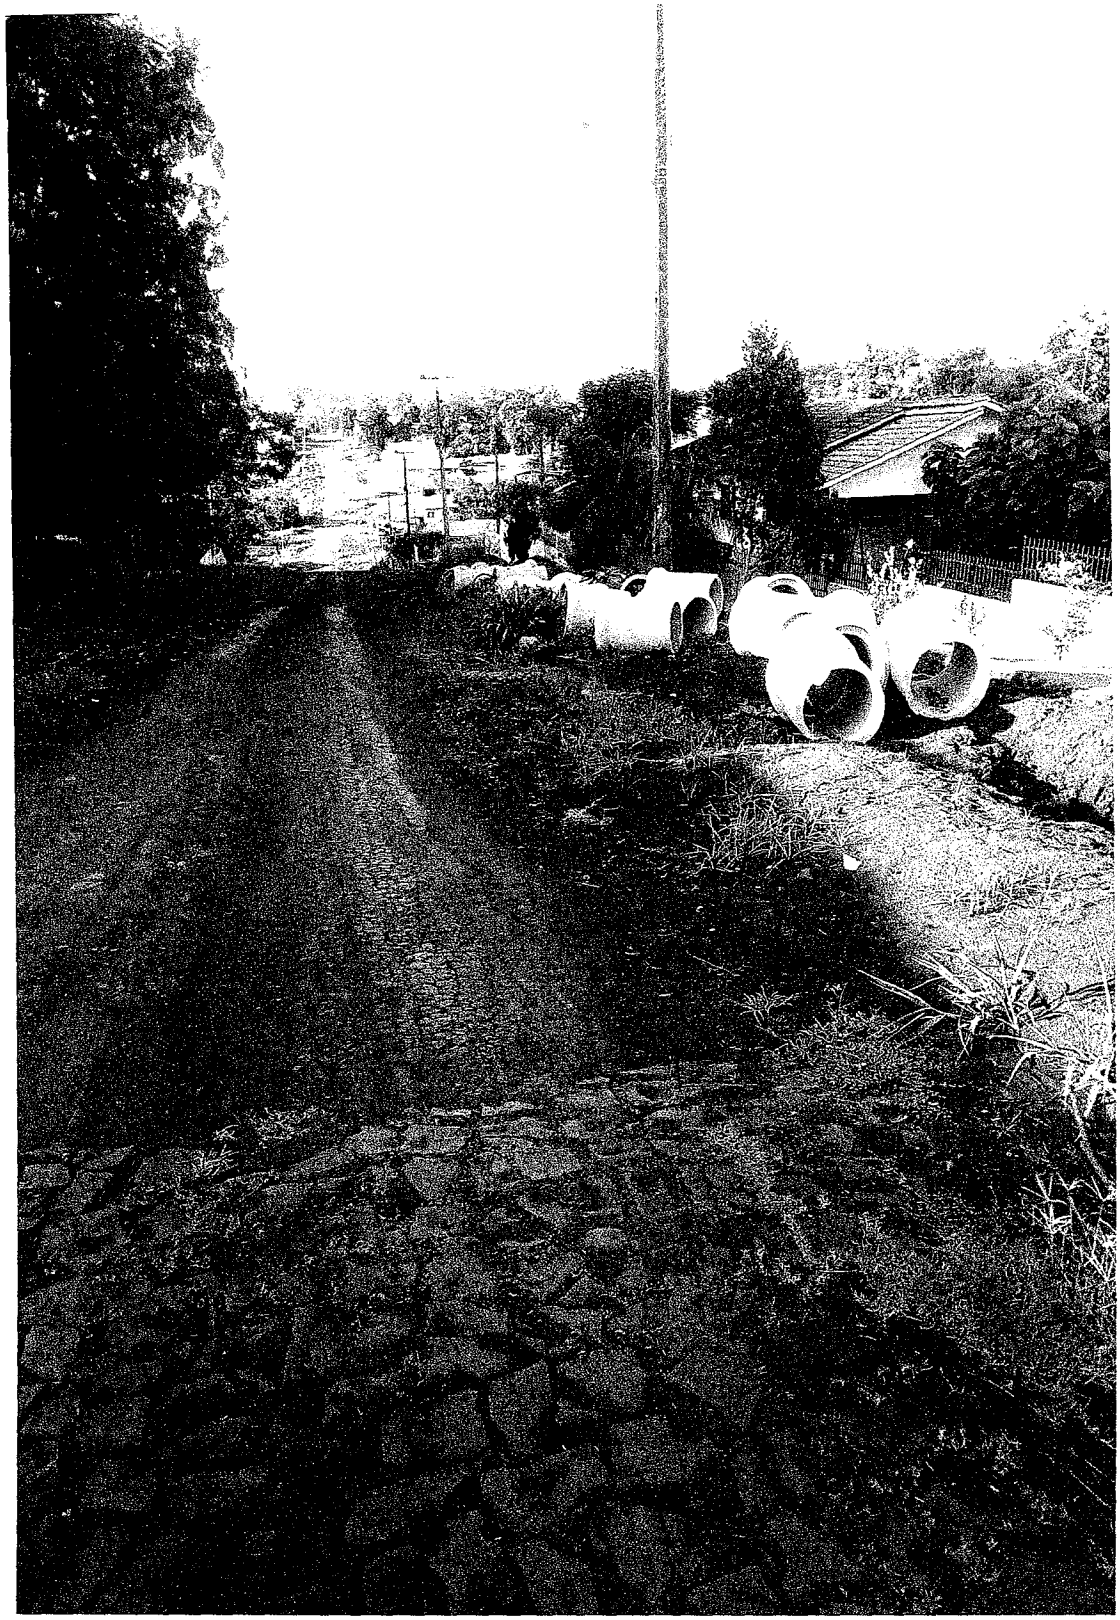

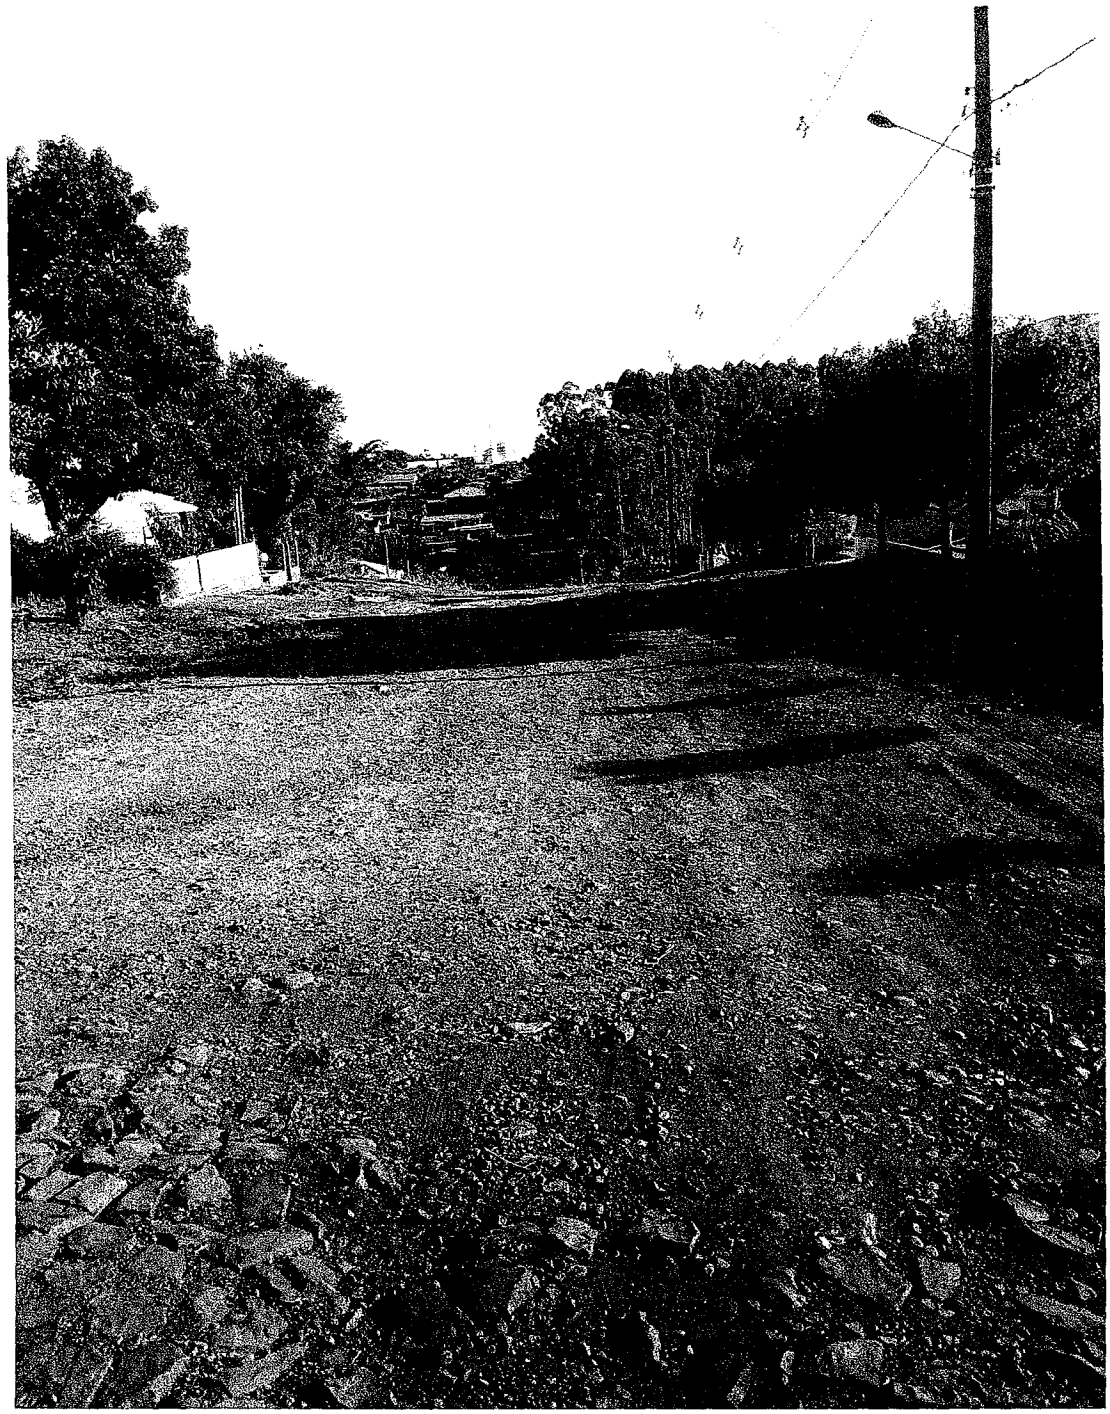

Município de Capanema – PR
Departamento de Engenharia

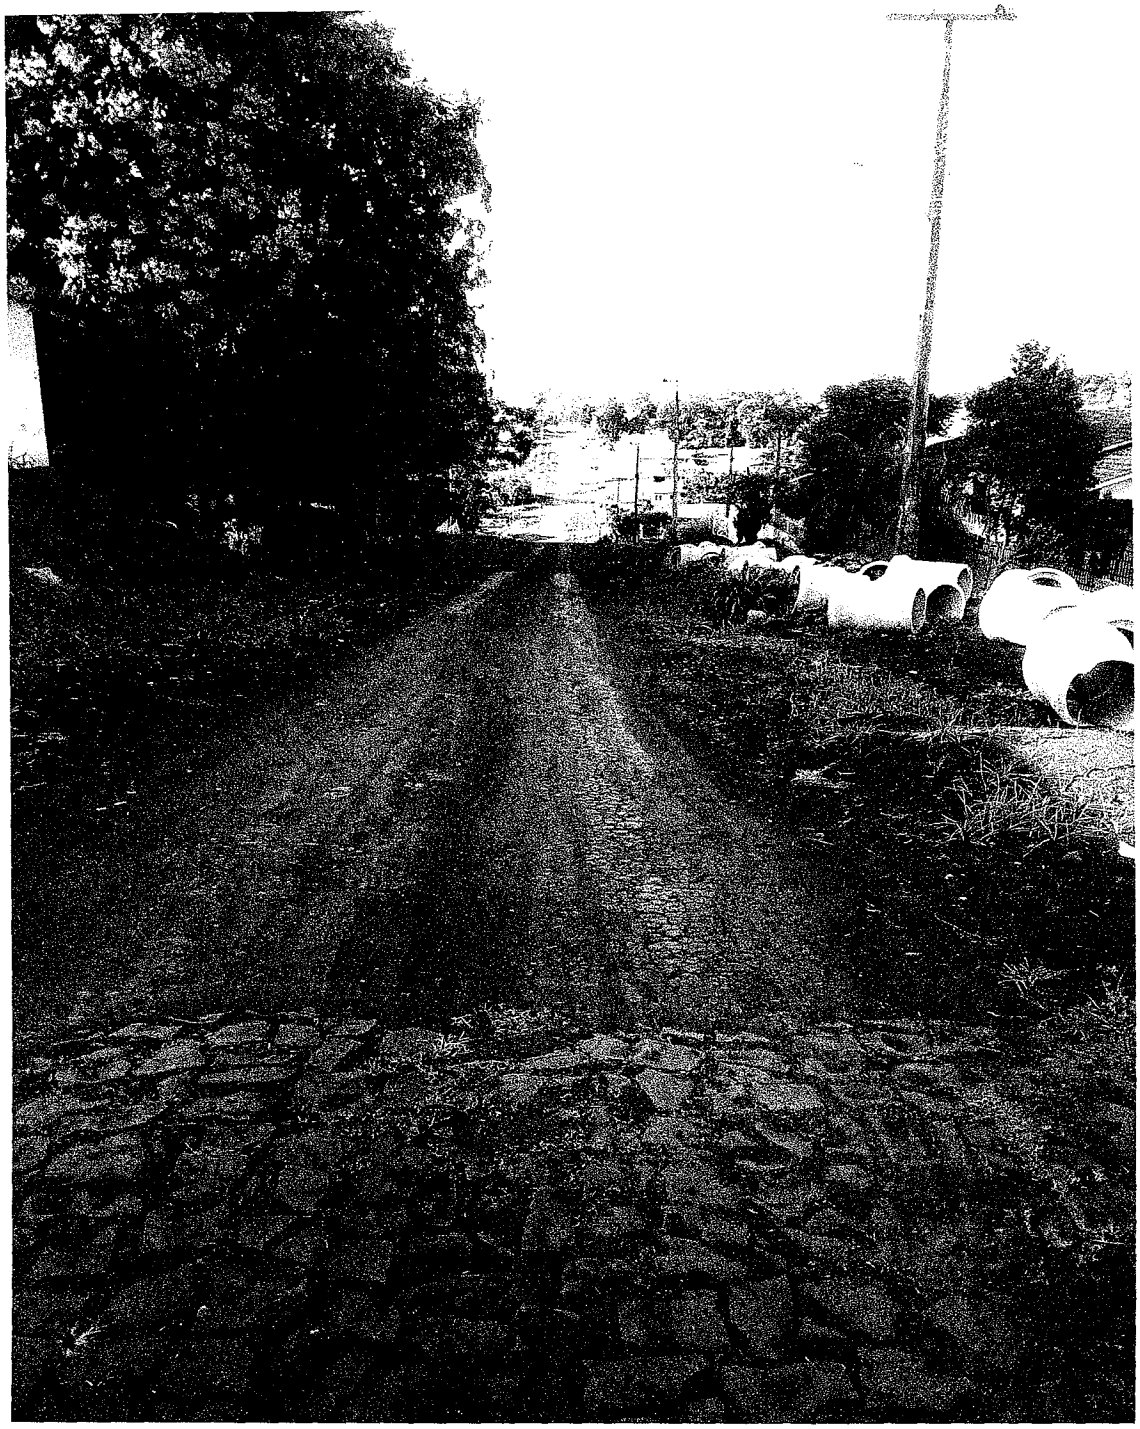

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone:46-3552-1321 – Fax:46-3552-1122
rubensengenharia@capanema.pr.gov.br

A obra está paralisada sem nenhuma justificativa a essa fiscalização, como os prazos ainda estão vigentes, conforme explicitado acima, utilizando desse instrumento NOTIFICO A EMPRESA AA COLUSSI & CIA LTDA-ME, CNPJ Nº 84.840.503/0001-65 QUE JUSTIFIQUE A SUA PARALIZAÇÃO E RETORNE OS TRABALHOS SOB PENA DE NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATO EM QUESTÃO.

Capanema, 31 de janeiro de 2019

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 88.296/D

A.A. Colussi & Cia Ltda.
Terraplenagem, Aterros e Transportes
Inscr. Estadual 90333600-50 CNPJ 84.840.503/0001-65

Comissão permanente

De Abertura e julgamento de Licitações

Referente à: Prorrogação do prazo de vigência e execução da tomada de preço 12/2018 contrato 329/2018.

Prezados senhores,

Vimos pela presente solicitar a vosso senhoria prorrogação no prazo de vigência e execução da obra objeto do contrato acima referenciado contrato de empresa especializada para a execução de pavimentação poliédrica com pedras irregular , drenagem pluvial e terraplenagem , na Rua Tamoios, entre as Ruas Rio Grande do Norte e Avenida Ataídes Roberto Escher, no Bairro São Cristóvão, Capanema-Pr. Em atendimento ao contrato de Repasse n°856605/2017 Operação 1041530-91 programa Planejamento Urbano. Assim sendo dimensionamos 4(quatro) meses a partir do vencimento.

A- No decorrer da execução ,apareceram patologias na obra,as quais não havia possibilidades de serem previstas, tais como:

- Redes coletoras de esgoto e água potável em desconformidade com o projeto;

- Terrenos com muros irregulares adentrando as calçadas;

- Valas para a tubulação com muitas pedras e rochas;

Assim sendo, necessitamos de um prazo maior, para primeiro executar as correções.

B- Neste período de execução, a empresa tinha como programação , férias coletivas aos funcionários , isso também prejudicou o andamento da obra.

C- Lembrando que a ordem de serviço, foi expedida próximo ao final do ano de 2018, período de férias de nossos fornecedores e colaboradores.

Ao exposto ,colhemos a oportunidade em externar a vossas senhorias, protesto de distinta consideração.

Capanema,11 de Março de 2019.

A.A. COLUSSI E CIALTDA

ALDEMIR COLUSSI

Processo: 463/2019
Data: 11/03/2019 Hora: 02:51
Assunto:
SOLICITACAO DO SETOR DE LICITACA
Requerente:
AA COLUSSI CIA LTDA ME

Município de Capanema - PR

DESPACHO

Com relação a Tomada de Preços nº 12/2018, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017-OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. Encaminho esse PA ao Engenheiro Civil para análise e emissão de Parecer Técnico a respeito do pedido de Aditivo de prazo de vigência e execução.

Capanema, 11 de março de 2019

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira/ Presidente da Comissão Permanente de
Abertura e Julgamento de Licitações

Município de Capanema – PR
Secretaria de Planejamento e Projetos

PARECER TÉCNICO Nº 06/2019

Com relação ao contrato Administrativo nº 329/2018 cujo objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES DRENEGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AVENIDA ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÁO EM CAPANEMA PR EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017 OPERAÇÃO 1041530-91 – PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO**, oriunda do certame licitatório Tomada de Preço nº 12/2018 no que tange ao despacho folha nº 300 do PA emanado pela Comissão Permanente de Licitações na qual faz referência a solicitação da empresa executora sobre o pleito de aditivo de prazo para vigência e execução segue o seguinte.

DOS FATOS:

A empreiteira assina o contrato administrativo nº 329/2018 na data de 31 de agosto de 2018, ficando aguardando a ordem de início de serviços expedida pelo município.

Através do ofício nº 3626/2018/REGOV datado de 22 de novembro de 2018 encartado sob a folha nº 289 do PA, autoriza o início dos serviços e 6 dias após, na data de 28 de novembro de 2018, o município emite e encaminha a empresa a Ordem de Início dos Serviços folha 293 do PA, para que se execute a obra em questão.


Na data de 31 de janeiro de 2019 foi feito por esse fiscal uma notificação encartada no PA sob os números 294/298, alertando a empresa sob a paralização da obra estando somente no canteiro os tubos de concreto para a drenagem pluvial.

Pois bem após a notificação a empresa se mobilizou começando a executar a drenagem e o início do terraplenagem.

Na data de hoje a Drenagem Pluvial está com aproximadamente 85,00% executada, já a terraplenagem com 20,00% perfazendo um total acumulado na obra de 25%, conforme é demonstrado nas fotos abaixo.



Município de Capanema – PR
Secretaria de Planejamento e Projetos

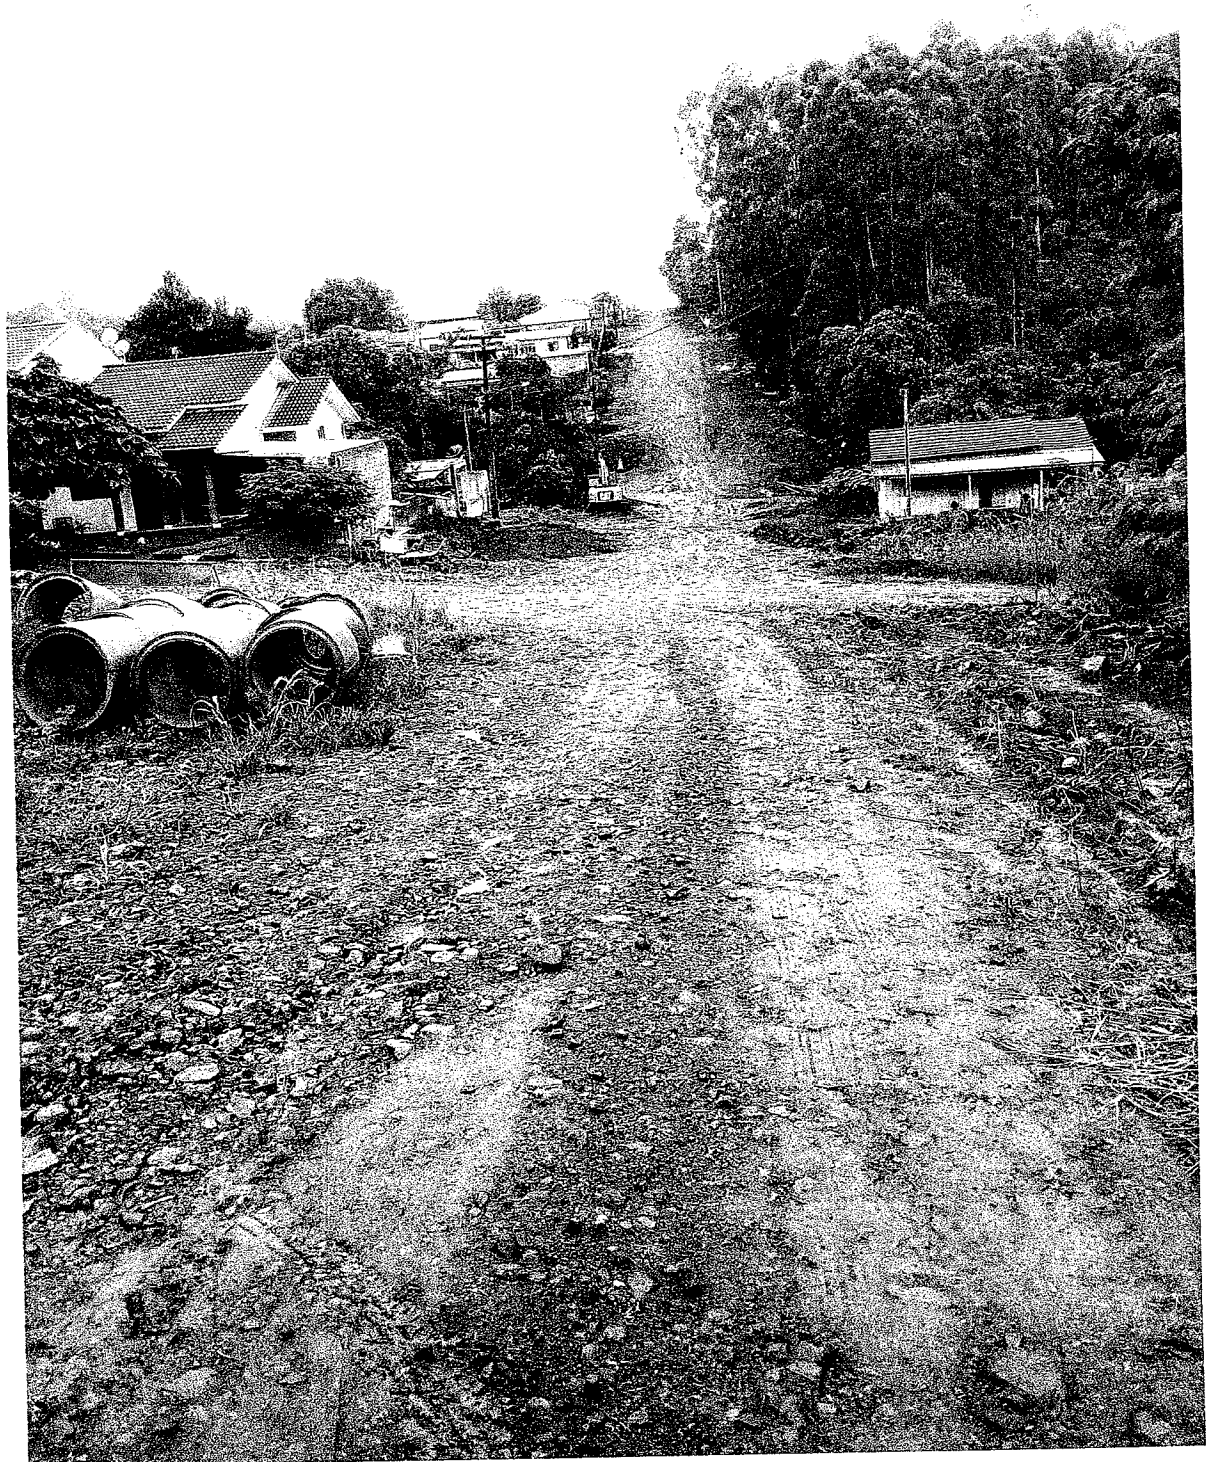


Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone:46-3552-1321 – Fax:46-3552-1122- e-mail: rubensengenharia@capanema.pr.gov.br

Município de Capanema – PR
Secretaria de Planejamento e Projetos



Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone:46-3552-1321 – Fax:46-3552-1122- e-mail: rubensengenharia@capanema.pr.gov.br

Município de Capanema – PR
Secretaria de Planejamento e Projetos

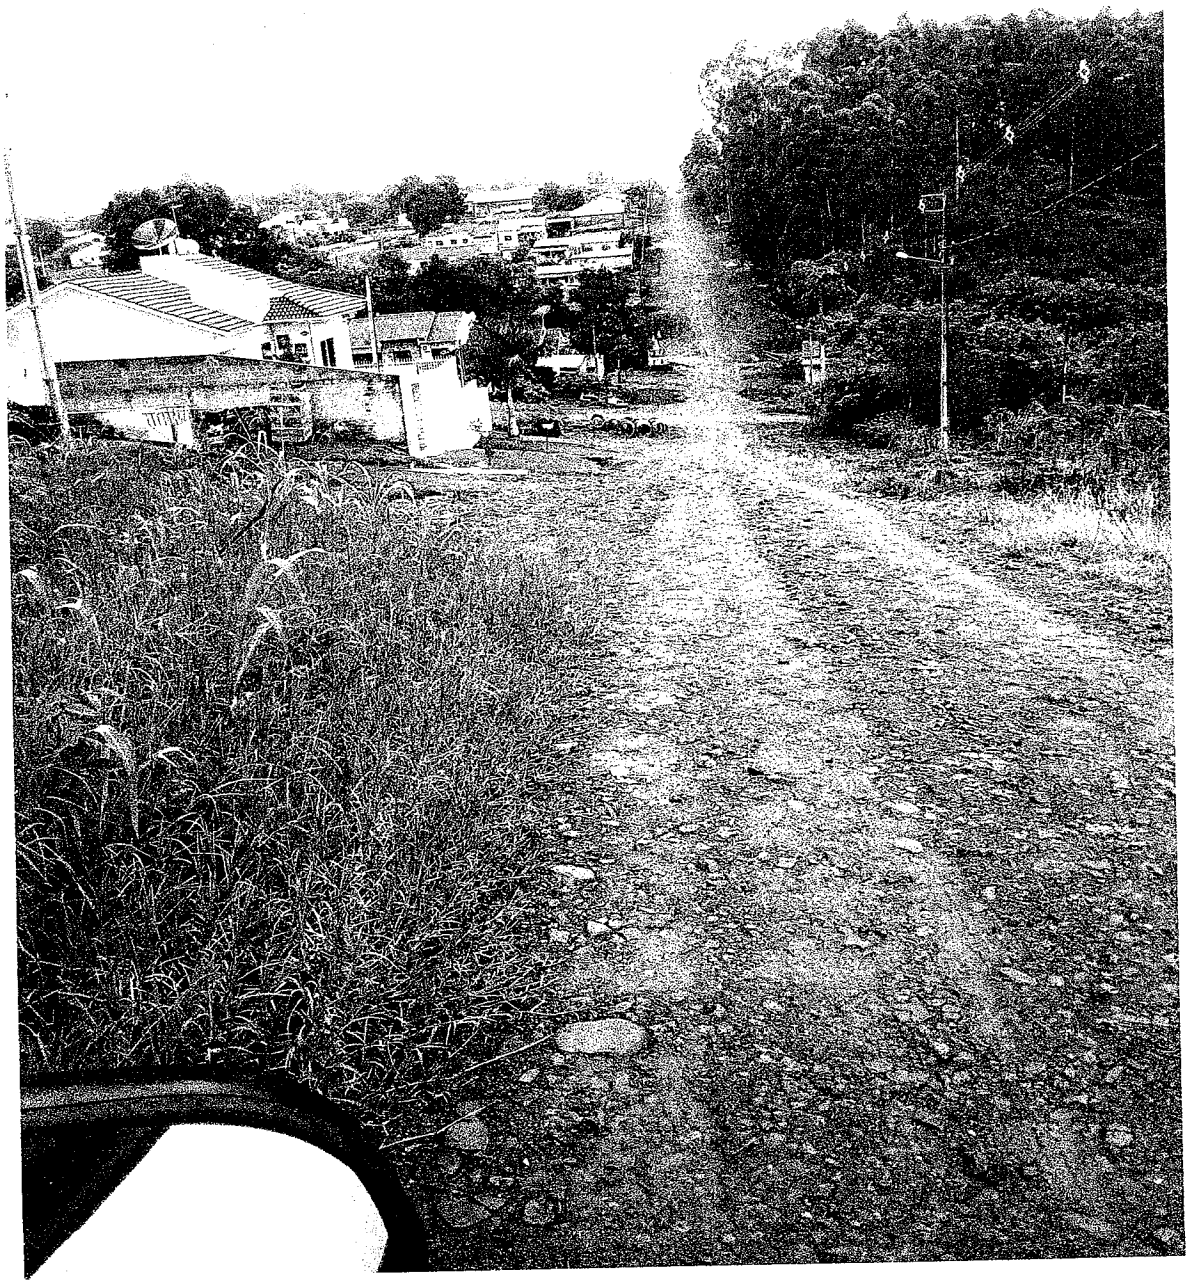


Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone:46-3552-1321 – Fax:46-3552-1122- e-mail: rubensengenharia@capanema.pr.gov.br

Município de Capanema – PR
Secretaria de Planejamento e Projetos



Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone:46-3552-1321 – Fax:46-3552-1122- e-mail: rubensengenharia@capanema.pr.gov.br

Município de Capanema – PR
Secretaria de Planejamento e Projetos

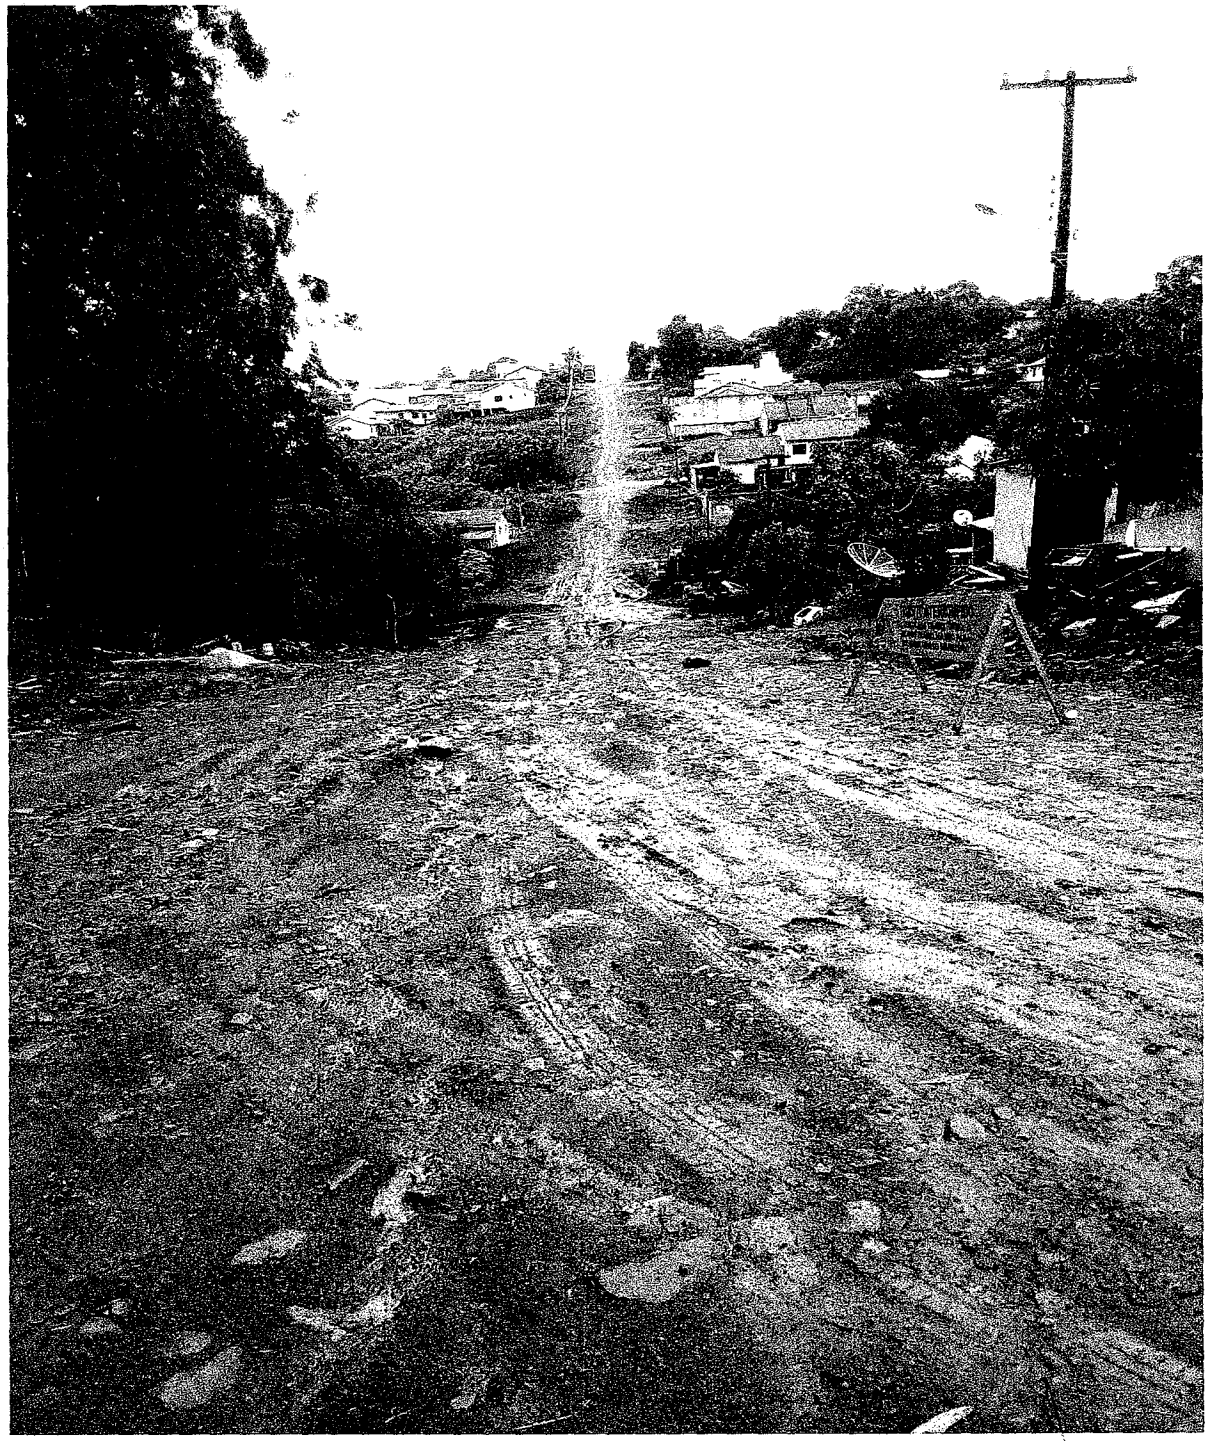

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone:46-3552-1321 – Fax:46-3552-1122- e-mail: rubensengenharia@capanema.pr.gov.br

DA JUSTIFICATIVA DA EMPRESA:

A empresa através da folha nº 0299 do PA solicita prorrogação de prazo de vigência e execução com as seguintes justificativas:

A- No decorrer da execução, apareceram patologias na obra, as quais não havia possibilidades de serem previstas, tais como redes coletoras de esgoto e água potável em desconformidade com o projeto, terreno com murros irregulares adentrando as calçadas, valas para tubulação com muitas pedras e rochas.

Quanto a este item cabe observar que as tais patologias, rede de esgoto e água potável em desconformidade com o projeto está no projeto em consonância com a rua em questão, bem como está também inserido no orçamento no item Serviços Complementares.

Já os murros irregulares adentrando as calçadas e aparecimento de rochas, quando da visita técnica a empresa poderia questionar, tal situação, embora tal situação está contemplada no projeto de Terraplenagem e Calçadas.

B- Neste período de execução a empresa tinha como programação férias coletivas aos funcionários, lembrando que a ordem de serviço foi expedita próximo ao final do ano de 2018, período de férias dos nossos fornecedores e colaboradores.

Quanto a este item cabe observar que esse é um problema de gestão da empresa executora, sendo que a Prefeitura não tem responsabilidade nenhum sobre o assunto.

É O PARECER:

Diante o exposto acima, a fim de que não se perca o contrato e a empresa está trabalhando no canteiro de obras em ritmo acelerado sou favorável que se proceda a prorrogação do prazo de execução, uma vez que o prazo de vigência vencerá na data de 30 de agosto de 2019, ficando da seguinte maneira

PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2019 A 11 DE JULHO DE 2019

Capanema, 12 de março de 2.019

Rubens Luis Rolando Souza
Eng° Civil Municipal de Capanema-PR
Nº Visado 1 [illegible]
CREA-RS 88296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

Município de Capanema - PR

DESPACHO

Com relação a Tomada de Preços nº 12/2018, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. Encaminho esse PA ao Procurador Jurídico para análise e emissão de Parecer Jurídico a respeito do aditivo de prazo de vigência e execução.

Capanema, 12 de março de 2019

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira/ Presidente da Comissão Permanente de
Abertura e Julgamento de Licitações

311

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / *DESTINATAIRE*

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / *NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE*

AA COLUSSI & CIA Ltda-ME

ENDEREÇO / *ADRESSE*

AVENIDA BRASIL Nº 306 - SALA 02 B. CENTRO

CEP / *CODE POSTAL*	CIDADE / *LOCALITÉ*	UF	PAÍS / *PAYS*
85.760-000	CAPANEMA	PR	

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / *DISCRIMINACION*

Notificação TAMOIOS TP 12148

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*

- ☐ PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE*
- ☐ EMS
- ☐ SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉ*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RÉCEPTEUR*

DATA DE RECEBIMENTO / *DATE DE LIVRATION*

06/02/19

CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / *BUREAU DE DESTINATION*

AC CAPANEMA

06 FEV 2019

PR

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR*

Guilherme David

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

10.651.956-0

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / *SIGNATURE DE L'AGENT*

Adriana Morgan
Atendimento
Mat: 8566.355-7
AC CAPANEMA - PR

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

75240203-0 FC0463 / 16 114 x 186 mm

Município de Capanema - PR
Procuradoria Jurídica

PARECER JURÍDICO Nº 101/2019

INTERESSADO: Setor de Licitações.
ASSUNTO: Análise do pedido de aditivo de prazo do contrato nº 329/2018. Tomada de Preços nº 12/2018.

EMENTA: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO. SOLICITAÇÃO REALIZADA PELA EMPRESA CONTRATADA. RELATÓRIO TÉCNICO Nº 06/2019. JUSTIFICATIVAS SUFICIENTES. PARECER.

1. CONSULTA:

O Setor de Licitações encaminha para análise dessa Procuradoria Jurídica "Solicitação" apresentada pela empresa A. A. Colussi & Cia Ltda. (fl. 299), bem como do Parecer Técnico nº 02/2019 (fls. 232/234), manifestando o interesse na prorrogação da vigência contratual, pelo prazo adicional de 4 (quatro) meses.

Por força do despacho de fl. 310, o PA foi encaminhado a PGM. É o relatório.

2. PARECER:

Convém destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria, nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei 8.666/93, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico dos documentos apresentados, não cabendo nenhuma consideração acerca do mérito da presente contratação e da discricionariedade da Administração Pública ao traçar os parâmetros dos produtos entendidos como necessários.

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestação jurídica tem o escopo de apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico e recomendar alguma providência para salvaguardar a Administração e o erário público. Assim, parte das observações aqui expendidas se constitui em recomendações e, caso a Administração opte por não acatá-las, recomenda-se motivar o ato, nos termos do art. 50, da Lei nº 9.784/99. O cumprimento ou não das recomendações decorre do exercício da competência discricionária da

autoridade administrativa, a qual responde isoladamente no caso de descumprimento das recomendações deste parecer ou pela ausência de fundamentação dos atos administrativos.

Contudo, as questões que envolvem a legalidade, isto é, os requisitos previstos no ordenamento jurídico são de observância obrigatória, os quais, para não serem aplicados, deve haver motivação e justificativa plausível para tanto.

Nesse rumo, forçoso reconhecer que a análise dos aspectos técnicos da Prorrogação contratual pretendida pela Administração não constitui tarefa afeta a este órgão jurídico, o que somente de forma excepcional poderemos adentrar, em razão da omissão grosseira do setor competente na descrição dos objetos ou na justificativa da contratação.

Ante as questões acima suscitadas, passaremos à análise dos aspectos relacionados à legalidade do feito.

2.1. Do Aditivo de Prazo:

A Lei nº 8.666/1993 admite a prorrogação de contratos, desde que observadas determinadas situações, elencadas no citado normativo legal nos seguintes termos:

> **Art. 57.** A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
> (...)
> § 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
> I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
> II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
> III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;
> IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

> V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;
> **VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis**.
> § 2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. (destaquei)

Consoante se verifica da Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº 329/2018, acostado as fls. 269/280 e Ordem de Início de Serviço de fl. 293, prazo inicial de vigência era de 06 (seis) meses, iniciando-se em 29/11/2018 e encerrando em 28/05/2019.

Consoante o contido no Relatório Técnico nº 06/2019 da Secretaria de Planejamento e Projetos, a obra pública em questão é realizada com recursos advindos do Contrato de Repasse nº 856605/2017, firmado entre o Município de Capanema e o Ministério das Cidades. Também é possível extrair, que a despeito do referido Contrato Administrativo ter sido assinado em 31/08/2018, a ordem de início da execução da obra somente ocorreu em 28/11/2019 (fl. 293), tudo em conformidade com o contido na Cláusula 4.2.1 do referido Contrato.

Desse modo, considerando o exposto, a Procuradoria manifesta-se pelo acolhimento do pedido de aditivo de prazo de execução até 11/07/2019, com fundamento no Relatório Técnico nº 06/2019.

Outrossim, convém ressaltar que este Órgão postergará a análise acerca de eventual atraso na execução da presente obra, tendo em vista que o prazo inicial da execução possui como termo inicial em 28/05/2019.

Não obstante, pelo que consta do PA, não traz quaisquer outros ônus à Administração Pública, além dos originariamente previstos. Ademais, tem-se que a prorrogação contratual decorre da contínua necessidade dos serviços prestados, situação autorizada pelo art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.

Urge esclarecer, por fim, porque notória a relevância, que a veracidade de todas as informações e documentação apresentadas são de inteira responsabilidade dos contraentes.

Neste ponto, convém chamar atenção para a possibilidade de aplicação de sanções de natureza política, administrativa, civil e penal **em caso de malversação da verba pública,** decorrentes de improbidade administrativa, nos termos da Lei 8.429/92, bem como em desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, complementada pela Lei nº 10.028/2000, que criou outros tipos penais (crimes contra as finanças públicas), de modo a tomar mais efetivos os princípio constitucionais da Administração Pública (art. 37/CF).

3. CONCLUSÃO:

Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta pela **possibilidade** da celebração do **termo aditivo do prazo de execução até 11/07/2019**, **devendo ainda, ser providenciada:**

a) Juntada aos autos de toda a documentação de regularidade fiscal prevista no art. 29 da Lei 8.666/93, de modo a comprovar que a contratada ainda satisfaz os requisitos de habilitação, caso a validade dos respectivos documentos apresentados na sessão pública esteja espirada;

b) Juntada das declarações do art. 16, I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal;

c) O encaminhamento prévio da minuta do aditivo, para aprovação da PGM, conforme preconiza o art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/1993;

d) A publicação do extrato do termo aditivo em análise na imprensa oficial (art. 61, parágrafo único, Lei 8666), com vistas a conferir-lhe validade e eficácia, em razão do princípio da publicidade, inerente a todos os atos administrativos.

É o parecer.

Capanema, de 03 de abril de 2019.

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Municipal
OAB/PR 56.675

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Jurídico de
Capanema - PR
Dec. nº 6001/2015
OAB/PR 56.675

Município de Capanema - PR

DESPACHO

Com relação a Tomada de Preços nº 12/2018, Contrato Administrativo nº 329/2018, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. Acato o Parecer Jurídico nº 101/2019 pelo aditivo de Prazo de Execução. Solicito ao Setor de Licitações para que tome as devidas Providências no sentido da elaboração do Termo Aditivo.

Capanema, 04 de abril de2019

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Município de Capanema - PR

A Sra.

Roselia Kriger Becker Pagani

Pregoeira/Presidente da comissão

Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações

Com relação a Tomada de Preços nº 12/2018, Contrato Administrativo 329/2018, Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, informo que há dotação orçamentária ivo de Valor conforme orçamento abaixo:

Dotações:

Exercício da Despesa	Conta da Despesa	Funcional Programática	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Grupo da Fonte
2019	1490	08.00115.451.1501.1151	000	44.90.51.00.00	Do Exercício.

Capanema, 04 de abril de 2019

Cleomar Walter
Tec.Cont. CRC: PR 046483/O-2
CPF 723.903.959-53

318

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A.A. COLUSSI & CIA LTDA
CNPJ: 84.840.503/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:37:40 do dia 26/03/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/09/2019.
Código de controle da certidão: **3FDD.804D.558D.8C8E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

319

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 019719209-04

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **84.840.503/0001-65**
Nome: **A. A. COLUSSI & CIA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 02/08/2019 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (04/04/2019 16:57:17)

320

Município de Capanema
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **26/05/2019**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

NEGATIVA Nº: 1235/2019

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QE5MC44M3BRT

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

Inscrição Municipal	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
12726	84.840.503/0001-65	90333600 - 50	114

ENDEREÇO

AVENIDA BRASIL, 306 - SALA 2 CXPST 21 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR

CNAE / ATIVIDADES

Obras de terraplenagem, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Corretoras de contratos de mercadorias, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Certidão emitida no dia **Capanema, 27 de Março de 2019.**
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: **9ZTMH282QE5MC44M3BRT**

321

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 84840503/0001-65
Razão Social: A A COLUSSI E CIA LTDA
Endereço: AV BRASIL 306 SALA 2 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/04/2019 a 30/04/2019

Certificação Número: 2019040102561624023717

Informação obtida em 04/04/2019, às 17:01:09.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Município de Capanema - PR

NOTIFICAÇÃO

(O) A Senhor(a)
AA.COLUSSI & CIA LTDA

Com relação a Tomada de Preços nº 12/2018, Contrato Administrativo nº 329/2018, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. Em resposta ao seu pedido de Aditivo de Prazo de Execução, notifico a empresa A.A. Colussi & cia Ltda, onde a procuradoria se manifestou pelo acolhimento de seu pedido e o Prefeito acatou o Parecer jurídico.

Segue em anexo cópia do Parecer Jurídico nº 101/2019 para vosso conhecimento.
Informo que o aditivo estará sendo feito nos próximos dias.

Capanema, 04 de abril de 2019

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira/ Presidente da Comissão Permanente de
Abertura e Julgamento de Licitações

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

De:	roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em:	quinta-feira, 4 de abril de 2019 17:17
Para:	'colussitictac@gmail.com'
Assunto:	PARA VOSSO CONHECIMENTO TP 12-2018 NOTIFICAÇÃO
Anexos:	NOTIFICAÇÃO A A COLUSSI.pdf

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira/ Presidente da Comissão Permanete
de Abertura e Julgamento de Licitações
Município de Capanema-PR
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080
Capanema – PR cep 85760-000
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: quinta-feira, 4 de abril de 2019 17:17
Para: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00019.txt

The original message was received at Thu, 4 Apr 2019 17:16:53 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <colussitictac@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <colussitictac@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

MINUTA

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 329/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a AVENIDA BRASIL, 306 SALA 2 CXPST 21 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 84.840.503/0001-65, neste ato por seu representante legal, ALDEMIR COLUSSI, CPF:524.947.489-68 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de preços n° 12/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 31/08/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de preços n° 12/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017-OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 101/2019, fica prorrogado o prazo de execução do Contrato nº 329/2018 para mais 122 (Cento e vinte e dois) dias corridos a partir da data de término do contrato, ficando sua nova data de término de execução para o dia 11/07/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 04 de abril de 2019

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ALDEMIR COLUSSI
Representante Legal
A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME
Contratada

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 329/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a AVENIDA BRASIL, 306 SALA 2 CXPST 21 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 84.840.503/0001-65, neste ato por seu representante legal, ALDEMIR COLUSSI, CPF:524.947.489-68 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de preços n° 12/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 31/08/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de preços n° 12/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017-OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 101/2019, fica prorrogado o prazo de execução do Contrato nº 329/2018 para mais 122 (Cento e vinte e dois) dias corridos a partir da data de término do contrato, ficando sua nova data de término de execução para o dia 11/07/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 04 de abril de 2019

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ALDEMIR COLUSSI
Representante Legal
A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME
Contratada

EXPEDIENTE

ORGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA
AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005,
LEI MUNICIPAL Nº 1.648/2018

COORDENAÇÃO/DIREÇÃO: Valdeci Alves dos Santos - Secretaria de Administração

DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO: Anderson Ferreira dos Passos
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Anderson Ferreira dos Passos
DRT Nº 9975/PR

APOIO TÉCNICO: Pedro Augusto Santana

PREFEITURA DE CAPANEMA
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000
Fone: 46 3552-1321
E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br / adm@capanema.pr.gov.br
Capanema - Paraná
Prefeito Municipal: Américo Bellé
Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer
Secretário de Administração: Valdeci Alves dos Santos
Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski
Secretária de Educação, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz
Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti
Secretário de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso
Secretário de Saúde: Jonas Welter
Chefe de Gabinete: Paulo de Souza

Controladora Geral do Município: Arieli Caciara Wons

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA
R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000
Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329
Fax: (46) 3552-3217
E-mail: capanemacamara@gmail.com
Capanema - Paraná
Vereador: Valdomiro Brizola - Presidente
Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente
Vereador: Edson Wilmsen - 1º Secretário
Vereador: Delmar C. Balzan - 2º Secretário
Vereador: Airton Marcelo Barth
Vereador: Gilmar Pontin
Vereador: Ginésio J. Pinheiro
Vereador: Paulo C. Lothermann
Vereadora: Izolete Ap. Walker

ATOS LICITATÓRIOS

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 329/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a AVENIDA BRASIL, 306 SALA 2 CX-PST 21 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 84.840.503/0001-65, neste ato por seu representante legal, ALDEMIR COLUSSI, CPF:524.947.489-68 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de preços nº 12/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 31/08/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de preços nº 12/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017-OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 101/2019, fica prorrogado o prazo de execução do Contrato nº 329/2018 para mais 122 (Cento e vinte e dois) dias corridos a partir da data de término do contrato, ficando sua nova data de término de execução para o dia 11/07/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 04 de abril de 2019

AMÉRICO BELLÉ Prefeito Municipal	ALDEMIR COLUSSI Representante Legal A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME Contratada

2.º TERMO ADITIVO a Ata de Registro de Preços nº 170/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, sediada na R PROF LEONIDAS FERREIRA DA COSTA, 847 - CEP: 80220410 - BAIRRO: PAROLIM, Curitiba/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 81.706.251/0001-98, neste ato representada pelo Sr. ELCIO LUIS BORDIGNON, portador do RG nº 5.591.020-0, e CPF nº 972.234.769-15, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial 38/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Ata de Registro de Preços firmado em 10/04/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 38/2018, entre as partes acima identificadas, para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA BÁSICA PARA FORNECIMENTO JUNTO ÀS FARMACIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS., em atendimento a manifestação jurídica datada de 03/04/2019, acatada pelo Prefeito Municipal, fica recomposto o valor do Item 03, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência da Ata de Registro de Preços:

Município de Capanema - PR

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 329/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito on Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a AVENIDA BRASIL, 306 SALA 2 CXPST 21 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita ao CNPJ sob o nº 84.840.503/0001-65, neste ato por sau representante legal, ALDEMIR CDLUSSI, CPF:524.947.489-68 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei nº 8.666/93 e sues alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de preços nº 12/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 31/08/2018, objeto rio Edital de licitação, Modalidadn Tomada de preços nº 12/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO OE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEORAS IRREGULARES, ORENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SAO CRISTOVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº a56605/2017-OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, em conformidade com n Parecer Jurídico nº 101/2019, fica prorrogado o prazo de execução do Contrato nº 329/2018 pare mais 122 (Cento e vinte e dois) dias corridos a partir da data da término do contrato, ficando sua nova data de término de execução para o dia 11/07/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, par assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor a forma.

Capanema - PR, 04 de abril de 2019

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ALDEMIR COLUSSI
Representante Legal
A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME
Contratada

Município de Capanema - PR

DECRETO Nº 6.634, DE 04 DE ABRIL DE 2019.

Nomeia a Senhora Fernanda Pilati para a cargo de Diretora do Departamento de Esportes.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 9º, II, da Lei Municipal nº 877/2001,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a Senhora Fernanda Pilati para exercer o cargo de provimento em comissão de Diretora do Departamento de Esportes, nível C2, do Grupo Ocupacional 01 – Supervisão e Administração Superior, previsto no art. 22, III, da Lei Municipal nº 1.438/2013, com remuneração prevista no Anexo II, da Lei 1.280/2010, atualizada pela Lei nº 1.584/2016.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir da dia 1º de abril de 2019.

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 04 dias da mês de abril de 2019.

América Bellé
Prefeito Municipal

Município de Capanema - PR

DECRETO Nº 6.635, DE 04 DE ABRIL DE 2019.

Exonera, a pedido, a servidora Leonia Marlena Schreiber Luft, do carga de Auxiliar de Serviços Gerais.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no usa de suas atribuições legais, nos termos do art. 38, cuput, da Lei Municipal nº 877/2001,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora Leonia Marlena Schreiber Luft da cargo efetivu de Auxiliar de Serviços Gerias – Matrícula 1.962-1, nomeada por meio do Decretu nº 4.074/2007.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindn efeitos a partir de dia 1º de abril de 2019.

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 04 dias du mês de abril de 2019.

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Município de Capanema - PR

PORTARIA Nº 7.369, DE 04 DE ABRIL DE 2019.

Converte Licença Especial da servidora Leonia Marlena Schreiber Luft em verba indenizatória.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e:

CONSIDERANDO o disposto no artigo 74-C, da Lei Municipal nº 877/2001, alterada pela Lei Complementar nº 004/2012, de 09 de abril de 2012;

CONSIDERANDO o disposto no *Decreto 6.635/2019, que declarou a vacância da carga da Auxiliar de Serviços Gerais, em razão da pedida de exoneração pela servidara Leonia Marlena Schreiber Luf.*

RESOLVE:

Art. 1º Converter em verba indenizatória a Licença Especial de 3 (três) meses, prevista no artigo 4-C, da Lei Municipal nº 877/2001, alterada pela Lei Complementar nº 004/2012, de direito da Servidora **Leonia Marlena Schreiber Luft - Matrícula 1.962-1**, referente ao período aquisitivo de 2012 a 2017, em razão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Parágrafo único As verbas indenizatórias previstas nos artigos 1º desta Portaria serão pagas juntamente com as verbas rescisórias da servidara.

Art. 2º Esta Parteria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 04 dias do mês de abril de 2019.

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Município de Capanema - PR

LEI Nº 1.686, DE 04 DE ABRIL DE 2019.

Reconhece como relevante para a História e para a Cultura do Município de Capanema, o trecho conhecido "Estrada do Colono".

A Câmara Municipal de Capanema, Estado da Paraná, aprovau e eu, Prefeito dn Município de Capanema sanciona a seguinte:

LEI

Art. 1º Fica reconhecido enno de valor histórico e cultural do Município de Capanema, a Estrada do Colono, trecho que naseeu como caminho indígena, utilizado pelo Coluna Prestes, na década 1920, anterior a criação de Parque Nacional do Iguaçu e vitel para a colnnização dn Sudoeste e Oeste do Paraná.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estadn dn Pamná, aos 04 dias dn mês de abril de 2019.

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Município de Capanema - PR

1.º Termn Aditivo no Contrato nº 43/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPID DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado x empresa ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPID DE CAPANEMA - PR, inscrito na Carteira Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste nto representada pela Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro tado e empresa ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, situada a R ALAGOAS, 2833 SALA 01 - CEP: 85760000 - BAIRRU: CENTRU, uticrita no CNPJ sob o nº 79.039.418/0001-62, neste ato por seu representante legal, ELIAS CATANI, CPF:242.997.319-72 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitn as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/91 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Processo dispensa nº 08/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 13/02/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Processo Dispensa nº 08/2019, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA –PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS E ESTUDANTES DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ CAMPUS CAPANEMA DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, em conformidade com a Parecer Jurídico nº 78/2019, fica aditivado 496,75 Km na rota original, adecionando o valor de R$ 1.493,22 (Mil quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos)ao contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o prescute em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 21 de marçn 2019

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ELIAS CATANI
Representante Legal
ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP
Contratada

Município de Capanema - PR

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 44/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA , pessoa jurídica de direito privado, situada a R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43, neste ato por seu representante legal, LEONIR FRANCISCO GOSCH, CPF:650.513.860-91 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Processo dispensa nº 8/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 13/02/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Processo dispensa nº 8/2019, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA –PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS E ESTUDANTES DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ CAMPUS CAPANEMA DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 78/2019 fica aditivado 752,75 Km na rota original, adicionando o valor de R$ 2.288,36 (Dois Mil, duzentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos)ao contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas de contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 21 de março de 2019

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

LEONIR FRANCISCO GOSCH
Representante Legal
VIACAO IGUACU LTDA
Contratada

Município de Capanema - PR

DECRETO Nº 6.637, DE 08 DE ABRIL DE 2019.

Dispõe sobre a prorrogação do disposição funcional de servidor pública municipal, mediante permuta, à Secretaria de Estada da Educação – SEED.

O Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições leguis,

Considerando o disposto na Lei Municipal nº 1.618, de 22 de junho de 2017;

Considerando a disposição funcional da Servidora Estadual VANIA LINDOMARA KOLAS MACHADO an Município de Capanema, Estado do Paraná,

DECRETA:

Art. 1º - Fica autnrizada a prorrogação da disponibilidade funcional da servidora municipal ELIZABETE MARIA ROSIN ZAPANI, RG nº. 5.995.096-7, para o exercício de atividades inerentes ao seu cargo de professora perante Secretaria de Estado da Educação do Paraná – SEED até 31 de dezembro de 2019.

Art. 2º A disponibilidade funcional da Servidora ELIZABETE fica candicionada a disposição da servidora estadual Vania Lindomara Kolas Machado ao Municipio de Capanema.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na doto de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado da Paraná, aas 08 dias do mês de abril de 2019.

Américo Bellé
Prefeita Municipal

SÚMULA REQUERIMENTO LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Os empreendedores abaixo torna público que irão requerer ao Instituto Ambiental Do Paraná-IAP, Licença Ambiental Simplificada para o empreendimento a seguir especificado:
Empreendedores: Rose Toscan Schmidt e Jony Schmidt.
Atividade: Avicultura de Corte – Mat. 5.833.
Endereço: Linha Três Angicos.
Município: Capanema-Pr.

0005 19

NOTIFICAÇÃO

Ao Senhor
Paulo Fernando Lazzaretti Orso
Secretário Municipal de Planejamento

Notifico o Sr. Paulo Fernando Lazzaretti Orso, Secretário Municipal de Planejamento do vencimento de alguns contratos no mês de **AGOSTO/2019** conforme relação em anexo:

Solicito que nos encaminhe com antecedência as licitações que precisam ser feitas novamente, e também as solicitações de aditivo nos contratos que podem ser aditivados.

Segue abaixo a lista de Licitações que irão vencer, as demais informações como data do vencimento, nº de contrato estão na relação em anexo.

MODALIDADE Nº	OBJETO
TOMADA DE PREÇOS 12/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO

Capanema, 12 de julho de 2019

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira/ Presidente da Comissão Permanente de
Abertura e Julgamento de Licitações

Recebido 12/07/19

Município de Capanema - PR

SOLICITAÇÃO

Com relação a Tomada de preço nº 12/2018, contrato de repasse nº856605/2017 referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ESCHER, no perímetro urbano do Município de Capanema-Pr, informo que:

A obra apresentou dificuldades principalmente na construção de um bueirão, o qual demandou um tempo acima do esperado, acarretando atrasos no atendimento ao contrato e consequentemente o término da obra dentro do prazo estipulado. Bem como, estão faltando depósitos financeiros por parte do ministério, acarretando atrasos também na prestação de contas.

Baseado nestas informações, solicito ao setor de licitação que proceda ADITIVO DE PRAZO do referido Contrato por mais 90 dias.

Capanema, 12 de julho de 2019.

Paulo Fernando Lazzaretti Orso
Secretário de Planejamento

Paulo Fernando Lazzaretti Orso
Engº Agrônomo - CREA-SC 39552/D
Dec. 6286/2017
Sec. Mun. Planejamento e Projetos

Município de Capanema - PR

D E S P A C H O

Com relação a Tomada de Preços, nº 12/2018, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. Encaminho esse PA ao Procurador Jurídico para análise e emissão de Parecer Jurídico a respeito do pedido de Aditivo de prazo de vigência e execução.

Capanema, 12 de julho de 2019

Roselia Kriger Becker Pagani
Presidente da Comissão Permanente
de Abertura e Julgamento de Licitações

Município de Capanema - PR

Procuradoria Geral do Município

MANIFESTAÇÃO PRÉVIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2018

INTERESSADO: CPL e Secretaria de Planejamento.

Senhora Presidente da CPL,

1. Preliminarmente, este Órgão solicita que a Secretaria de Planejamento esclareça e comprove de forma pormenorizada quem deu causa ao atraso na conclusão da obra, sendo que existem repercussões financeiras em decorrência do não cumprimento do cronograma de execução da obra, seja para o particular (Empresa Contratada) mediante sujeição a processo administrativo e aplicação de multa contratual; ou, a Administração Pública, que tendo que reequilibrar ou reajustar preços contratuais deverá regressar contra os agentes públicos que deram causa ao atraso na obra, por força do art. 37, § 6º da Constituição Federal.

2. Complementadas as informações na forma solicitada, retorne o PA para emissão de Parecer Jurídico.

Capanema, 08 de agosto de 2019

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Municipal
OAB/PR 56.675

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Jurídico de
Capanema - PR
Dec. nº 6001/2015
OAB/PR 56.675

NOTIFICAÇÃO

Ao Senhor
Paulo Fernando Lazzaretti Orso
Secretário Municipal de Planejamento

Com relação a Tomada de Preços nº 12/2019, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. Notifico o Senhor Paulo Fernando Lazzaretti Orso para que se manifeste no prazo máximo de 5 (cinco) dias sobre as informações solicitadas pela Procuradoria na Manifestação Prévia datada de 08/08/2019.

Segue em anexo cópia da Manifestação Prévia para vosso entendimento.

Capanema, 08 de agosto de 2019

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira/ Presidente da Comissão Permanente de
Abertura e Julgamento de Licitações

334

PARECER TÉCNICO Nº 16/2019

Com relação ao contrato administrativo nº 329/2018 cujo objeto **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL, E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO NORTE E AVENIDA ATAÍDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA-PR EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 856605/2017 OPERAÇÃO 1041530-91 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO,** oriundo da tomada de preço nº 12/2018 no que tange a manifestação prévia folha nº segue o seguinte.

Na presente Manifestação Prévia expedida pela Procuradoria Municipal solicita a essa Secretaria que esclareça e comprove de maneira pormenizada quem deu causa ao atraso na conclusão da obra, sendo que existem repercussões financeiras em decorrência do não cumprimento do cronograma de execução da obra, seja para o particular(Empresa Contratada) mediante sujeição a processo administrativo a aplicação de multa contratual, ou a Administração Pública , que tendo que reequilibrar ou reajustar preços contratuais deverá regressar contra os agentes públicos que deram causa ao atraso na obra.

Diante o exposto vamos abordar o assunto por itens para melhor subsidiar a Procuradoria Municipal sobre a matéria.

DOS FATOS:

335

1 Produção Diária

Todos os dias vistoriava na obra na condição de exercer o exercício da fiscalização, com isso elaborei o Diário de Obras desde a sua data de início 28/11/2018 até 11/07/2019, cabe observar que eu estava de atestado médico na data de 09/07/2019, entretanto a equipe do Planejamento passou na obra a fim de me informar sobre a produção diária.

Todos os diários de obra, com as anotações de produção, sem produção e sem produção por motivos de chuva estão anexos a esse parecer.

Compilando os dados do diário de obras gerei uma tabela demonstrando os percentuais de produção conforme segue abaixo.

RESUMO DA PRODUÇÃO DIÁRIA DA OBRA DO CALÇAMENTO TAMOIOS			
Data	Dias com Produção	Dias sem Produção pela empresa	Dias sem Produção com chuva
novembro de 2018	2,00	1,00	-
dezembro de 2018	9,00	22,00	-
janeiro de 2019	-	27,00	4,00
fevereiro de 2019	16,00	9,00	3,00
março de 2019	14,00	15,00	2,00
abril de 2019	15,00	14,00	1,00
maio de 2019	11,00	13,00	7,00
junho de 2019	12,00	15,00	3,00
julho de 2019	5,00	6,00	-
Total em dias	**84,00**	**122,00**	**20,00**
Total percentual	**37,17%**	**53,98%**	**8,85%**

336

Esse item é um dos reflexos do atraso das obras, como pode se ver, 37,17% dias com produção, 53,98% dias sem produção sem justificativa e 8,85% dias sem produção por motivos de chuvas.

Cabe observar que na data de 31 de janeiro de 2019 folha nº 294 a 298 a empresa foi notificado pelo atraso das obras.

2 Cronogramas Físicos de Produção

Abaixo segue o cronograma original da proposta da empresa.

CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO ORIGINAL							
Nº Evento	Titulo do Evento	MESES EM PERCENTUAL					
		1	2	3	4	5	6
1	Serviços Preliminares	100,00					
2	Terraplenagem	50,00	50,00				
3	Drenagem	70,00	30,00				
4	Pavimentação Poliédrica		25,00	25,00	25,00		
5	Pavimentação em Calçadas					50,00	50,00
6	Sinalização Vertical						100,00
7	Serviços Complementares	100,00					
	DATAS	28/11/2018	28/12/2018	28/01/2019	28/02/2019	28/03/2019	28/04/2019

Diante de todos os atrasos ocorridos na obra a empresa não conseguiu vencer o cronograma original sendo concedido a ela um aditivo de prazo, antes desse 1º aditivo de prazo, o cronograma com os percentuais de produção estavam da seguinte maneira.

337

CRONOGRAMA FÍSICO DA EXECUÇÃO DAS OBRA ANTES DO PRIMEIRO ADITIVO

Nº Evento	Titulo do Evento	Percentual Executado
1	Serviços Preliminares	100,00
2	Terraplenagem	20,00
3	Drenagem	95,00
4	Pavimentação Poliédrica	
5	Pavimentação em Calçadas	
6	Sinalização Vertical	
7	Serviços Complementares	
	DATA	24/04/2019
	TOTALIZANDO 28,30% ACUMULADO DA OBRA	

Observa se que após a notificação a empresa produziu, mas não o suficiente para chegar ao cronograma inicial.

No dia 09/08/2019 retornei aos trabalhos, entretanto no dia 12/08/2019 fui na obra verificar a real situação da mesma com isso foi elaborado uma tabela com os percentuais executados atualizados da mesma.

CRONOGRAMA FÍSICO DA EXECUÇÃO DAS OBRA ATUALIZADO

Nº Evento	Titulo do Evento	Percentual Executado
1	Serviços Preliminares	100,00
2	Terraplenagem	100,00
3	Drenagem	100,00
4	Pavimentação Poliédrica	90,00
5	Pavimentação em Calçadas	-
6	Sinalização Vertical	-
7	Serviços Complementares	100,00
	DATA	13/08/2019
	TOTALIZANDO 87,61% ACUMULADO DA OBRA	

3 Pagamentos da Obra

Teve uma medição (até porque não teve avança físico na obra) na data de 25/04/2019 no valor der R$ 109.194,15. Correspondendo a 28,30% de execução.

Pagamento 09/05/2019	R$ 27.991,33
Pagamento 09/05/2019	R$ 49.170,00
Pagamento 22/07/2019	R$ 32.032,82
Total	R$ 109.194,15

4 Continuidade do Contrato

Para finalizar o contrato basta 12,39% de execução, nesse sentido a fim de finalizar o contrato em questão projetei um cronograma de execução do saldo da obra, o qual está abaixo.

PROJEÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO DA EXECUÇÃO PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA					
Nº Evento	Titulo do Evento	Percentual Executado	MESES EM PERCENTUAL		
			1º Mês	2º Mês	3º Mês
1	Serviços Preliminares	100,00			
2	Terraplenagem	100,00			
3	Drenagem	100,00			
4	Pavimentação Poliédrica	90,00	10,00		
5	Pavimentação em Calçadas	-	35,00	35,00	30,00
6	Sinalização Vertical	-			100,00
7	Serviços Complementares	100,00			

4 Relatório Fotográfico na data de hoje



310









344



Capanema, 19 de agosto de 2.019

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

345

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA TAMOIOS EM CAPANEMA-PR

DIÁRIO DE OBRAS

NOVEMBRO DE 2018

Nº 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**28/11/2018**	
DIAS FALTANTES:	276	DIAS

RELATÓRIO:

Assinatura da Ordem de Início de serviços

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-PR 88.296/D

347

Nº 29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios
CONTRATO:	nº 329/2018
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018
PRAZO FINAL:	31/08/2019
DATA:	**29/11/2018**
DIAS FALTANTES:	275 DIAS

RELATÓRIO:

Mobilização da equipe de drenagem

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 68.296/D

348

Nº 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	30/11/2018	
DIAS FALTANTES:	274	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de drenagem

Rubens Luis Rolanda Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA/RS 88.296/D

Município de Capanema – PR
Secretaria de Planejamento e Projetos

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA TAMOIOS EM CAPANEMA-PR

DIÁRIO DE OBRAS

DEZEMBRO DE 2018

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone:46-3552-1321 – Fax:46-3552-1122- e-mail: rubensengenharia@capanema.pr.gov.br

Nº 1

350

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**01/12/2018**	
DIAS FALTANTES:	273	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-PR 88.296/D

351

Nº 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	02/12/2018	
DIAS FALTANTES:	272	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**03/12/2018**	
DIAS FALTANTES:	271	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de drenagem

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema - PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**04/12/2018**	
DIAS FALTANTES:	270	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de drenagem

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**05/12/2018**	
DIAS FALTANTES:	269	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de drenagem

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 17413-1
CREA-PR 88.204/D

Fls 355

Nº 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**06/12/2018**	
DIAS FALTANTES:	268	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de drenagem

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**07/12/2018**	
DIAS FALTANTES:	267	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de drenagem

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**08/12/2018**	
DIAS FALTANTES:	266	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema - PR
Matrícula nº 13451
CREA/RS 88.296/D

Nº 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**09/12/2018**	
DIAS FALTANTES:	265	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR

Fls 359

Nº	10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**10/12/2018**	
DIAS FALTANTES:	264	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-PR 88.296/D

Nº	11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	11/12/2018	
DIAS FALTANTES:	263	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Fls. 381

Nº	12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**12/12/2018**	
DIAS FALTANTES:	262	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº	13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**13/12/2018**	
DIAS FALTANTES:	261	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 14[illegible]
CREA-[illegible]

dhm 363

Nº 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**14/12/2018**	
DIAS FALTANTES:	260	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souto
Eng.º Civil Municipal de Capanema PR
Matrícula nº 7043-7
CREA-RJ 88.296/D

364

Nº	15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**15/12/2018**	
DIAS FALTANTES:	259	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Ricardo Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

365

Nº 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	16/12/2018	
DIAS FALTANTES:	258	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 19434
CREA-RS 86296/D

Nº 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios
CONTRATO:	nº 329/2018
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018
PRAZO FINAL:	31/08/2019
DATA:	**17/12/2018**
DIAS FALTANTES:	257 DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 19431
CREA-RS 88.296/D

Nº 18

fls 367

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**18/12/2018**	
DIAS FALTANTES:	256	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de drenagem

Rubens Luis Rotondo Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-PR 88.296/D

Nº 19

368

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**19/12/2018**	
DIAS FALTANTES:	255	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de drenagem

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS-181.296/D

369

Nº 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**20/12/2018**	
DIAS FALTANTES:	254	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de drenagem

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Mun... de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

370

Nº 21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	21/12/2018	
DIAS FALTANTES:	253	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de drenagem

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

0371

Nº 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**22/12/2018**	
DIAS FALTANTES:	252	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

372

Nº 23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**23/12/2018**	
DIAS FALTANTES:	251	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

373

Nº 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**24/12/2018**	
DIAS FALTANTES:	250	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.396/D

374

Nº 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	25/12/2018	
DIAS FALTANTES:	249	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA/PR 88.296/D

375

Nº 26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	26/12/2018	
DIAS FALTANTES:	248	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1963-1
CREA-SC 93.296/D

376

Nº 27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**27/12/2018**	
DIAS FALTANTES:	247	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 7943-1
CREA-RS 88.296/D

377

Nº 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**28/12/2018**	
DIAS FALTANTES:	246	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1965-1
CREA-RS 181.296/D

Nº 29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**29/12/2018**	
DIAS FALTANTES:	245	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

379

Nº 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios
CONTRATO:	nº 329/2018
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018
PRAZO FINAL:	31/08/2019
DATA:	**30/12/2018**
DIAS FALTANTES:	244 DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

380

Nº	31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**31/12/2018**	
DIAS FALTANTES:	243	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Município de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

381

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA TAMOIOS EM CAPANEMA-PR

DIÁRIO DE OBRAS

JANEIRO DE 2019

382

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**01/01/2019**	
DIAS FALTANTES:	242	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 2

383

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**02/01/2019**	
DIAS FALTANTES:	241	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

384

Nº 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**03/01/2019**	
DIAS FALTANTES:	240	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

385

Nº 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**04/01/2019**	
DIAS FALTANTES:	239	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

386

Nº 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**05/01/2019**	
DIAS FALTANTES:	238	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**06/01/2019**	
DIAS FALTANTES:	237	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

388

Nº 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**07/01/2019**	
DIAS FALTANTES:	236	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1963-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 8

389

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**08/01/2019**	
DIAS FALTANTES:	235	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

390

Nº 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação Poliédrica Rua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**09/01/2019**	
DIAS FALTANTES:	234	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1963-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 10

391

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**10/01/2019**	
DIAS FALTANTES:	233	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº	11

fls. 392

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**11/01/2019**	
DIAS FALTANTES:	232	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº	12

393

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**12/01/2019**	
DIAS FALTANTES:	231	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

394

Nº 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**13/01/2019**	
DIAS FALTANTES:	230	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Polanczyk Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 14

395

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	14/01/2019	
DIAS FALTANTES:	229	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Santos
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1965-1
CREA-PR 148.296/D

Nº	15

396

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios
CONTRATO:	nº 329/2018
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018
PRAZO FINAL:	31/08/2019
DATA:	**15/01/2019**
DIAS FALTANTES:	228 DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 16

Fls: 397

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**16/01/2019**	
DIAS FALTANTES:	227	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 17

Fls 39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**17/01/2019**	
DIAS FALTANTES:	226	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 81.296/D

399

Nº 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**18/01/2019**	
DIAS FALTANTES:	225	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº | 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**19/01/2019**	
DIAS FALTANTES:	224	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luiz Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

401

Nº 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**20/01/2019**	
DIAS FALTANTES:	223	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 19451
CREA-PR 134 / D

402

Nº 21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**21/01/2019**	
DIAS FALTANTES:	222	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

403

Nº 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**22/01/2019**	
DIAS FALTANTES:	221	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Sangoi
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 7943-1
CREA-RS 88.596/D

Nº 23

404

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**23/01/2019**	
DIAS FALTANTES:	220	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada com chuvas

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

405

Nº 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**24/01/2019**	
DIAS FALTANTES:	219	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada com chuvas

Rubens Luis Rolando Schuh
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Fls 406

Nº 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	25/01/2019	
DIAS FALTANTES:	218	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 19[illegible]
CREA-RS 88.296/D

Nº 26

407

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	26/01/2019	
DIAS FALTANTES:	217	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 7943-1
CREA-RS 88.296/D

Fls. 408

Nº 27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**27/01/2019**	
DIAS FALTANTES:	216	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Santin
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

409

Nº 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	28/01/2019	
DIAS FALTANTES:	215	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1903-1
CREA-RS 88.206/D

Nº | 29

410

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**29/01/2019**	
DIAS FALTANTES:	214	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

411

Nº	30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**30/01/2019**	
DIAS FALTANTES:	213	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

412

Nº 31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**31/01/2019**	
DIAS FALTANTES:	212	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada com chuvas

Na data de hoje foi notificada a empresa quanto ao atraso do cronograma de obras explicitando que justifique a parada na obra e retorne imediatamente aos trabalhos.

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

413

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA TAMOIOS EM CAPANEMA-PR

DIÁRIO DE OBRAS

FEVEREIRO DE 2019

Nº 1

414

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**01/02/2019**	
DIAS FALTANTES:	211	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 19437
CREA-RS 88.296/D

415

Nº 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**02/02/2019**	
DIAS FALTANTES:	210	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**03/02/2019**	
DIAS FALTANTES:	209	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Sousa
Eng.º Civil Mun. de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº | 4

417

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**04/02/2019**	
DIAS FALTANTES:	208	DIAS

RELATÓRIO:

Mobilização de equipe de drenagem e terraplenagem

Rubens Luis Rolando Sousa
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios
CONTRATO:	nº 329/2018
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018
PRAZO FINAL:	31/08/2019
DATA:	**05/02/2019**
DIAS FALTANTES:	207 DIAS

RELATÓRIO:

Execução de Drenagem e terraplenagem

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

419

Nº 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**06/02/2019**	
DIAS FALTANTES:	206	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de Drenagem e terraplenagem

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Fls 420

Nº | 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**07/02/2019**	
DIAS FALTANTES:	205	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de Drenagem e terraplenagem

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º ... Municipal de Capanema-PE
... 1943-I
... 85.286/D

Nº 8

421

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**08/02/2019**	
DIAS FALTANTES:	204	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de Drenagem e terraplenagem

Rubens Luis Rolando Sestas
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 19431
CREA-RS 81.296/D

422

Nº 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**09/02/2019**	
DIAS FALTANTES:	203	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng° Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.° 1943-1
CREA-RS 88.296/D

423

Nº 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**10/02/2019**	
DIAS FALTANTES:	202	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 11

424

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**11/02/2019**	
DIAS FALTANTES:	201	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de drenagem

Vençeu o prazo contratual de execução de obras sendo confecionado o 1º termo aditivo de prazo com o vencimento em 11/07/2019.

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-PR 96.296/D

425

Nº 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**12/02/2019**	
DIAS FALTANTES:	200	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de drenagem

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº	13

426

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**13/02/2019**	
DIAS FALTANTES:	199	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de drenagem

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 14

427

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**14/02/2019**	
DIAS FALTANTES:	198	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de drenagem

Rubens Luis Rolando Sanchez
Eng° Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

428

Nº	15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**15/02/2019**	
DIAS FALTANTES:	197	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de drenagem

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 19491
CREA-PR 141.294/D

Nº 16

429

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**16/02/2019**	
DIAS FALTANTES:	196	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**17/02/2019**	
DIAS FALTANTES:	195	DIAS

RELATÓRIO:

obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 18

431

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**18/02/2019**	
DIAS FALTANTES:	194	DIAS

RELATÓRIO:

obra parada com chuvas

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.206/D

Nº 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**19/02/2019**	
DIAS FALTANTES:	193	DIAS

RELATÓRIO:

obra parada

Rubens Luis Rolendo Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 19433
CREA-RS 86266/D

433

Nº 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	20/02/2019	
DIAS FALTANTES:	192	DIAS

RELATÓRIO:

obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Fl. 434

Nº | 21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**21/02/2019**	
DIAS FALTANTES:	191	DIAS

RELATÓRIO:

obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

435

Nº 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**22/02/2019**	
DIAS FALTANTES:	190	DIAS

RELATÓRIO:

obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

436

Nº 23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**23/02/2019**	
DIAS FALTANTES:	189	DIAS

RELATÓRIO:

obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

437

Nº 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**24/02/2019**	
DIAS FALTANTES:	188	DIAS

RELATÓRIO:

obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

438

Nº 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**25/02/2019**	
DIAS FALTANTES:	187	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de drenagem

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

439

Nº 26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**26/02/2019**	
DIAS FALTANTES:	186	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de drenagem

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS

410

Nº 27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**27/02/2019**	
DIAS FALTANTES:	185	DIAS

RELATÓRIO:

obra parada com chuvas

Rubens Luis Rolando Sacco
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

411

Nº 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios
CONTRATO:	nº 329/2018
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018
PRAZO FINAL:	31/08/2019
DATA:	**28/02/2019**
DIAS FALTANTES:	184 DIAS

RELATÓRIO:

obra parada com chuvas

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

442

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA TAMOIOS EM CAPANEMA-PR

DIÁRIO DE OBRAS

MARÇO DE 2019

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**01/03/2019**	
DIAS FALTANTES:	183	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1945-1
CREA 8.1-52.796/D

Nº | 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**02/03/2019**	
DIAS FALTANTES:	182	**DIAS**

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

415

Nº 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**03/03/2019**	
DIAS FALTANTES:	181	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

446

Nº 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**04/03/2019**	
DIAS FALTANTES:	180	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de drenagem

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios
CONTRATO:	nº 329/2018
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018
PRAZO FINAL:	31/08/2019
DATA:	**05/03/2019**
DIAS FALTANTES:	179 DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**06/03/2019**	
DIAS FALTANTES:	178	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de drengem e terraplenagem

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

449

Nº 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**07/03/2019**	
DIAS FALTANTES:	177	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de drenagem e terraplenagem

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**08/03/2019**	
DIAS FALTANTES:	176	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de drenagem e terraplenagem

Rubens Luis Rotondo Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

411 : 431

Nº 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**09/03/2019**	
DIAS FALTANTES:	175	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.796/D

452

Nº 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	10/03/2019	
DIAS FALTANTES:	174	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 7043-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**11/03/2019**	
DIAS FALTANTES:	173	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

454

Nº	12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**12/03/2019**	
DIAS FALTANTES:	172	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng. Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1965-1
CREA-RS 182.204/D

455

Nº 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios
CONTRATO:	nº 329/2018
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018
PRAZO FINAL:	31/08/2019
DATA:	**13/03/2019**
DIAS FALTANTES:	171 DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Santos
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

456

Nº	14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**14/03/2019**	
DIAS FALTANTES:	170	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

457

Nº	15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**15/03/2019**	
DIAS FALTANTES:	169	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS

Fls: 458

Nº 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**16/03/2019**	
DIAS FALTANTES:	168	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rotondo Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

459

Nº 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**17/03/2019**	
DIAS FALTANTES:	167	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada com chuvas

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

460

Nº	18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**18/03/2019**	
DIAS FALTANTES:	166	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada com chuvas

Raiberts Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 19413-1
CREA-RS 181.296/D

461

Nº 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	19/03/2019	
DIAS FALTANTES:	165	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

462

Nº 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**20/03/2019**	
DIAS FALTANTES:	164	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**21/03/2019**	
DIAS FALTANTES:	163	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Santos
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

464

Nº 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**22/03/2019**	
DIAS FALTANTES:	162	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

465

Nº 23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**23/03/2019**	
DIAS FALTANTES:	161	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 82.396/D

Nº 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**24/03/2019**	
DIAS FALTANTES:	160	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rotondo Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1983-1
CREA-RS 88.296/D

467

Nº 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios
CONTRATO:	nº 329/2018
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018
PRAZO FINAL:	31/08/2019
DATA:	**25/03/2019**
DIAS FALTANTES:	159 DIAS

RELATÓRIO:

Execução de drenagem

Rubens Luis Rolando Sandri
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**26/03/2019**	
DIAS FALTANTES:	158	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de drenagem

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1143-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 27

fls: 469

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**27/03/2019**	
DIAS FALTANTES:	157	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de drenagem

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**28/03/2019**	
DIAS FALTANTES:	156	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de drenagem

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema PR
Matrícula nº 9413-1
CREA-RS 88.296/D

Fls: 471

Nº 29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**29/03/2019**	
DIAS FALTANTES:	155	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de drenagem

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

472

Nº 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**30/03/2019**	
DIAS FALTANTES:	154	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

473

Nº	31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**31/03/2019**	
DIAS FALTANTES:	153	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
1943-I
CREA-RS 88.296/D

474

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA TAMOIOS EM CAPANEMA-PR

DIÁRIO DE OBRAS

ABRIL DE 2019

Fls: 475

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**01/04/2019**	
DIAS FALTANTES:	152	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de drenagem

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.206/D

476

Nº 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**02/04/2019**	
DIAS FALTANTES:	151	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de drenagem

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 3

477

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**03/04/2019**	
DIAS FALTANTES:	150	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de drenagem

Rubens Luiz Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**04/04/2019**	
DIAS FALTANTES:	149	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de drenagem

Fechamenato da 1ª Medição com 95% de drenagem pluvial e 20,00% de terraplenagem com um total de 28,30% da obra, perfazendo um total de R$ 109.194,15

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 19453-1
CREA-PR 88.296/D

479

Nº 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**05/04/2019**	
DIAS FALTANTES:	148	DIAS

RELATÓRIO:

Terraplenagem e Pavimentação poliédrica

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

480

Nº 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**06/04/2019**	
DIAS FALTANTES:	147	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1945-1
CREA-PR 2[illegible]/D

481

Nº 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**07/04/2019**	
DIAS FALTANTES:	146	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**08/04/2019**	
DIAS FALTANTES:	145	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

483

Nº 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	09/04/2019	
DIAS FALTANTES:	144	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 7903-1
CREA-PR 80.296/D

484

Nº 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**10/04/2019**	
DIAS FALTANTES:	143	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº	11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**11/04/2019**	
DIAS FALTANTES:	142	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº	12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios
CONTRATO:	nº 329/2018
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018
PRAZO FINAL:	31/08/2019
DATA:	**12/04/2019**
DIAS FALTANTES:	141 DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº	13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**13/04/2019**	
DIAS FALTANTES:	140	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº	14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**14/04/2019**	
DIAS FALTANTES:	139	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

489

Nº	15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**15/04/2019**	
DIAS FALTANTES:	138	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de terraplenagem e pavimentação poliédrica

Rubens Luis Rodrigues Sousa
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

490

Nº 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**16/04/2019**	
DIAS FALTANTES:	137	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de terraplenagem e pavimentação poliédrica

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

491

Nº 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**17/04/2019**	
DIAS FALTANTES:	136	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de terraplenagem e pavimentação poliédrica

Rubens Luiz Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

492

Nº 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios
CONTRATO:	nº 329/2018
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018
PRAZO FINAL:	31/08/2019
DATA:	**18/04/2019**
DIAS FALTANTES:	135 DIAS

RELATÓRIO:

Execução de terraplenagem e pavimentação poliédrica

Rubens Luis Rolando Scheid
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

493

Nº | 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios
CONTRATO:	nº 329/2018
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018
PRAZO FINAL:	31/08/2019
DATA:	**18/04/2019**
DIAS FALTANTES:	135 DIAS

RELATÓRIO:

Execução de terraplenagem e pavimentação poliédrica

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 38.206/D

494

Nº 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios
CONTRATO:	nº 329/2018
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018
PRAZO FINAL:	31/08/2019
DATA:	**19/04/2019**
DIAS FALTANTES:	134 DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Fls: 495

Nº 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	20/04/2019	
DIAS FALTANTES:	133	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Fls 496

Nº 21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**21/04/2019**	
DIAS FALTANTES:	132	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

437

Nº 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**22/04/2019**	
DIAS FALTANTES:	131	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de terraplenagem e pavimentação poliédrica

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**23/04/2019**	
DIAS FALTANTES:	130	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de terraplenagem e pavimentação poliédrica

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1983-1
CREA-RS 88.296/D

Fls. 499

Nº 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**24/04/2019**	
DIAS FALTANTES:	129	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de terraplenagem e pavimentação poliédrica

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1945-1
CREA-RS-[illegible]/D

500

Nº 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**25/04/2019**	
DIAS FALTANTES:	128	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de terraplenagem e pavimentação poliédrica

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1963-1
CREA-RS 181.296/D

501

Nº 26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**26/04/2019**	
DIAS FALTANTES:	127	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de terraplenagem e pavimentação poliédrica

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1965-1
CREA-RS

502

Nº 27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**27/04/2019**	
DIAS FALTANTES:	126	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

503

Nº 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**28/04/2019**	
DIAS FALTANTES:	125	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rotundo Souza
Eng° Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.° 1965-1
CREA-PR 96.296/D

504

Nº 29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**29/04/2019**	
DIAS FALTANTES:	124	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

505

Nº 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**30/04/2019**	
DIAS FALTANTES:	123	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Sousa
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Município de Capanema – PR
Secretaria de Planejamento e Projetos

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA TAMOIOS EM CAPANEMA-PR

DIÁRIO DE OBRAS

MAIO DE 2019

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone:46-3552-1321 – Fax:46-3552-1122- e-mail: rubensengenharia@capanema.pr.gov.br

507

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios
CONTRATO:	nº 329/2018
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018
PRAZO FINAL:	31/08/2019
DATA:	**01/05/2019**
DIAS FALTANTES:	122 DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema/PR
Matrícula n.º 1043-1
CREA 85.[illegible]-7/D

Fls. 508

Nº 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**02/05/2019**	
DIAS FALTANTES:	121	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS

Fls 509

Nº 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**03/05/2019**	
DIAS FALTANTES:	120	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Fls. 510

Nº 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**04/05/2019**	
DIAS FALTANTES:	119	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

511

Nº 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**05/05/2019**	
DIAS FALTANTES:	118	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Sartin
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

512

Nº 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**06/05/2019**	
DIAS FALTANTES:	117	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de terraplenagem e pavimentação poliédrica

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

513

Nº 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**07/05/2019**	
DIAS FALTANTES:	116	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de terraplenagem e pavimentação poliédrica

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1965-1
CREA-PR 61.296/D

514

Nº 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**08/05/2019**	
DIAS FALTANTES:	115	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada com chuvas

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Fls. 515

Nº 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**09/05/2019**	
DIAS FALTANTES:	114	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada com chuvas

Rubens Luis Rolando Soliza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Fls: 518

Nº	10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**10/05/2019**	
DIAS FALTANTES:	113	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada com chuvas

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Fls 517

Nº	11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**11/05/2019**	
DIAS FALTANTES:	112	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada com chuvas

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

518

Nº	12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**12/05/2019**	
DIAS FALTANTES:	111	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada com chuvas

Rubens Luis Rolando Stutz
Eng° Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n° 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios
CONTRATO:	nº 329/2018
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018
PRAZO FINAL:	31/08/2019
DATA:	**13/05/2019**
DIAS FALTANTES:	110 DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada com chuvas

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-PR 88.294/D

520

Nº	14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**14/05/2019**	
DIAS FALTANTES:	109	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de pavimentação poliédrica

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº	15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**15/05/2019**	
DIAS FALTANTES:	108	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de pavimentação poliédrica

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

522

Nº 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios
CONTRATO:	nº 329/2018
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018
PRAZO FINAL:	31/08/2019
DATA:	**16/05/2019**
DIAS FALTANTES:	107 DIAS

RELATÓRIO:

Execução de pavimentação poliédrica

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

523

Nº 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**17/05/2019**	
DIAS FALTANTES:	106	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de pavimentação poliédrica

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

524

Nº 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**18/05/2019**	
DIAS FALTANTES:	105	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-PR 88.296/D

Fls. 525

Nº 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	19/05/2019	
DIAS FALTANTES:	104	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luiz Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**20/05/2019**	
DIAS FALTANTES:	103	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de pavimentação poliédrica

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**21/05/2019**	
DIAS FALTANTES:	102	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de pavimentação poliédrica

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

528

Nº 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**22/05/2019**	
DIAS FALTANTES:	101	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de pavimentação poliédrica

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 11943-1
CREA-RS 88.296/D

529

Nº 23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**23/05/2019**	
DIAS FALTANTES:	100	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de pavimentação poliédrica

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**24/05/2019**	
DIAS FALTANTES:	99	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de pavimentação poliédrica

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 7943-1
CREA-RS 88.296/D

531

Nº 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios
CONTRATO:	nº 329/2018
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018
PRAZO FINAL:	31/08/2019
DATA:	**25/05/2019**
DIAS FALTANTES:	98 DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

532

Nº 26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**26/05/2019**	
DIAS FALTANTES:	97	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios
CONTRATO:	nº 329/2018
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018
PRAZO FINAL:	31/08/2019
DATA:	**27/05/2019**
DIAS FALTANTES:	96 DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rotundo Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

534

Nº 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**28/05/2019**	
DIAS FALTANTES:	95	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA RS 88.296/D

535

Nº 29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**29/05/2019**	
DIAS FALTANTES:	94	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1965
CREA-RS 88.296/D

536

Nº 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**30/05/2019**	
DIAS FALTANTES:	93	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Município de Capanema – PR
Secretaria de Planejamento e Projetos

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA TAMOIOS EM CAPANEMA-PR

DIÁRIO DE OBRAS

JUNHO DE 2019

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone:46-3552-1321 – Fax:46-3552-1122- e-mail: rubensengenharia@capanema.pr.gov.br

538

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios
CONTRATO:	nº 329/2018
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018
PRAZO FINAL:	31/08/2019
DATA:	**01/06/2019**
DIAS FALTANTES:	91 DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Dais Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 19457
CREA-RS Nº 296/D

Fls 539

Nº 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**02/06/2019**	
DIAS FALTANTES:	90	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1963-1
CREA-RS 88.296/D

Nº	3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**03/06/2019**	
DIAS FALTANTES:	89	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de pavimentação poliédrica

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 111.296/D

Nº 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**04/06/2019**	
DIAS FALTANTES:	88	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de pavimentação poliédrica

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

542

Nº 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios
CONTRATO:	nº 329/2018
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018
PRAZO FINAL:	31/08/2019
DATA:	**05/06/2019**
DIAS FALTANTES:	87 DIAS

RELATÓRIO:

Execução de pavimentação poliédrica

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

543

Nº | 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**06/06/2019**	
DIAS FALTANTES:	86	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de pavimentação poliédrica

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

544

Nº 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**07/06/2019**	
DIAS FALTANTES:	85	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de pavimentação poliédrica

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

545

Nº 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios
CONTRATO:	nº 329/2018
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018
PRAZO FINAL:	31/08/2019
DATA:	**08/06/2019**
DIAS FALTANTES:	84 DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

516

Nº 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**09/06/2019**	
DIAS FALTANTES:	83	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº	10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**10/06/2019**	
DIAS FALTANTES:	82	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de pavimentação poliédrica

Rubens Luis Ritondo Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

548

Nº	11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios
CONTRATO:	nº 329/2018
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018
PRAZO FINAL:	31/08/2019
DATA:	**11/06/2019**
DIAS FALTANTES:	81 DIAS

RELATÓRIO:

Execução de pavimentação poliédrica

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

549

Nº	12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**12/06/2019**	
DIAS FALTANTES:	80	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de pavimentação poliédrica

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

410 550

Nº 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**13/06/2019**	
DIAS FALTANTES:	79	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de pavimentação poliédrica

Rubens Luiz Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

004551

Nº 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**14/06/2019**	
DIAS FALTANTES:	78	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de pavimentação poliédrica

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº	15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios
CONTRATO:	nº 329/2018
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018
PRAZO FINAL:	31/08/2019
DATA:	**15/06/2019**
DIAS FALTANTES:	77 DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**16/06/2019**	
DIAS FALTANTES:	76	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada com chuvas

Rubens Luis Rotondo Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 19433-1
CREA-RS 88.286/D

554

Nº	17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**17/06/2019**	
DIAS FALTANTES:	75	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada com chuvas

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

555

Nº 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios
CONTRATO:	nº 329/2018
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018
PRAZO FINAL:	31/08/2019
DATA:	**18/06/2019**
DIAS FALTANTES:	74 DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada com chuvas

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

556

Nº 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**19/06/2019**	
DIAS FALTANTES:	73	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 68.296/D

557

Nº	20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios
CONTRATO:	nº 329/2018
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018
PRAZO FINAL:	31/08/2019
DATA:	**20/06/2019**
DIAS FALTANTES:	72 DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolinski Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

558

Nº 21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios
CONTRATO:	nº 329/2018
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018
PRAZO FINAL:	31/08/2019
DATA:	**21/06/2019**
DIAS FALTANTES:	71 DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 19453
CREA-PR 106.[illegible]/D

Nº | 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**22/06/2019**	
DIAS FALTANTES:	70	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.396/D

Nº | 23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**23/06/2019**	
DIAS FALTANTES:	69	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 181.296/D

561

Nº 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios
CONTRATO:	nº 329/2018
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018
PRAZO FINAL:	31/08/2019
DATA:	**24/06/2019**
DIAS FALTANTES:	68 DIAS

RELATÓRIO:

Execução de pavimentação poliédrica

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios
CONTRATO:	nº 329/2018
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018
PRAZO FINAL:	31/08/2019
DATA:	**25/06/2019**
DIAS FALTANTES:	67 DIAS

RELATÓRIO:

Execução de pavimentação poliédrica

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.290/D

563

Nº 26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**26/06/2019**	
DIAS FALTANTES:	66	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

564

Nº 27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**27/06/2019**	
DIAS FALTANTES:	65	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

565

Nº 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**28/06/2019**	
DIAS FALTANTES:	64	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**29/06/2019**	
DIAS FALTANTES:	63	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº | 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**30/06/2019**	
DIAS FALTANTES:	62	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA TAMOIOS EM CAPANEMA-PR

DIÁRIO DE OBRAS

JULHO DE 2019

569

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**01/07/2019**	
DIAS FALTANTES:	61	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 7943-1
CREA-RS 88.296/D

570

Nº 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**02/07/2019**	
DIAS FALTANTES:	60	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

1441571

Nº 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**03/07/2019**	
DIAS FALTANTES:	59	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de pavimentação poliédrica

Rubens Luis Rolando Sousa
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

572

Nº 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**04/07/2019**	
DIAS FALTANTES:	58	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de pavimentação poliédrica

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

573

Nº 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**05/07/2019**	
DIAS FALTANTES:	57	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de pavimentação poliédrica

Rubens Luis Rolando Souza
Eng. Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

574

Nº 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**06/07/2019**	
DIAS FALTANTES:	56	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de pavimentação poliédrica

Rubens Luis Rotondo Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

575

Nº 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios
CONTRATO:	nº 329/2018
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018
PRAZO FINAL:	31/08/2019
DATA:	**07/07/2019**
DIAS FALTANTES:	55 DIAS

RELATÓRIO:

Execução de pavimentação poliédrica

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

576

Nº 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**08/07/2019**	
DIAS FALTANTES:	54	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Fls 577

Nº 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**09/07/2019**	
DIAS FALTANTES:	53	DIAS

RELATÓRIO:

Atestado médico, lembrando que no dia 11/07/2019 vençe o 1ª termo aditivo de prazo de execução

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº	10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**10/07/2019**	
DIAS FALTANTES:	52	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

579

Nº	11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios	
CONTRATO:	nº 329/2018	
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018	
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018	
PRAZO FINAL:	31/08/2019	
DATA:	**11/07/2019**	
DIAS FALTANTES:	51	DIAS

RELATÓRIO:

Obra parada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA TAMOIOS EM CAPANEMA-PR

DIÁRIO DE OBRAS

AGOSTO DE 2019

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone:46-3552-1321 – Fax:46-3552-1122- e-mail: rubensengenharia@capanema.pr.gov.br

581

Nº 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Pavimentação PoliédricaRua Tamoios
CONTRATO:	nº 329/2018
LICITAÇÃO:	TP nº 12/2018
INÍCIO DA OBRA:	28/11/2018
PRAZO FINAL:	31/08/2019
DATA:	**12/08/2019**
DIAS FALTANTES:	19 DIAS

RELATÓRIO:

Obra paralisada, entretanto constata se que :

Serviços Preliminares 100,00%
Terraplenagem 100,00%
Drenagem 95,00%
Pavimentação em Calçadas 0,00%
Sinalização Vertical 0,00%
Serviços Complementares 100,00%
A Obra Total Acumulada apresenta na data de hoje 87,61%

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1

582

DESPACHO

Com relação a Tomada de Preços, nº 12/2018, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017-OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. Após receber documentos do Engenheiro Civil, encaminho esse PA ao Procurador Jurídico para análise e emissão de Parecer Jurídico a respeito do aditivo.

Capanema, 19 de agosto de 2019

Roselia Kriger Becker Pagani
Presidente da Comissão Permanente
de Abertura e Julgamento de Licitações

Município de Capanema - PR

RESPOSTA A NOTIFICAÇÃO

Em resposta a notificação enviada por e-mail do dia 05 de agosto,sobre licitações a serem aditivadas envio memorando interno em anexo e devidamente protocolado.

Sem mais para o momento desde já agradeço.

Capanema, 21 de agosto de 2019.

Paulo Fernando Lazzaretti Orso
Secretário de Planejamento

Paulo Fernando Lazzaretti Orso
Engº Agrônomo - CREA-SC 39552/D
Dec. 6286/2017
Sec. Mun. Planejamento e Projetos

Município de Capanema – PR
Departamento de Engenharia

MEMORANDO INTERNO 13/2019

Processo: 2154/2019
Data: 20/08/2019 Hora: 03:57
Assunto: SOLICITACAO PARA SETOR DE PLANE
Requerente: RUBENS LUIS ROLANDO SDUZA

A/C:

Srº **PAULO FERNANDO LAZZARETI ORSO**

Secretário Municipal de Planejamento e Projetos

Com relação a Notificação feita ao Senhor Paulo Lazzaretti Orso eminente Secretário Municipal de Planejamento e Projetos na qual o setor de licitações solicita que sejam encaminhadas com antecedência as licitações que precisam serem feitas novamente aditivos e a pedido verbal do mesmo segue abaixo algumas informações para que possam subsidiar de informações para as possíveis solicitações de aditivos ou não.

TOMADA DE PREÇO Nº 11/2018:

EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM VIAS PÚBLICAS, NAS RUAS PROJETADAS A, RUA EMÍLIO JOSÉ KUNS, CARLOS LUDWUIG, PROJETADAS D, E,F, RUA LINHA BONITA NO MUNICÍPIOM DE CAPANEMA-PR EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 845319/2017/MCIDADES/CAIXA, PROCESSO Nº 2608.104090275/2017.

A obra vence a vigência em 07/09/2019

A obra vence a execução em 05/09/2019

000585

A obra está fisicamente acumulada em 88,92% de execução, praticamente faltando a limpeza e a sinalização vertical.

CONCORRÊNCIA 01/2018:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 02 BARRACÕES INDUSTRIAIS DE ÁREA DE 300,00 m2 CADA, INCLUINDO OS SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, COBERTURA ,METÉLICA ESQUADRIAS, HIDROSSANITÁRIAS E LIMPEZA DA OBRA EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 528/2017 – SEDU PARANACIDADE

A obra vence a vigência em 14/09/2019

A obra vence a execução em 30/05/2019

A obra está fisicamente acumulada em 100,00% de execução, faltando apenas o Governo do Estado do Paraná efetuar o seu pagamento final.

TOMADA DE PREÇO 12/2016

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOB SUB-BASE DE RACHÃO E BASE DE BRITA GRADIUADA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O TREVO DA BR 163 ATÉ A COMUNIDADE DE ALTO FARADAY.

586

A obra vence a vigência em 20/09/2019

A obra vence a execução em 16/06/2019

A obra está fisicamente acumulada em 100,00% de execução, entretanto apresenta falta de espessura da camada asfáltica no trecho urbano, com isso está para ter o desfecho do Processo Administrativo gerado.

TOMADA DE PREÇO Nº 10/2018

EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRA IRREGULAR EM VIA PÚBLICA NA RUA LUIZ GERALDO HOLLEN ENTRE AS RUAS RIO DE JANEIRO E RUA PERNANBUCO, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 84312/2017/MCIDADES/CAIXA PROCESSO Nº 26081040904-14/2017 SICONV Nº 18279/2017

A obra vence a vigência em 29/09/2019

A obra vence a execução em 29/09/2019

A obra está fisicamente acumulada em 100,00% de execução, entretanto falta O Ministério aportar os recursos a fim de que possamos efetuarmos os respectivos pagamentos da obra em questão.

Nesse sentido venho alertar o Eminente Secretário sobre o conteúdo da matéria supracitada.

Capanema, 20 de agosto de 2019

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 88.296/D

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Município de Capanema - PR

D E S P A C H O

Com relação a Tomada de Preços, nº 12/2018, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017-OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. Após receber resposta da notificação feita ao Secretário da Pasta, encaminho esse PA ao Procurador Jurídico para análise e emissão de Parecer Jurídico a respeito do aditivo de prazo de vigência.

Capanema, 22 de agosto de 2019

Roselia Kriger Becker Pagani
Presidente da Comissão Permanente
de Abertura e Julgamento de Licitações

0589

PARECER JURÍDICO Nº 258/2019

INTERESSADO: Setor de Licitações.

ASSUNTO: Análise do pedido de aditivo de prazo do contrato nº 329/2018. Tomada de Preços nº 12/2018.

EMENTA: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA. SOLICITAÇÃO REALIZADA PELA EMPRESA CONTRATADA. RELATÓRIO TÉCNICO Nº 06/2019. JUSTIFICATIVAS SUFICIENTES. PARECER.

1. CONSULTA:

O Setor de Licitações encaminha para análise dessa Procuradoria Jurídica "Solicitação" apresentada pelo Secretário de Planejamento, Paulo Orso Lazzaretti Orso (fl. 330), bem como do Parecer Técnico nº 16/2019 (fls. 334/344). Em resumo, o Secretário solicitou prorrogação contratual por 90 dias.

Por força do despacho de fl. 588, o PA foi encaminhado a PGM. É o relatório.

2. PARECER:

Convém destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria, nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei 8.666/93, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico dos documentos apresentados, não cabendo nenhuma consideração acerca do mérito da presente contratação e da discricionariedade da Administração Pública ao traçar os parâmetros dos produtos entendidos como necessários.

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestação jurídica tem o escopo de apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico e recomendar alguma providência para salvaguardar a Administração e o erário público. Assim, parte das observações aqui expendidas se constitui em recomendações e, caso a Administração opte por não acatá-las, recomenda-se motivar o ato, nos termos do art. 50, da Lei nº 9.784/99. O cumprimento ou não das recomendações decorre do exercício da competência discricionária da autoridade administrativa, a qual responde isoladamente no caso de

descumprimento das recomendações deste parecer ou pela ausência de fundamentação dos atos administrativos.

Contudo, as questões que envolvem a legalidade, isto é, os requisitos previstos no ordenamento jurídico são de observância obrigatória, os quais, para não serem aplicados, deve haver motivação e justificativa plausível para tanto.

Nesse rumo, forçoso reconhecer que a análise dos aspectos técnicos da Prorrogação contratual pretendida pela Administração não constitui tarefa afeta a este órgão jurídico, o que somente de forma excepcional poderemos adentrar, em razão da omissão grosseira do setor competente na descrição dos objetos ou na justificativa da contratação.

Ante as questões acima suscitadas, passaremos à análise dos aspectos relacionados à legalidade do feito.

2.1. Do Aditivo de Prazo:

A Lei nº 8.666/1993 admite a prorrogação de contratos, desde que observadas determinadas situações, elencadas no citado normativo legal nos seguintes termos:

> **Art. 57.** A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
> (...)
> § 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
> I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
> II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
> III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;
> IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;
> V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

> **VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis**.
> § 2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. (destaquei)

Consoante se verifica da Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº 329/2018, acostado as fls. 269/280 e Ordem de Início de Serviço de fl. 293, prazo inicial de vigência era de 06 (seis) meses, iniciando-se em 29/11/2018 e encerrando em 28/05/2019. Por força do 1º Aditivo Contratual, o prazo de execução contratual foi elastecido até 11/07/2019.

Consoante o contido no Relatório Técnico nº 06/2019 da Secretaria de Planejamento e Projetos, a obra pública em questão é realizada com recursos advindos do Contrato de Repasse nº 856605/2017, firmado entre o Município de Capanema e o Ministério das Cidades. Também é possível extrair, que a despeito do referido Contrato Administrativo ter sido assinado em 31/08/2018, a ordem de início da execução da obra somente ocorreu em 28/11/2019 (fl. 293), tudo em conformidade com o contido na Cláusula 4.2.1 do referido Contrato.

Ademais, considerando o contido no Relatório Técnico nº 16/2019 (fls. 334/344), extraísse que a obra em questão se encontra em fase final de execução.

Desse modo, considerando o exposto, a Procuradoria manifesta-se pelo acolhimento do pedido de aditivo de prazo de execução por mais 03 meses, finalizando 11/10/2019, com fundamento no Relatório Técnico nº 16/2019. De igual forma, manifesta-se favorável a prorrogação do prazo de vigência contratual, pelo mesmo prazo de 03 meses, finando em 30/11/2019.

Outrossim, convém ressaltar que este Órgão postergará a análise acerca das consequências decorrentes do atraso na execução da presente obra.

Não obstante, pelo que consta do PA, não traz quaisquer outros ônus à Administração Pública, além dos originariamente previstos. Ademais, tem-se que a prorrogação contratual decorre da contínua necessidade dos serviços prestados, situação autorizada pelo art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.

Urge esclarecer, por fim, porque notória a relevância, que a veracidade de todas as informações e documentação apresentadas são de inteira responsabilidade dos contraentes.

Neste ponto, convém chamar atenção para a possibilidade de aplicação de sanções de natureza política, administrativa, civil e penal **em caso de malversação da verba pública,** decorrentes de improbidade administrativa, nos termos da Lei 8.429/92, bem como em desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, complementada pela Lei nº 10.028/2000, que criou outros tipos penais (crimes contra as finanças públicas), de modo a tomar mais efetivos os princípio constitucionais da Administração Pública (art. 37/CF).

3. CONCLUSÃO:

Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta pela **possibilidade** da celebração do **termo aditivo do prazo de execução até 11/10/2019 e aditivo de prazo de vigência até 30/11/2019**, **devendo ainda, ser providenciada:**

a) Juntada aos autos de toda a documentação de regularidade fiscal prevista no art. 29 da Lei 8.666/93, de modo a comprovar que a contratada ainda satisfaz os requisitos de habilitação, caso a validade dos respectivos documentos apresentados na sessão pública esteja espirada;

b) Juntada das declarações do art. 16, I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal;

c) O encaminhamento prévio da minuta do aditivo, para aprovação da PGM, conforme preconiza o art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/1993;

d) A publicação do extrato do termo aditivo em análise na imprensa oficial (art. 61, parágrafo único, Lei 8666), com vistas a conferir-lhe validade e eficácia, em razão do princípio da publicidade, inerente a todos os atos administrativos. É o parecer.

Capanema, de 30 de agosto de 2019.

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Municipal
OAB/PR 56.675

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Jurídico de
Capanema - PR
Dec. nº 6001/2015
OAB/PR 56.675

593

DESPACHO

Com relação a Tomada de Preços nº 12/2018, Contrato Administrativo nº 329/2018, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, acato o Parecer Jurídico pelo Aditivo de prazo de vigência e execução do referido contrato.

Capanema, 30 de agosto de 2019

Américo Bellé
Prefeito Municipal

4110594

A Sra.

Roselia Kriger Becker Pagani

Pregoeira/Presidente da comissão

Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações

Com relação a Tomada de Preços n° 12/2018, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU N° 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, informo que há dotação orçamentária para o Aditivo conforme orçamento abaixo:

Dotações:

Exercício da Despesa	Conta da Despesa	Funcional Programática	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Grupo da Fonte
2019	1490	08001.15.451.1501.1151	000	44.90.51.00.00	Do Exercício.

Capanema, 30 de agosto/2019

Cleomar Walter

Tec.Cont. CRC- PR 045483/O-2

CPF 723.903.959-53

#0005595

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A.A. COLUSSI & CIA LTDA
CNPJ: 84.840.503/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:38:23 do dia 28/08/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/02/2020.
Código de controle da certidão: **7B65.BCAA.C156.3D3B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

596

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 020580337-68

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **84.840.503/0001-65**
Nome: **A. A. COLUSSI & CIA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 07/01/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (09/09/2019 16:12:49)

4110597

Município de Capanema
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **27/10/2019**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

NEGATIVA Nº: 5366/2019

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QE5T544M4RP2

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

Inscrição Municipal	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
12726	84.840.503/0001-65	90333600 - 50	114

ENDEREÇO

AVENIDA BRASIL, 306 - SALA 2 CXPST 21 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR

CNAE / ATIVIDADES

Obras de terraplenagem, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Corretoras de contratos de mercadorias, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Certidão emitida no dia **Capanema, 28 de Agosto de 2019.**
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: **9ZTMH282QE5T544M4RP2**

4ª 0598

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 84.840.503/0001-65
Razão Social: A A COLUSSI E CIA LTDA
Endereço: AV BRASIL 306 SALA 2 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/09/2019 a 30/09/2019

Certificação Número: 2019090105404221621853

Informação obtida em 09/09/2019 16:14:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

fls 599

MINUTA

2 ° Termo Aditivo ao Contrato nº 329/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a AVENIDA BRASIL, 306 SALA 2 CXPST 21 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 84.840.503/0001-65, neste ato por seu representante legal, ALDEMIR COLUSSI, CPF:524.947.489-68 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de preços nº 12/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato s firmado em 31/08/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de preços nº 12/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 258/2019, fica prorrogado o prazo de Execução e Vigência do Contrato nº 329/2018 para mais 3 (Três) meses a partir da data de término do contrato. Encerrando-se a Execução dia 11/10/2019 e sua Vigência dia 30/11/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 30 de agosto de 2019

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ALDEMIR COLUSSI
Representante Legal
A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME
Contratada

APROVAÇAO DE MINUTA DE ADITIVO

(X)Aprovo a presente minuta de aditivo na forma que se encontra redigida.

( )Não Aprovo a presente minuta de aditivo na forma que se encontra redigida.

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Municipal
OAB/PR 56.675

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Jurídico de
Capanema - PR
Dec. nº 6001/2015
OAB/PR 56.675

2.° Termo Aditivo ao Contrato n° 329/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a AVENIDA BRASIL, 306 SALA 2 CXPST 21 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o n° 84.840.503/0001-65, neste ato por seu representante legal, ALDEMIR COLUSSI, CPF:524.947.489-68 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de preços n° 12/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato s firmado em 31/08/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de preços n° 12/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU N° 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, em conformidade com o Parecer Jurídico n° 258/2019, fica prorrogado o prazo de Execução e Vigência do Contrato n° 329/2018 para mais 3 (Três) meses a partir da data de término do contrato. Encerrando-se a Execução dia 11/10/2019 e sua Vigência dia 30/11/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 30 de agosto de 2019

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ALDEMIR COLUSSI
Representante Legal
A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME
Contratada

EXPEDIENTE

ORGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA
AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005,
LEI MUNICIPAL Nº 1.648/2018

COORDENAÇÃO/DIREÇÃO: Valdeci Alves dos Santos - Secretaria de Administração

DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO: Anderson Ferreira dos Passos
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Anderson Ferreira dos Passos
DRT Nº 9975/PR

APOIO TÉCNICO: Pedro Augusto Santana

PREFEITURA DE CAPANEMA
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000
Fone: 46 3552-1321
E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br / adm@capanema.pr.gov.br
Capanema - Paraná
Prefeito Municipal: Américo Bellé
Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer
Secretário de Administração: Valdeci Alves dos Santos
Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski
Secretária de Educação, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz
Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti
Secretário de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso
Secretário de Saúde: Jonas Welter
Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Adelar Kerber
Chefe de Gabinete: Paulo de Souza

Controladora Geral do Município: Arieli Caciara Wons

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA
R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000
Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329
Fax: (46) 3552-3217
E-mail: capanemacamara@gmail.com
Capanema - Paraná
Vereador: Valdomiro Brizola - Presidente
Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente
Vereador: Edson Wilmsen - 1º Secretário
Vereador: Delmar C. Balzan - 2º Secretário
Vereador: Airton Marcelo Barth
Vereador: Gilmar Pontin
Vereador: Ginésio J. Pinheiro
Vereador: Paulo C. Lothermann
Vereadora: Izolete Ap. Walker

ATOS LICITATÓRIOS

2.º Termo Aditivo ao Contrato nº 329/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a AVENIDA BRASIL, 306 SALA 2 CX-PST 21 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 84.840.503/0001-65, neste ato por seu representante legal, ALDEMIR COLUSSI, CPF:524.947.489-68 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de preços n° 12/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato s firmado em 31/08/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de preços n° 12/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017-OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 258/2019, fica prorrogado o prazo de Execução e Vigência do Contrato nº 329/2018 para mais 3 (Três) meses a partir da data de término do contrato. Encerrando-se a Execução dia 11/10/2019 e sua Vigência dia 30/11/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 30 de agosto de 2019

AMÉRICO BELLÉ Prefeito Municipal	ALDEMIR COLUSSI Representante Legal A.A. COLUSSI & CIA LTDA – ME Contratada

PREGÃO PRESENCIAL 91/2019
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL

O Prefeito Municipal Américo Bellé, torna pública, a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a retificação do Edital do Pregão Presencial 91/2019, com a alteração, e alterações descritas a seguir.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSTRUTOR/TREINADOR FÍSICO PARA A FORMAÇÃO DE ESCOLINHAS DESPORTIVAS, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.

No Edital item 15.4.5., Lote 06
Onde Lia-se:

Lote 06	a) RG e CPF do profissional que vai atuar b) Certificado de Graduação em Karatê (Faixa Preta), comprovar que possui faixa preta do estilo GOJU-RYU e comprovação de filiação do profissional junto a CBKI- Confederação Brasileira de Karatê Interestilos e também na Federação Estadual de Karetê Interestilos do Paraná PEKIP) c) Documento que comprove experiencia Profissional de no mínimo 4 (quatro) meses de trabalho, podendo ser cópia autenticada de contrato de trabalho ou Carteira de trabalho do profissional que irá atuar. (Deverá ser comprovado que o mesmo já executou trabalho igual ou semelhante ao objeto licitado) c.1) No caso do profissional possuir concurso publico e seja estatutário servirá uma declaração ou certidão emitida pelo RH comprovando o tempo de serviços e a área de atuação.

Leia-se:

Lote 06	a) RG e CPF do profissional que vai atuar b) Certificado de Graduação em Karatê (Faixa Preta), comprovar que possui faixa preta do estilo GOJU-RYU. c) Documento que comprove experiencia Profissional de no mínimo 4 (quatro) meses de trabalho, podendo ser cópia autenticada de contrato de trabalho ou Carteira de trabalho do profissional que irá atuar. (Deverá ser comprovado que o mesmo já executou trabalho igual ou semelhante ao objeto licitado) c.1) No caso do profissional possuir concurso publico e seja estatutário servirá uma declaração ou certidão emitida pelo RH comprovando o tempo de serviços e a área de atuação.

No item 7. INFORMAÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS do Projeto Básico



1ª COPINHA REGIONAL DE FUTEBOL SOCIETY

LATICINIOS SANTA INEZ

Resultados - Boletim Oficial Nº 01

FUTEBOL SOCIETY Fase:01

07/09/2019-Sábado	SOCCER DO MAGRÃO	Parciais:	G	S	CAT
15:00	SAMBA DE SANTA ISABEL DO OESTE X 08 UNIÃO	01x08	4	W	SUB 15
15:40	ASSOC. ESPORTIVA SÃO CRISTÓVÃO02 X 03 PÉROLA D'OESTE	02x03	4	W	SUB 15
16:20	FLEX AUTO CENTER 01 X 02 ABC DE SÃO MIGUEL	01x02	3	W	SUB 15
17:00	JUVENTUS 05 X 00 COLÉGIO ROCHA POMBO	05x00	5	W	SUB 15

COMUNICADO

Atenção jovens alistados no serviço militar no período de janeiro a junho de 2019. O Juramento está marcado para o dia 17 de setembro as 14:00 horas no Centro de Eventos Martinho Lutero junto ao parque de exposições. Os jovens deverão estar no local com 1 hora de antecedência, para as devidas instruções. Maiores informações na Junta de serviço militar de Capanema ou pelo telefone 3552 2166.





Município de Capanema - PR

2 ° Termo Aditivo ao Contrato nº 329/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa A A COLUSSI & CIA LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada [illegible] Senhor AMÉRICO BELLE, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa A A COLUSSI & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a AVENIDA BRASIL, 305 SALA 2 EXPET 21 - CEP: 85750000 - MAINKU CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 84 840 803/0001-66, neste ato por seu representante legal, ALDEMIR COLUSSI, CPF 524 047 459-68 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes [illegible] na normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente [illegible] em decorrência do Edital Tomada de preços nº 12/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato e firmado em 31/08/2018, objeto do Edital de licitação Modalidade Tomada de preços nº 12/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAÍDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017. OPERAÇÃO 1041830-81. PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 258/2019, fica prorrogado o prazo de Execução e Vigência do Contrato nº 329/2018 para mais 3 (Três) meses a partir da data de término do contrato. Encerrando-se a Execução dia 11/10/2019 e sua Vigência dia 30/11/2019

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não alteradas por este Termo, permanecem inalteradas.

E por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 30 de agosto de 2019

AMÉRICO BELLE
Prefeito Municipal

ALDEMIR COLUSSI
Representante Legal
A A COLUSSI & CIA LTDA ME

Testemunhas:
Nome: [illegible] Nome: [illegible]
CAPANEMA PR

Município de Capanema - PR

LEI Nº 1.707, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.

Altera as Leis 1.251/2009 e 1.450/2013.

Art. 1º O número de vagas de que trata o artigo 3º, da Lei Municipal nº 1.251/2009, alterada pela Lei nº 1.620/2017, passa a ser de 120 (cento e vinte) vagas para Estágio Supervisionado.

Art. 2º O número de vagas de que trata o art. 3º, inciso III, da Lei Municipal nº 1.450/2013, alterada pela Lei nº 1.607/2017, passa a ser de 10 (dez) vagas para Auxiliar Administrativo.

Art. 3º O número de vagas de que trata o art. 3º inciso IV, da Lei Municipal nº 1.450/2013, alterada pela Lei nº 1.620/2017, passa a ser de 49 (quarenta e nove) vagas para Auxiliar de Serviços Gerais

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 19 de agosto de 2019.

Américo Belle
Prefeito Municipal

CAPANEMA PR





Município de Capanema - PR

NOTIFICAÇÃO

Ao Senhor
Paulo Fernando Lazzaretti Orso
Secretário Municipal de Planejamento

Notifico o Sr. Paulo Fernando Lazzaretti Orso, Secretário Municipal de Planejamento do vencimento de alguns contratos no mês de **NOVEMBRO/2019** conforme relação em anexo:

Solicito que nos encaminhe com antecedência as licitações que precisam ser feitas novamente, e também as solicitações de aditivo nos contratos que podem ser aditivados.

Segue abaixo a lista de Licitações que irão vencer, as demais informações como data do vencimento, nº de contrato estão na relação em anexo.

MODALIDADE Nº	OBJETO
TOMADA DE PREÇOS 18/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR.
TOMADA DE PREÇOS 12/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO

Capanema, 03 de outubro de 2019

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira/ Presidente da Comissão Permanente de
Abertura e Julgamento de Licitações

Município de Capanema - 2019

Contratos a vencer

Seq.	Nº Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Valor	Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitação
3595	427-1/2019	4119	02/09/2019	01/11/2019	02/09/2019	01/11/2019	473.108,41	985 - COPINI & FILHOS LTDA - ME	Pregão	000103
3516	348-1/2019	4040	05/08/2019	02/11/2019	05/08/2019	02/11/2019	17.190,24	4044 - NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	Pregão	000097
2789	81-1/2018	3312	07/03/2018	06/11/2019	07/03/2018	06/11/2019	36.000,00	44198 - IZIDIO PAULO DE OLIVEIRA SILVA MOURA	Processo dispensa	000012
3335	167-1/2019	3858	07/05/2019	06/11/2019	07/05/2019	06/11/2019	70.905,37	292 - PARANA EQUIPAMENTOS S A	Processo inexigibilidade	000008
3336	168-1/2019	3859	07/05/2019	06/11/2019	07/05/2019	06/11/2019	46.887,64	398 - ICAVEL VEICULOS LTDA	Processo inexigibilidade	000009
3528	360-1/2019	4052	08/08/2019	07/11/2019	08/08/2019	07/11/2019	2.500,00	74460 - CLAUDIOMIR CANDIOTTO 04465290950	Processo dispensa	000037
3133	422-1/2018	3656	13/11/2018	12/11/2019	13/11/2018	12/11/2019	64.680,00	53813 - AGROTOMA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	Pregão	000125
3134	423-1/2018	3657	13/11/2018	12/11/2019	13/11/2018	12/11/2019	56.340,00	65284 - JEAN PYER VIVIAN EIRELI-EPP	Pregão	000125
3135	424-2/2018	3658	13/11/2018	12/11/2019	13/11/2018	12/11/2019	80.040,00	39697 - AUTO POSTO CANAAN LTDA	Pregão	000128
3136	425-1/2018	3659	13/11/2018	12/11/2019	13/11/2018	12/11/2019	150.499,00	72580 - FLORENÇA CAMINHÕES S/A	Processo inexigibilidade	000009
3137	426-1/2018	3660	13/11/2018	12/11/2019	13/11/2018	12/11/2019	17.000,00	2950 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO	Processo dispensa	000037
3607	439-1/2019	4131	16/09/2019	15/11/2019	16/09/2019	15/11/2019	264.044,31	1749 - CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP	Pregão	000107
3608	440-1/2019	4132	16/09/2019	15/11/2019	16/09/2019	15/11/2019	740.116,27	55212 - COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA	Pregão	000107
3609	441-1/2019	4133	16/09/2019	15/11/2019	16/09/2019	15/11/2019	102.489,60	63790 - DSC AUTO PECAS EIRELI	Pregão	000107
3610	442-1/2019	4134	16/09/2019	15/11/2019	16/09/2019	15/11/2019	166.668,42	68146 - H D COMERCIO DE MANGUEIRAS EIRELI	Pregão	000107
3611	443-1/2019	4135	16/09/2019	15/11/2019	16/09/2019	15/11/2019	207.354,46	72122 - WESTRACTOR PECAS E SERVICOS PARA TRATORES EIRELI	Pregão	000107
3068	358-1/2018	3068	17/09/2018	16/11/2019	17/09/2018	16/11/2019	92.400,00	54186 - A. R. FASOLO ENGENHARIA LTDA- ME	Pregão	000106
3619	451-1/2019	4143	19/09/2019	17/11/2019	19/09/2019	17/11/2019	19.885,00	70583 - ANDRESA SCHLOSSER 08000641941	Pregão	000109
3138	427-2/2018	3661	20/11/2018	19/11/2019	20/11/2018	19/11/2019	6.623,00	72826 - AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	Pregão	000127
3139	428-2/2018	3662	20/11/2018	19/11/2019	20/11/2018	19/11/2019	2.157,64	56810 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pregão	000127
3140	429-2/2018	3663	20/11/2018	19/11/2019	20/11/2018	19/11/2019	3.495,00	72822 - R A MARTINS-DISTRIBUIDORA	Pregão	000127
3622	454-1/2019	4146	24/09/2019	22/11/2019	24/09/2019	22/11/2019	181.101,40	888 - AUTO PECAS IZABELENSE LTDA - EPP	Pregão	000112
3623	455-1/2019	4147	24/09/2019	22/11/2019	24/09/2019	22/11/2019	331.530,00	985 - COPINI & FILHOS LTDA - ME	Pregão	000112
1714	256-1/2014	2038	08/12/2014	24/11/2019	08/12/2014	24/11/2019	64.800,00	51184 - DESENVOLVER - GESTAO E PLANEJAMENTO - EIRELI - ME	Tomada de preços	000018
3143	432-2/2018	3666	29/11/2018	28/11/2019	29/11/2018	28/11/2019	7.166,25	65774 - A.E.M.OESTE COMERCIAL EIRELI-ME	Pregão	000131
3144	433-2/2018	3667	29/11/2018	28/11/2019	29/11/2018	28/11/2019	8.206,80	68566 - CLAUDINA COMIRAN - ME	Pregão	000131
3145	434-2/2018	3668	29/11/2018	28/11/2019	29/11/2018	28/11/2019	1.275,00	2644 - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA -	Pregão	000131
3146	436-2/2018	3670	29/11/2018	28/11/2019	29/11/2018	28/11/2019	158.048,00	169 - ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	Pregão	000130
3039	329-1/2018	3562	31/08/2018	30/11/2019	12/09/2018	11/10/2019	385.806,65	1724 - A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME	Tomada de preços	000012

Término vigência atual De: 01/11/2019
Término vigência atual Até: 30/11/2019
Ordenador por: Final vigência

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

De:	roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em:	quinta-feira, 3 de outubro de 2019 08:41
Para:	'planejamento.orso@capanema.pr.gov.br'
Assunto:	CONTRATOS A VENCER NO MÊS DE NOVEMBRO/2019
Anexos:	NOTIFICAÇÃO PAULO F L ORSO.pdf

Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Setor de Licitações
Município de Capanema-PR
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080
Capanema – PR cep 85760-000
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549
roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
licitacao@capanema.pr.gov.br

Município de Capanema – PR
Departamento de Engenharia

Processo: **2967/2019**
Data: 11/11/2019 Hora: 11:26
Assunto:
SOLICITACAO DO SETOR DE LICITACA
Requerente:
RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA

NOTIFICAÇÃO

A Empresa
AA COLUSSI & CIA LTDA -ME
CNPJ Nº 84.840.503/0001-65

Com relação ao contrato Administrativo nº 329/2018 cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO NORTE E AVENIDA ATAÍDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA-PR EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 856605/2017 OPERAÇÃO 1041530-91 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, oriundo do certame licitatório Tomada de preços 12/2018, no que tange a vigência do contrato segue o seguinte.

Na qualidade de fiscal de contrato venho por meio desse informar que o prazo de execução venceu em 11 de outubro de 2019, já a vigência vencerá em 31 de novembro de 2019.

NOTIFICO A EMPRESA AA COLUSSI & CIA LTDA-ME, CNPJ Nº 84.840.503/0001-65, que atualmente foi executado 32,95% dos serviços objeto do contrato, concluímos que não será possível o término da totalidade do mesmo no prazo estipulado atual.

Com isso solicitamos ao representante legal da empresa que apresente suas justificativas para a dilatação do prazo de execução.

Município de Capanema – PR
Departamento de Engenharia

Capanema, 11 de novembro de 2019

KATIA B. GULARTE
ENGENHEIRA CIVIL CREA PR 162804/D

Recebido em:
Por
Ass

A.A. Colussi & Cia Ltda.
Inscr. Estadual 90333600-50 Terraplenagem, Aterros e Transportes CNPJ 84.840.503/0001-65

A,

Comissão permanente

De Abertura e Julgamento de Licitações

Referente à: Prorrogação do prazo de vigência e execução da tomada de preço 12/2018 contrato 329/2018.

Prezados senhores,

Vimos pela presente, solicitar a vossa senhoria, prorrogação no prazo de vigência e execução da obra objeto do contrato acima referenciado, contrato de empresa especializada para a execução de pavimentação poliédrica com pedras irregulares, drenagem pluvial e terraplenagem, na Rua Tamoios, entre a Rua Rio Grande do Norte e a Avenida Ataídes Roberto Escher, no Bairro São Cristóvão, Capanema-Pr. Em atendimento ao Contrato de Repasse nº 856605/2017 Operação 1041530-91 programa Planejamento Urbano. Assim sendo, dimensionamos trinta (30) dias a partir desta data.

A. No decorrer da execução, aparecerão patologias na obra, as quais não havia possibilidades de serem previstas, tais como:

- Redes coletoras de esgoto e água potável em desconformidade com o projeto;

- Sendo assim, a empresa depende de análise e soluções dos fiscais da Caixa Econômica, nas quais, estamos no aguardo.

Ao exposto, colhemos a oportunidade em externar ás vossas senhorias, protesto de distinta consideração.

Capanema, 19 de Novembro de 2019.

A.A. COLUSSI E CIA LTDA

ALDO ALFREDO COLUSSI

A.A. Colussi & Cia Ltda
Aldo Alfredo Colussi
RG: 2.180.712-5
Sócio Administrativo

Processo: **3024/2019**
Data: 19/11/2019 Hora: 01:17
Assunto:
RECURSO EM PROCESSO LICITATORI(
Requerente:
AA COLUSSI CIA LTDA ME

000609

D E S P A C H O

Com relação a Tomada de Preços, nº 12/2018, Contrato Administrativo nº 329/2018, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. Encaminho esse PA ao Engenheiro Civil para análise e emissão de Parecer Técnico a respeito do pedido de Aditivo.

Capanema, 20 de novembro de 2019

Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Setor de Licitações

PARECER TÉCNICO Nº 20/2019

Com relação ao contrato administrativo nº 329/2018 cujo objeto **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL, E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO NORTE E AVENIDA ATAÍDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA-PR EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 856605/2017 OPERAÇÃO 1041530-91 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO,** oriundo da tomada de preço nº 12/2018, em resposta ao protocolo 3024/2019 referente solicitação de aditivo de prazo segue:

Conforme explicitado na solicitação de aditivo de prazo anexa ao PA, a obra objeto do contrato sofreu interferências da rede coletora de esgoto que acabou por coincidir com a projeção de parte da rede de Drenagem pluvial, necessitando alterações no seu traçado.

Para sanar tal fato, foi requerida análise técnica da Equipe da Caixa Econômica Federal. A solicitação fora encaminhada a regional de Cascavel na data de hoje e aguarda resposta para dar seguimento as alterações necessárias, uma vez que a obra é global. Cópia anexa ao PA.

Além disso, devido a interpretação equivocada do projeto, a rede de drenagem de águas pluviais fora executada em desconformidade com o projeto original. Após fiscalização realizada pelo fiscal da Caixa, foi necessário refazer todas as bocas de lobo e parte da tubulação que estava com diâmetro inferior ao especificado no projeto, conforme foto 1 abaixo. Consequentemente, o tempo

0006 V 1

gasto com retrabalho, impossibilitou a conclusão da obra dentro do prazo estimado.



Foto 1- Bocas de Lobo refeitas.

Diante dos fatos supra citados, me manifesto favorável a prorrogação de sessenta dias para que sejam executados os serviços restantes conforme cronograma abaixo.

PROJEÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO DA EXECUÇÃO PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA				
Nº Evento	Titulo do Evento	Percentual Executado	MESES EM PERCENTUAL	
			1º Mês	2º Mês
1	Serviços Preliminares	100,00		
2	Terraplenagem	100,00		
3	Drenagem	100,00		
4	Pavimentação Poliédrica	100,00		
5	Pavimentação em Calçadas	10,00	90,00	
6	Sinalização Vertical	-		100,00
7	Serviços Complementares	100,00		

Solicito seja encaminhado para análise e parecer do Eminente Procurador Jurídico.

Atenciosamente,

Capanema, 20 de novembro de 2019

KATIA B. GULARTE
ENGENHEIRA CIVIL CREA PR 162804/D

Município de Capanema - PR
Secretaria de Planejamento e Gestão de Projetos

Ofício nº 121/2019

Capanema, 19 de novembro de 2019.

PARA
PAUL ALBERT KOPF
Arquiteto e Urbanista
Representação da Gerência Executiva e Negocial de Governo Cascavel/PR

Prezado Senhor;

Com relação a obra Execução de Pavimentação Poliédrica com pedras irregulares, drenagem pluvial e terraplanagem na Rua Tamoios entre Rua Rio Grande do Norte e Av. Ataídes Roberto Escher no Bairro São Cristóvão, Contrato de Repasse OGU n° 856605/2017, Tomada de Preços 12/2018- Contrato 329/2018, segue:

Encaminho manifestação técnica relatando necessidade de alteração na referida obra, juntamente com memória de cálculo quantitativa e prancha única com detalhes e especificações de projeto.

Solicito ainda, análise e parecer da viabilidade sobre a alteração proposta, bem como orientações para continuidade da obra dentro das especificações do Contrato, uma vez que a obra é Preço Global.

Certos de podermos contar com atenção, e pronto atendimento, apresentamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Américo Belle
Prefeito Municipal

Américo Bellé
Prefeito Municipal

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA

COM RELAÇÃO A OBRA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLANAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAÍDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CONTRATO DE REPASSE OGU N° 856605/2017, Tomada de preços 12/2018- Contrato 329/2018, segue o seguinte.

Em vistoria no local da obra, especificamente no trecho Rua Tamoios com Rua Ceará, a empresa estava executando abertura da vala para assentamento dos tubos quando se deparou com a rede coletora de esgoto residencial existente.

Imediatamente quando nos deparamos com tal interferência, pedimos orientação de como proceder referente ao problema.

Pois bem, nessa entoada interrompemos a tubulação no local em que estava e ali executamos uma boca de lobo e reaterramos a restante da vala que estava aberta.

Também para solucionar o problema da Bacia de contribuição das águas pluviais daquela região executamos na esquina da Rua Ceará com a Rua Tamoios uma travessia ligando uma boca de lobo a outra.

Nesse sentido, segue abaixo uma memoria de cálculo de quantitativos dos serviços que seriam executados caso não houvesse a interferência da rede de esgoto conforme projeto original e de maneira análoga foi feita a mesma coisa para a solução adotada.

Tomamos tal posicionamento uma vez que, teríamos que acionar a concessionária de água e esgoto do Paraná (SANEPAR) para

deslocar toda a rede existente, gerando mais custos e atrasos na execução da obra.

Segue em anexo, uma prancha única com detalhes específicos das duas situações supra citadas bem como, planilhas orçamentárias com seus respectivos custos. Cabe observar que os preços unitários foram tirados da planilha vencedora do certame licitatório.

Memória de Cálculos de Quantitativos dos Serviços que Deveriam ser Executados:

1.3.1 - Escavação mecânica a céu aberto em material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica:

DN 800 = 36,00m

Comprimento = 36,00m

Cálculo do Volume:

36,00m (comprimento) x 1,00m (largura) x 1,20m (Altura)

TOTAL = 43,20m³

1.3.2 - Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m³- potência 88hp largura até 0,80m, profundidade de 1,50m à 3,00m com solo argiloso:

Volume de reaterro = Volume de escavação – Volume do tubo

DN 80 = ((0,80m x 0,80m x 3,14)/4 x 36) = 18,09m³

Volume de reaterro = 43,20 -18,09 = **25,11m³**

1.3.3 - Tubo de concreto para rede coletora de águas pluviais diâmetro 800mm junta rígida instalado em local com baixo nível de interferências fornecimento e assentamento.

DN 80 cm = 36,00m

Memória de Cálculos de Quantitativos dos Serviços Executados:

1.3.1 - Escavação mecânica a céu aberto em material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica:

DN 800 = 16,00m

Comprimento = 16,00m

Cálculo do Volume:

16,00m (comprimento) x 1,00m (largura) x 1,20m (Altura)

TOTAL = 19,20m³

1.3.2 - Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m³- potência 88hp largura até 0,80m, profundidade de 1,50m à 3,00m com solo argiloso:

Volume de reaterro = Volume de escavação – Volume do tubo

DN 80 = ((0,80m x 0,80m x 3,14)/4 x 16) = 8,04m³

Volume de reaterro = 19,20 - 8,04 = **11,16m³**

1.3.3 - Tubo de concreto para rede coletora de águas pluviais diâmetro 800mm junta rígida instalado em local com baixo nível de interferências fornecimento e assentamento.

DN 80 cm = 16,00m

Diante o exposto acima, com todas as peças técnicas anexas solicitamos ao eminente arquiteto orientação de como proceder para dar andamento da referida obra.

Capanema, 19 de novembro de 2019

Katia Brunhera Gularte
Engenheira Civil – CREA PR 162804/D

Município de Capanema - PR
Secretaria de Planejamento e Gestão de Projetos

Ofício nº 121/2019

Capanema, 19 de novembro de 2019.

CÓPIA

PARA
PAUL ALBERT KOPF
Arquiteto e Urbanista
Representação da Gerência Executiva e Negocial de Governo Cascavel/PR

Prezado Senhor;

Com relação a obra Execução de Pavimentação Poliédrica com pedras irregulares, drenagem pluvial e terraplanagem na Rua Tamoios entre Rua Rio Grande do Norte e Av. Ataídes Roberto Escher no Bairro São Cristóvão, Contrato de Repasse OGU n° 856605/2017, Tomada de Preços 12/2018- Contrato 329/2018, segue:

Encaminho manifestação técnica relatando necessidade de alteração na referida obra, juntamente com memória de cálculo quantitativa e prancha única com detalhes e especificações de projeto.

Solicito ainda, análise e parecer da viabilidade sobre a alteração proposta, bem como orientações para continuidade da obra dentro das especificações do Contrato, uma vez que a obra é Preço Global.

Certos de podermos contar com atenção, e pronto atendimento, apresentamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Américo Belle
Prefeito Municipal

Execução de Pavimentação Poliédrica com Pedras Irregulares, Drenagem Pluvial e terraplanegem na Rua Tamoios
Trecho entre a Rua Rio Grande do Norte e Avenida Ataídes - Bairro São Cristóvão
Contrato de Repasse OGU n° 856605/2017 - Tomada de Preços 12/2018 - Contrato 329/2018
Município de Capanema - Paraná

ORÇAMENTO QUANTITATIVO DE SERVIÇOS QUE DEVERIAM SER REALIZADOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTDADE	R$ C/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
1.3	**DRENAGEM**				
1.3.1	Escavação Mecânica a céu aberto em material de primeira categoria com escavadeira hidráulica capacidade 0,78m³	m³	43,2	2,91	125,71
1.3.2	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m³- potência 88hp largura até 0,80m, profundidad de 1,50m à 3,00m com solo argiloso.	m³	18,09	16,43	297,16
1.3.4	Tubo de concreto para rede coletora de águas pluviais diâmetro 800mm junta rígida instalado em local com baixo nível de interferências fornecimento e assentamento.	m	36	276,28	9.946,08
	TOTAL DO ORÇAMENTO				**10.368,95**

ORÇAMENTO QUANTITATIVO DE SERVIÇOS QUE FORAM REALIZADOS

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTDADE	R$ C/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
1.3	**DRENAGEM**				
1.3.1	Escavação Mecânica a céu aberto em material de primeira categoria com escavadeira hidráulica capacidade 0,78m³	m³	19,2	2,91	55,872
1.3.2	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m³- potência 88hp largura até 0,80m, profundidad de 1,50m à 3,00m com solo argiloso.	m³	8,04	16,43	132,07

1.3.4	Tubo de concreto para rede coletora de águas pluviais diâmetro 800mm junta rígida instalado em local com baixo nível de interferências fornecimento e assentamento.	m	16	276,28	4.420,48
	TOTAL DO ORÇAMENTO				**4.608,42**

RESUMO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	R$
1	Valor que deveria ser executado	10.368,95
2	Valor que foi executado	4.608,42
3	Diferença (1) -(2)	**5.760,53**

Katia B. Gularte
Engenheira CivilCREA PR 162804/D

Ø=1500 4,00 Metros

0006

Boca de Lobo: (A Executar)

1x1 / 23

Boca de Lobo: (Existente á Retirar)

03

Dissipador de Energia:(A Executar)

04

Alas P/ DN 1500mm: (A Executar)

02

Curvas de Nivel de Metro em Metro

Calçamento Existente

Ponto de Esgoto Residencial

Posto de Visita - Esgoto

PREFEITURA MUNICIPAL

SAÚDE PÚBLICA

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

OBRA:

PROJETO DRENAGEM PLUVIAL

Rua Tarcisio - São Cristóvão - Capanema Pr.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

KAETA GIULIETE

ÁREA TOTAL: 5.078,49m²

LOCALIDADE/BAIRRO: São Cristóvão

FOLHA:

ÚNICA

ESCALA: INDICADA

DATA: Novembro/2019

PREFEITO MUNICIPAL

00062

D E S P A C H O

Com relação a Tomada de Preços, nº 12/2018, Contrato Administrativo nº 329/2018, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. Após receber o Parecer Técnico da Fiscal de Contratos encaminho esse PA ao Procurador Jurídico para análise e emissão de Parecer Jurídico a respeito do aditivo de prazo de vigência.

Capanema, 20 de novembro de 2019

Róselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Setor de Licitações

PARECER JURÍDICO Nº 327/2019

INTERESSADO: Setor de Licitações.

ASSUNTO: Análise do pedido de aditivo de prazo do contrato nº 329/2018. Tomada de Preços nº 12/2018.

EMENTA: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA. OBRA PÚBLICA. SOLICITAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA CONTRATADA. PARECER TÉCNICO ENCARTADO NOS AUTOS. PARECER FAVORÁVEL CONDICIONADO A APURAÇÃO FUTURA DE EVENTUAL CRONOGRAMA NA EXECUÇÃO DA OBRA.

1. CONSULTA:

O Setor de Licitações encaminha para análise dessa Procuradoria Jurídica "Solicitação" apresentada pela A. A. Colussi & Cia. Ltda. (fl. 608), sob o protocolo n. 3.024/2019, manifestando a necessidade da prorrogação de execução contratual, em virtude de alterações na rede coletora de rede esgoto e água potável.

Instado, o Fiscal do contrato emitiu o Parecer Técnico n. 20/2019 (fls. 610/612) corroborando com as alegações da empresa contratada, bem como se manifestou favorável pela prorrogação contratual por 60 (sessenta) dias. Instruiu o parecer técnico com Ofício n. 121/2019, manifestação técnica dirigida à REGOV/CAIXA, orçamento quantitativo de serviços e projeto de drenagem pluvial.

Por meio do despacho de fl. 622, o PA foi encaminhado a Procuradoria. É o relatório.

2. PARECER:

Convém destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria, nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei 8.666/93, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico dos documentos apresentados, não cabendo nenhuma consideração acerca do mérito da presente contratação e da discricionariedade da Administração Pública ao traçar os parâmetros dos produtos entendidos como necessários.

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestação jurídica tem o escopo de apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico e recomendar alguma providência para salvaguardar a Administração e o erário público. Assim, parte das observações aqui expendidas se constitui em recomendações e, caso a Administração opte por não acatá-las, recomenda-se motivar o ato, nos termos do art. 50, da Lei nº 9.784/99. O cumprimento ou não das recomendações decorre do exercício da competência discricionária da autoridade administrativa, a qual responde isoladamente no caso de descumprimento das recomendações deste parecer ou pela ausência de fundamentação dos atos administrativos.

Contudo, as questões que envolvem a legalidade, isto é, os requisitos previstos no ordenamento jurídico são de observância obrigatória, os quais, para não serem aplicados, deve haver motivação e justificativa plausível para tanto.

Nesse rumo, forçoso reconhecer que a análise dos aspectos técnicos da Prorrogação contratual pretendida pela Administração não constitui tarefa afeta a este órgão jurídico, o que somente de forma excepcional poderemos adentrar, em razão da omissão grosseira do setor competente na descrição dos objetos ou na justificativa da contratação.

Ante as questões acima suscitadas, passaremos à análise dos aspectos relacionados à legalidade do feito.

2.1. Do Aditivo de Prazo:

O art. 57 da Lei nº 8.666/1993 admite a prorrogação de contratos, desde que observadas determinadas situações, elencadas no citado normativo legal.

Consoante se verifica da Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº 329/2018, acostado as fls. 269/280 e Ordem de Início de Serviço de fl. 293, prazo inicial de vigência era de 06 (seis) meses, iniciando-se em 29/11/2018 e encerrando em 28/05/2019. Por força do 1º e 2 Aditivo Contratual, o prazo de execução contratual foi elastecido até 30/11/2019.

Consoante o contido no Relatório Técnico nº 20/2019 da Secretaria de Planejamento e Projetos, a obra pública em questão é realizada com recursos

advindos do Contrato de Repasse nº 856605/2017, firmado entre o Município de Capanema e o Ministério das Cidades. Também é possível extrair, que a despeito do referido Contrato Administrativo ter sido assinado em 31/08/2018, a ordem de início da execução da obra somente ocorreu em 28/11/2019 (fl. 293), tudo em conformidade com o contido na Cláusula 4.2.1 do referido Contrato.

Ademais, considerando o contido no Relatório Técnico nº 20/2019, extraísse que a obra em questão se encontra em fase final de execução, porém o descumprimento do prazo de execução da obra, de fato, tem relação a adversidades identificadas durante a execução da obra relacionadas a coletora de esgoto e água potável. Todavia, cabe ressaltar que análise das responsabilidades do atraso da obra serão prorrogadas para o término da execução contratual.

Desse modo, considerando o exposto, a Procuradoria manifesta-se pelo acolhimento do pedido de aditivo de prazo de execução por mais 02 meses, finalizando 11/12/2019, com fundamento no Relatório Técnico nº 16/2019. De igual forma, manifesta-se favorável a prorrogação do prazo de vigência contratual, pelo mesmo prazo de 02 meses, finando em 31/01/2020.

Não obstante, pelo que consta do PA, não traz quaisquer outros ônus à Administração Pública, além dos originariamente previstos. Ademais, tem-se que a prorrogação contratual decorre da contínua necessidade dos serviços prestados, situação autorizada pelo art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.

Urge esclarecer, por fim, porque notória a relevância, que a veracidade de todas as informações e documentação apresentadas são de inteira responsabilidade dos contraentes.

Neste ponto, convém chamar atenção para a possibilidade de aplicação de sanções de natureza política, administrativa, civil e penal **em caso de malversação da verba pública,** decorrentes de improbidade administrativa, nos termos da Lei 8.429/92, bem como em desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, complementada pela Lei nº 10.028/2000, que criou outros tipos penais (crimes contra as finanças públicas), de modo a tomar mais efetivos os princípio constitucionais da Administração Pública (art. 37/CF).

3. CONCLUSÃO:

Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta pela **possibilidade** da celebração do termo aditivo de vigência e execução pelo prazo assinalado na Solicitação de fl. 455, qual seja: 02 (dois) meses, **devendo ainda, ser providenciada:**

a) Juntada aos autos de toda a documentação de regularidade fiscal prevista no art. 29 da Lei 8.666/93, de modo a comprovar que a contratada ainda satisfaz os requisitos de habilitação, caso a validade dos respectivos documentos apresentados na sessão pública esteja espirada;

b) Juntada das declarações do art. 16, I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal;

c) O encaminhamento prévio da minuta do aditivo, para aprovação da PGM, conforme preconiza o art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/1993;

d) A publicação do extrato do termo aditivo em análise na imprensa oficial (art. 61, parágrafo único, Lei 8666), com vistas a conferir-lhe validade e eficácia, em razão do princípio da publicidade, inerente a todos os atos administrativos.

É o parecer.

Capanema, de 27 de novembro de 2019.

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Municipal
OAB/PR 56.675

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Jurídico de
Capanema - PR
Dec. nº 6001/2015
OAB/PR 56.675

627

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Com relação a Tomada de Preços nº 12/2018, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. Acato o Parecer Jurídico nº 327/2019 pelo aditivo de Prazo de Vigência, Execução.

Solicito ao Setor de Licitações para que tome as devidas Providências no sentido da elaboração do Termo Aditivo.

Capanema, 28 de novembro de 2019

Américo Belle
Prefeito Municipal

Município de Capanema - PR

A Sra.

Roselia Kriger Becker Pagani

Pregoeira/Presidente da comissão

Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações

Com relação a Tomada de Preços nº 12/2018, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, informo que há dotação orçamentária para o Aditivo conforme orçamento abaixo:

Dotações:

Exercício da Despesa	Conta da Despesa	Funcional Programática	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Grupo da Fonte
2019	1490	08001.15.451.1501.1151	000	44.90.51.00.00	Do Exercício.

Capanema, 28 de novembro 2019

Cleomar Walter
Tec.Cont. CRC: PR 046483/O-2
CPF 723.903.959-53

fls. 629

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A.A. COLUSSI & CIA LTDA
CNPJ: 84.840.503/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:18:18 do dia 08/11/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/05/2020.
Código de controle da certidão: **5C3D.0E1A.17A1.B030**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

630

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 021123946-12

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **84.840.503/0001-65**
Nome: **A. A. COLUSSI & CIA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 01/04/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (03/12/2019 16:59:35)

631

Município de Capanema
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **25/01/2020**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

NEGATIVA Nº: 7905/2019

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QE52X44M3B7C

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

Inscrição Municipal	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
12726	84.840.503/0001-65	90333600 - 50	114

ENDEREÇO

AVENIDA BRASIL, 306 - SALA 2 CXPST 21 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR

CNAE / ATIVIDADES

Obras de terraplenagem, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Corretoras de contratos de mercadorias, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Certidão emitida no dia **Capanema, 26 de Novembro de 2019.**
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: **9ZTMH282QE52X44M3B7C**

Voltar | Imprimir

632

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 84.840.503/0001-65
Razão Social: A A COLUSSI E CIA LTDA
Endereço: AV BRASIL 306 SALA 2 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/11/2019 a 15/12/2019

Certificação Número: 2019111603582438377611

Informação obtida em 03/12/2019 17:01:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

3.º Termo Aditivo ao Contrato nº 329/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a AVENIDA BRASIL, 306 SALA 2 CXPST 21 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 84.840.503/0001-65, neste ato por seu representante legal, ALDEMIR COLUSSI, CPF:524.947.489-68 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de Preços n° 12/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 31/08/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de Preços n° 12/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 327/2019, fica prorrogado o prazo de Execuçao e Vigência do Contrato nº 329/2018 para mais 2 (dois) meses a partir da data de término do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 29 de novembro de 2019

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ALDEMIR COLUSSI
Representante Legal
A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME
Contratada

634

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, 03 de dezembro de 2019

AMERICO BELLE
Prefeito Municipal

ANTONINHO LUCHESE
Representante Legal
VIACAO SENTINELA LTDA - EPP
Fornecedor

3.º Termo Aditivo ao Contrato nº 329/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a AVENIDA BRASIL, 306 SALA 2 CX-PST 21 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 84.840.503/0001-65, neste ato por seu representante legal, ALDEMIR COLUSSI, CPF:524.947.489-68 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de Preços n° 12/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 31/08/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de Preços n° 12/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017-OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 327/2019, fica prorrogado o prazo de Execução e Vigência do Contrato nº 329/2018 para mais 2 (dois) meses a partir da data de término do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 29 de novembro de 2019

AMERICO BELLE
Prefeito Municipal

ALDEMIR COLUSSI
Representante Legal
A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME
Contratada

4.º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa ELISEU BUDKE - ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ELISEU BUDKE - ME, sediada na AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 232 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SANTA CRUZ, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 23.717.563/0001-09, neste ato representada pelo Sr. ELISEU BUDKE, portador do RG nº 21751456, e CPF nº 284.934.439-72, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento ao Parecer Jurídico nº 325/2019, fica recomposto o valor do item 14, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R$	Valor do aditivo R$
14	ROTA 13 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LINHA BONITA, LINHA GAÚCHA, LINHA CARBONE, NOVA GAÚCHA, CIDADE, TURNO MATUTINO E VESPERTINO	Km	18480,00	3.66	5.620,30	3,73	393,42

Valor total do Aditivo: R$ 393,42 (Trezentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos)

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.
E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, 13 de dezembro de 2019

AMERICO BELLE
Prefeito Municipal

ELISEU BUDKE
Representante Legal
ELISEU BUDKE - ME
Fornecedor

4.º Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços/Contrato nº 36/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa VIACAO IGUACU LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VIACAO IGUACU LTDA , sediada na R RIO DE JANEIRO, 1445 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 06.334.035/0001-43, neste ato representada pelo Sr. NIVALDO BRAUN, portador do RG nº 2.169.933-0, e CPF nº 335.113.819-91, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Presencial 13/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 06/02/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em atendimento ao Parecer Jurídico nº xxxx, fica recomposto o valor dos LOTES 01, itens 01 e 02, Lote 02, itens 01 e 02, Lote 03, itens 01 e 02, Lote 04, itens 01 e 02, Lote 10, itens 01 e 02 e Lote 12, itens 01 e 02, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Finanças de final de ano: como usar o 13º de forma consciente

É chegada a época do ano de muitas festas e confraternizações. Período em que muitos param para refletir e programar o próximo ano, momento de celebrar as conquistas e planejar os próximos desafios. É nesta época que, com a entrada do 13º salário, muitos brasileiros têm o mesmo desejo, o de fazer compras, mas antes é importante focar em uma tarefa nem tão prazerosa: quitar as dívidas!

De acordo com pesquisa realizada pela empresa de informações de crédito Boa Vista Serviços, mais de 70% da população brasileira estava com a renda comprometida para o pagamento de dívidas no primeiro semestre de 2019, número muito superior aos 56% no mesmo período de 2018. Nesse cenário, o 13º salário é um valioso aliado para quitar dívidas, principalmente no cartão de crédito e no cheque especial, que têm maiores taxas de juros. Nos casos em que o recurso não é suficiente para acertar as contas, é importante priorizar o pagamento das dívidas com a maior taxa, sendo fundamental renegociar as dívidas com parcelas que caibam no orçamento.

Para aqueles que não estão endividados, a recomendação é utilizar o dinheiro extra para começar uma reserva financeira ou reforçar seus investimentos, caso já possuam. Vale lembrar que o primeiro passo para poupar é viver dentro da sua realidade financeira, ou seja, seguir a premissa básica das finanças pessoais, gastando menos do que ganha e investindo com qualidade a diferença. Guardar parte ou todo o 13º salário pode ser o pontapé inicial para se ter uma vida financeira saudável. E, para alcançar esse objetivo, existem muitas formas. As pessoas podem, por exemplo, estabelecer um percentual do salário mensal que ficará guardado todo o mês. É importante que essa quantia não comprometa as finanças do mês, para que fique confortável e seja um valor possível de guardar. Esse valor deve ser retirado logo ao receber o salário, antes mesmo de começar a pagar suas despesas, para garantir que o dinheiro seja poupado.

Existem também alternativas, como programar esse percentual de retirada do salário em débito em conta assim que for depositado, destinando para um investimento apropriado. Para ajudar quem não sabe identificar boas opções de investimentos, existem ferramentas gratuitas como o Investindo Juntos (www.investindojuntos.com.br), que desmistifica o mercado de investimentos e auxilia as pessoas a encontrar a opção mais indicada para o seu perfil.

Planejamento e organização são as chaves para tudo, inclusive para poupar. Por isso, este é o momento de pensar no 13º salário como um benefício, não só imediato, mas a longo prazo também.



Município de Capanema - PR

3.º Termo Aditivo ao Contrato nº 329/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a AVENIDA BRASIL, 306 SALA 2 CXPST 21 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 84.840.503/0001-65, neste ato por seu representante legal, ALDEMIR COLUSSI, CPF:524.947.489-68 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de Preços nº 12/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 31/08/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de Preços nº 12/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 327/2019, fica prorrogado o prazo de Execução e Vigência do Contrato nº 329/2018 para mais 2 (dois) meses a partir da data de término do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 29 de novembro de 2019

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ALDEMIR COLUSSI
Representante Legal
A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME
Contratada

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3558-1391
CAPANEMA - PR

RESULTADO DE DISPENSA
DISPENSA Nº 035/2019

O MUNICIPIO DE PLANALTO, com base no art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93, Decreto Federal 9.412/2018 e suas alterações posteriores, dispensa de licitação a despesa abaixo especificada.

OBJETO: Contratação emergencial de empresa para a aquisição de MEDICAMENTOS, INSUMOS E DIETAS ESPECIAIS, destinados às ações de promoção à saúde da Secretaria de Saúde e dispensação nas UNIDADES DE SAÚDE do município de Planalto – PR.

EMPRESA: FERNAMED LTDA - ME.
VALOR: R$2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais).

EMPRESA: AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMETNOS LTDA.
VALOR: R$2.553,00 (Dois mil quinhentos e cinquenta e três reais).

EMPRESA: MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI.
VALOR: R$ 1.671,30 (hum mil seiscentos e setenta e um reais e trinta centavos).

EMPRESA: ALVES E SARTOR LTDA – ME.
VALOR: R$439,30 (quatrocentos e trinta e nove reais e trinta centavos).

EMPRESA: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES.
VALOR: R$ 626,92 (seiscentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos).

EMPRESA: AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA.
VALOR: R$405,20 (quatrocentos e cinco reais e vinte centavos).

EMPRESA: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A.
VALOR: R$ 1.150,00 (um mil cento e cinquenta reais).

VALOR TOTAL GERAL: R$9.345,72 (Nove mil trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos).

DATA: 18 de novembro de 2019.

INÁCIO JOSE WERLE
Prefeito Municipal

A.A. Colussi & Cia Ltda.
Terraplenagem, Aterros e Transportes
Inscr. Estadual 90333600-50 CNPJ 84.840.503/0001-65

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

A/C PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERENTE TOMADA DE PREÇO Nº 12/2018 CONTRATO Nº 329/2018

ASSUNTO; PEDIDO DE INDENIZAÇÃO FINANCEIRA

Com relação à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM PLUVIAL NA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO NORTE E AVENIDA ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO EM CAPANEMA-PR EM ATENDIMENTO AO CONTRATO REPASSE Nº 855505/2017 OPERAÇÃO Nº 1041530-91 PLANEJAMENTO URBANO.

Cabe observar que no decorrer da execução aparecerão patologias não previstas no projeto básico, tais como já mencionadas e relatadas no memorando interno 04/2019 cujo protocolo 607/2019 que foi endereçado pelo então engenheiro da obra RUBENS DE SOUZA ao secretário municipal de planejamento PAULO ORSO, a fim de dar ciência ao problema e relatório emitido pela empresa no dia 15 de março de 2019, cujas correções foram executadas pela empresa a fim de possibilitar o andamento da obra.

DEMONSTRATIVO

Trecho; Entre as ruas Rio Grande do Norte e Ceará

Escavação – Retirada – Instalação e Aterro

Extensão 130 m Tubos 600 mm

Trecho: Entre a Rua Ceará e o Bueiro

Extensão 60 m Tubos 800 mm

Processo: 8/2020
Data: 06/01/2020 Hora: 09:36
Assunto:
SOLICITACAO DO SETOR DE LICITACA
Requerente:
ALDO ALFREDO COLUSSI

A.A. Colussi & Cia Ltda.
Inscr. Estadual 90333600-50
Terraplenagem, Aterros e Transportes
CNPJ 84.840.503/0001-65

Descrição	Unid	Quant	Custo Unitário	Unitário com BDI	Valor total com BDI
Escavação mecânica, a céu aberto em material de 1ª categoria com escavadeira hidraulica capacidade de 0.78 m³	m³	114,40	2,29	R$ 2,91	R$ 332,90
Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira capacidade de caçamba da retro 0.26 m³ potência 88 HP largura até 0.80 m profundidade de 1.5 a 3.0 m com solo argiloso arenoso.	m³	77,66	12,95	R$ 16,43	R$ 1.275,95
Tubos de concreto rede coletora de águas pluviais diametro 600 mm junta rigida instalado em local de baixo nivel de interferencia fornecimento e assentamento.	m	130,00	145,66	R$ 184,77	R$ 24.020,10
Drenagem					R$ 25.628,96
Escavação mecânica, a céu aberto em material de 1ª categoria com escavadeira hidraulica capacidade de 0.78 m³	m³	90,00	2,29	R$ 2,91	R$ 261,90
Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira capacidade de caçamba da retro 0.26 m³ potência 88 HP largura até 0.80 m profundidade de 1.5 a 3.0 m com solo argiloso arenoso.	m³	59,86	12,95	R$ 16,43	R$ 983,50
Tubos de concreto rede coletora de águas pluviais diametro 800 mm junta rigida instalado em local de baixo nivel de interferencia fornecimento e assentamento.	m	60,00	217,80	R$ 276,28	R$ 16.576,80
Drenagem					R$ 17.822,20
Total Geral					R$ 43.451,16

Nestes termos solicito deferimento conforme planilha e documentos anexos.

ALDEMIR COLUSSI
Sócio Gerente

EDER LORENZETTI
Engenheiro Responsavel
Crea-PR-109558/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

A/C

RUBENS L. R. SOUZA,

RELATÓRIO

Referente Drenagem e Pavimentação, Rua Tamoios:

Constatamos que na Rua tamoios,entre o bueiro grande e a Rua Ceará, não tem tubulação e no projeto consta como existente.

Constatamos também que na Rua Tamoios, entre as Ruas Ceará e Rio Grande do Norte, a tubulação está toda entupida.

Para estes concertos e reposições, orçamos em 70 (setenta) tubos de 80cm, e 87 (oitenta e sete) tubos de 60cm. Também será necessário: 20 horas de maquina Escavadeira Hidráulica, para escavação, retirada e reposição. E 12 horas de Pá Carregadeira, e mão de obra para execução.

Solicitamos que nos apresente, uma sugestão para sanarmos este problemas.

Agradecemos a sua atenção, e ficamos no aguardo.

Atenciosamente.

Capanema 15 de março de 2019.

A. A. Colussi & Cia Ltda

Aldo Alfredo Colussi

Aldo Alfredo Colussi PG PR 1.139.712-5

sócio

84.840.503/0001-65

A.A COLUSSI & CIA LTDA

Rua Padre Cirilo, 303

85760-000 Capanema PR

Município de Capanema – PR
Departamento de Engenharia

MEMORANDO INTERNO 04/2019

Processo: 607/2019
Data: 26/03/2019 Hora: 05:21
Assunto: SOLICITACAO PARA SETOR DE PLAN
Requerente: RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA

A/C:
Srº **PAULO FERNANDO LAZZARETTI ORSO**
Secretário Municipal de Planejamento

Com relação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO NORTE E AVENIDAA ATAÍDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA-PR EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 856605/2017 OPERAÇÃO 1041530-91 PLANEJAMENTO URBANO oriundo do processo licitatório tomada de preço nº 12/2018 e contrato administrativo nº 329/2018 no que diz respeito a execução da referida obra segue o seguinte.


Foi contratado o Profissional Engenheiro Civil Luiz Eduardo Urban com CREA PR 116829/D com a finalidade de fazer o levantamento de campo do sistema de drenagem pluvial existente bem como a terraplenagem a fim de projetar um novo sistema dentro das normas e padrões adotados pelo Ministério das Cidades, cabe observar que assim o referido profissional o fez.

Pois bem na rua Tamoios nas proximidades com a rua Ceará segundo levantamento marcava originalmente 60,00 m de tubulação existente deixando como objeto do orçamento somente as bocas de lobo.

No entanto ao ser mexido no local, para se executar as bocas de lobo projetadas, constatou se que os 60,00 m de tubulação estão na sua totalidade entupidos, os deixando inservíveis para o uso que se propõem, conforme é demonstrado nas fotos abaixo.



0006641

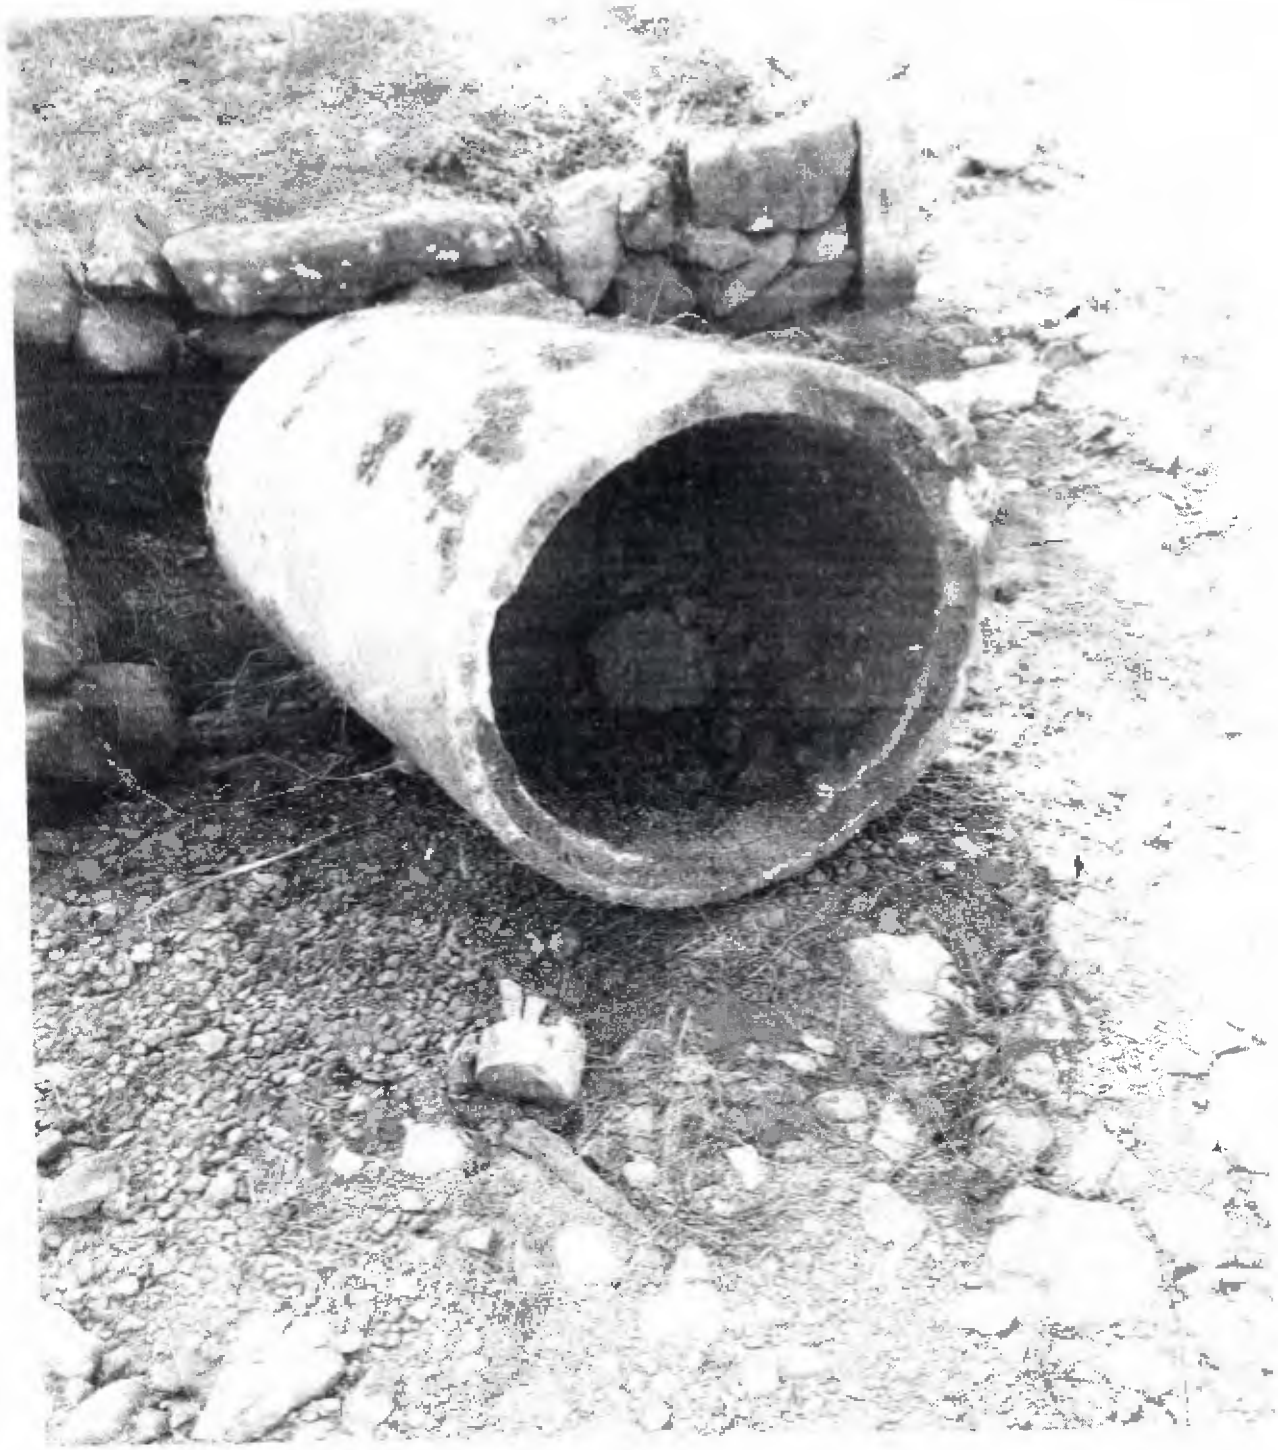

000642

Diante o exposto acima coloco ao eminente Secretário Municipal de planejamento a necessidade de aportarmos mais 60 m de tubulação de concreto com DN 60 cm MF, não previsto na fase do projeto básico.

Segue em anexo um croqui com a posição exata da localização dos tubos existentes e entupidos.

Capanema 08 de março de 2019

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 88.296/D

D E S P A C H O

Com relação a Tomada de Preços, nº 12/2018, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. Encaminho esse PA a Fiscal de Contratos para análise e emissão parecer técnico a respeito do protocolo nº 08/2020.

Capanema, 13 de janeiro de 2020

Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Setor de Licitações

641

PARECER TÉCNICO Nº 01/2020

Com relação ao contrato Administrativo nº 329/2018 cujo objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES DRENEGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AVENIDA ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÁO EM CAPANEMA PR EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017 OPERAÇÃO 1041530-91 – PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO**, oriunda do certame licitatório Tomada de Preço nº 12/2018 no que tange ao conteúdo do protocolo 08/2020 e despacho folha 243 do PA, segue:

DOS FATOS:

Primeiramente, conforme ART nº 20191231391 o engenheiro civil responsável pela execução da obra é o profissional Iuri Felipe Manica Colussi. Portanto, o mesmo deveria elaborar o documento objeto do protocolo 08/2020.

No entanto, a solicitação foi assinada pelo profissional Eder Lorenzetti. Logo, é necessária uma ART de co-responsabilidade em nome do mesmo para que possa apresentar qualquer documento referente ao serviço contratado.

Em relação aos tubos utilizados para realização da drenagem pluvial relacionados na página 637 do PA, solicito apresentação da nota fiscal da compra para comprovação das quantidades e valores. Pois, não há qualquer documento autorizando a execução dos serviços complementares apontados no referido protocolo. Existe

615

apenas uma informação do Engenheiro Rubens ao Secretário de Planejamento atestando que 60,00 metros da tubulação existente nas proximidades da Rua Ceará estavam entupidas e não tinham mais funcionalidade. Anexa página 639 do PA.

Solicito a Comissão Permanente de Licitação encaminhamento ao Empreiteiro para providências.

Capanema, 15 de janeiro de 2.020

KATIA BRUNHERA GULARTE
ENGENHEIRA CIVIL
CREA PR 162804/D

KATIA B. GULARTE
Engª Civil
CREA-PR 162804/D

apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br

De:	apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em:	quarta-feira, 15 de janeiro de 2020 14:34
Para:	'colussitictac01@gmail.com'
Assunto:	Resposta ao pedido de indenização financeira protocolado sob o nº 08/2020
Anexos:	Parecer Técnico 01-2020.pdf

Boa tarde.

Referente ao pedido de indenização Financeira Protocolado sob o Nº 08/2020, segue em anexo o Parecer Técnico 01/2020 emitido pela fiscal do Contrato Sra Katia Gularte.

Confirme o recebimento!

SETOR DE LICITAÇÕES – (46) 3552-1321
MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: quarta-feira, 15 de janeiro de 2020 14:34
Para: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00137.txt

The original message was received at Wed, 15 Jan 2020 14:34:08 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <colussitictac01@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <colussitictac01@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

A.A. Colussi & Cia Ltda.
Inscr. Estadual 90333600-50 Terraplenagem, Aterros e Transportes CNPJ 84.840.503/0001-65

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

A/C PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERENTE TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2018 CONTRATO Nº329/2018

Conforme parecer técnico número 01/2020 emitido por KATIA BRUNHEIRA GULARTE Engenheira Civil CREA PR 162804/D, apresentamos os documentos solicitados tais como ART numero 1720200414406 de Co-responsabilidade em anexo e notas fiscais de compra de tubos:números 8066-8069-8102-8106-8289-8290-8363-8557-9005-9021,informamos ainda que a empresa sempre possuiu estoque de tubos,comprados ou recebidos em permuta com empresas especializadas nesta atividade de confecção de tubos e meio fios.

Observamos novamente que foi feito um relatório e um memorando em março de 2018 e entregue ao Secretario Municipal de Planejamento Sr PAULO FERNANDO LAZZARETTI ORSO, apontando as irregularidades e os problemas que foram sanados pela empresa para dar continuidade à execução da obra, pois até a presente data não recebemos qualquer orientação dos secretários responsáveis para resolver os problemas que geraram custos e prejuízos e desconforto para a empresa.

Comunicamos que, em função da demora das medições, os usuários estão danificando as calçadas e meio-fios, e a vegetação está invadindo os locais da obra ora mencionada e concluída.

Agradecemos a atenção e ficamos no aguardo

Capanema 17 de Fevereiro de 2020

ALDO ALFREDO COLUSSI

SÓCIO

84.840.503/0001-65

A.A COLUSSI & CIA LTDA

Rua Padre Cirilo, 303
85760-000 Capanema PR

Processo: 432/2020
Data: 17/02/2020 Hora: 09:10
Assunto:
SOLICITACAO DO SETOR DE LICITACA

Requerente:
ALDO ALFREDO COLUSSI

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART de Obra ou Serviço
1720200414406

Corresponsável à 20191231391

000043

1. Responsável Técnico

EDER LORENZETTI

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1708387420**

Carteira: **PR-109558/D**

Empresa Contratada: **A. A. COLUSSI E CIA LTDA - ME**

Registro: **10868**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA** CNPJ: **75.972.760/0001-60**

AVENIDA GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080
CENTRO - CAPANEMA/PR 85760-000

Contrato: (Sem número) Celebrado em: 19/12/2019

Valor: R$ 11.574,19 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

RUA TAMOIOS PERÍMETRO URBANO-CENTRO, S/N
SAO CRISTOVAO - CAPANEMA/PR 85760-000

Data de Início: 19/12/2019 **Previsão de término:** 30/01/2020

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA CNPJ: **75.972.760/0001-60**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
[Execução de obra] *de compactação - terraplenagem*	5.078,48	M2
[Execução de obra] *de pavimentação em pedra para vias urbanas*	5.078,48	M2
[Execução de obra] *de sistema de redes de águas pluviais*	5.078,48	M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM PREDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL , OBRAS DE ARTE E TERRAPLENAGEM

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Capanema, 19 de Dezembro de 2019
Local data

EDER LORENZETTI - CPF: 971.003.749-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - CNPJ: 75.972.760/0001-60

8. Informações

- **A ART é válida somente quando quitada,.conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.**
- **A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br**
- **A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.**

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R$ 88,78 **Registrada em : 28/01/2020** **Valor Pago: R$ 88,78** **Nosso número: 2410101720200414406**

090650

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TECNICOS", de um lado a empresa A. A. COLUSSI & CIA LTDA. com sede à AV. BRASIL, nº 306 SALA 2 inscrita no C.N.P.J. nº 84.840.503/0001-65 representada nesta ocasião por seu sócio: **Sr. ALDEMIR COLUSSI** RG nº 2.004.536-1 SSP/PR e CPF nº 524.947.489-68 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o(a) Sr. ÉDER LORENZETTI brasileiro(a),R.G.n.º 6.209.711-6 C.P.F. n.º 971.003.749-87 ,com titulo Profissional ENGENHEIRO CIVIL Cart. Crea-PR n.º 109558/D , doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como responsável técnico na área de Engenharia Civil em todas as obras que a contratante atuar, conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por: a partir do dia 09 de DEZEMBRO de 2019, com prazo de encerramento no dia 08 de DEZENBRO de 2022, a partir da sua assinatura;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 2 horas diárias;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado será de 2 salários mínimos mensais, correspondentes a R$1.996,00 (Um mil novecentos e noventa e seis reais) nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Cláusula 8ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de REALEZA – PR;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

REALEZA, 09 de NOVEMBRO de 2019.

ALDEMIR COLUSSI

ÉDER LORENZETTI

000351

RECEBEMOS DE INDUSTRIAL MULLER E PRE-MOLDADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO [100389] A. A. COLUSSI E CIA LTDA // Carga.: 999999 // Valor.: 2.295,30 // // Repr.: 51		NF-e Nº 000008066 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
INDUSTRIAL MULLER E PRE-MOLDADOS LTDA AV. PORTO ALEGRE, 000 - BAIRRO INDUSTRIAL - CEP:85750-000 - PLANALTO - PR TEL: (46)3555-2257	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000008066** FL. 1 /1 SÉRIE 002	CHAVE DE ACESSO 4119 0205 7876 2600 0103 5500 2000 0080 6610 0008 0660 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	141190025988988 12/02/2019 09:58:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9028878734		05.787.626/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A. A. COLUSSI E CIA LTDA [100389]			84.840.503/0001-65	12/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV BRASIL, 00303	CENTRO	85760-000		12/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPANEMA	(46)3552-1102	PR	9033360050	09:58:36

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/03/2019	2.295,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	721,87	2.295,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LT	0 - REMETENTE		ALP2278	PR	75.981.993/0001-29
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV INDEPENDENCIA	CAPANEMA			PR	3350075142

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	PC				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000204	TUBO CONCR M. F. C1 0.60X1.00M -	68109100	0101	5101	PC	35,0000	65,5800	0,00	2.295,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos Federal 308,72 Fonte: IBPT Valor aproximado dos tributos Estadual 413,15 Fonte: IBPT Cond. Pgto A PRAZO - 30D Fantasia: A. A. COLUSSI E CIA LTDA Ncm 68109100: 2.295,30 Cond. Pgto.: 1 - DINHEIRO/CHEQUE	

000352

RECEBEMOS DE INDUSTRIAL MULLER E PRE-MOLDADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO [100389] A. A. COLUSSI E CIA LTDA // Carga.: 999999 // Valor.: 2.295,30 // // Repr.: 51		NF-e **Nº 000008069** SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	CHAVE DE ACESSO
INDUSTRIAL MULLER E PRE-MOLDADOS LTDA AV. PORTO ALEGRE, 000 - BAIRRO INDUSTRIAL - CEP:85750-000 - PLANALTO - PR TEL: (46)3555-2257	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000008069** FL. 1 /1 SÉRIE 002	4119 0205 7876 2600 0103 5500 2000 0080 6910 0008 0697 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	141190026503933 12/02/2019 17:37:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9028878734		05.787.626/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A. A. COLUSSI E CIA LTDA [100389]			84.840.503/0001-65	12/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV BRASIL, 00303	CENTRO	85760-000		12/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPANEMA	(46)3552-1102	PR	9033360050	17:37:54

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/03/2019	2.295,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	721,87	2.295,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LT	0 - REMETENTE		ALP2278	PR	75.981.993/0001-29
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV INDEPENDENCIA	CAPANEMA			PR	3350075142

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	PC				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRDDUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000204	TUBO CONCR M. F. C1 0.60X1.00M -	68109100	0101	5101	PC	35,0000	65,5800	0,00	2.295,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos Federal 308,72 Fonte: IBPT Valor aproximado dos tributos Estadual 413,15 Fonte: IBPT Cond. Pgto A PRAZO - 30D Fantasia: A. A. COLUSSI E CIA LTDA Ncm 68109100: 2.295,30 Cond. Pgto.: 1 - DINHEIRO/CHEQUE	

RECEBEMOS DE INDUSTRIAL MULLER E PRE-MOLDADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO [100389] A. A. COLUSSI E CIA LTDA // Carga.: 999999 // Valor.: 4.812,50 // // Repr.: 51		NF-e Nº 000008102 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
INDUSTRIAL MULLER E PRE-MOLDADOS LTDA AV. PORTO ALEGRE, 000 - BAIRRO INDUSTRIAL - CEP:85750-000 - PLANALTO - PR TEL: (46)3555-2257	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000008102** FL. 1 /1 SÉRIE 002	CHAVE DE ACESSO 4119 0205 7876 2600 0103 5500 2000 0081 0210 0008 1029 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	141190032329799 21/02/2019 10:25:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9028878734		05.787.626/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A. A. COLUSSI E CIA LTDA [100389]			84.840.503/0001-65	21/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV BRASIL, 00303	CENTRO		85760-000	21/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPANEMA	(46)3552-1102	PR	9033360050	10:25:08

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/03/2019	4.812,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,53	4.812,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LT	0 - REMETENTE		AYY6295	PR	75.981.993/0001-29
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV INDEPENDENCIA	CAPANEMA			PR	3350075142
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	PC				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIOO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000205	TUBO CONCR M. F. C1 0.80X1.00M -	68109100	0101	5101	PC	35,0000	137,5000	0,00	4.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos Federal 647,28 Fonte: IBPT Valor aproximado dos tributos Estadual 866,25 Fonte: IBPT Cond. Pgto A PRAZO - 30D Fantasia: A. A. COLUSSI E CIA LTDA Ncm 68109100: 4.812,50 Cond. Pgto.: 1 - DINHEIRO/CHEQUE	

RECEBEMOS DE INDÚSTRIAL MULLER E PRE-MOLDADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO [100389] A. A. COLUSSI E CIA LTDA // Carga: 999999 // Valor.: 4.812,50 // // Repr.: 36		NF-e N° 000008106 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
INDUSTRIAL MULLER E PRE-MOLDADOS LTDA AV. PORTO ALEGRE, 000 - BAIRRO INDUSTRIAL - CEP:85750-000 - PLANALTO - PR TEL: (46)3555-2257	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **N° 000008106** FL. 1 /1 SÉRIE 002	CHAVE DE ACESSO 4119 0205 7876 2600 0103 5500 2000 0081 0610 0008 1060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	141190032510620 21/02/2019 14:02:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9028878734		05.787.626/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A. A. COLUSSI E CIA LTDA [100389]			84.840.503/0001-65	21/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV BRASIL, 00303	CENTRO		85760-000	21/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPANEMA	(46)3552-1102	PR	9033360050	14:01:59

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/03/2019	4.812,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,53	4.812,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LT	0 - REMETENTE		AYY6295	PR	75.981.993/0001-29
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV INDEPENDENCIA	CAPANEMA			PR	3350075142

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	PC				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
000205	TUBO CONCR M. F. C1 0.80X1.00M -	68109100	0101	5101	PC	35,0000	137,5000	0,00	4.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos Federal 647,28 Fonte: IBPT Valor aproximado dos tributos Estadual 866,25 Fonte: IBPT Cond. Pgto A PRAZO - 30D Fantasia: A. A. COLUSSI E CIA LTDA Ncm 68109100: 4.812,50 Cond. Pgto.: 1 - DINHEIRO/CHEQUE	

000355

RECEBEMOS DE INDUSTRIAL MULLER E PRE-MOLDADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO [100389] A. A. COLUSSI E CIA LTDA // Carga.: 999999 // Valor.: 2.623,20 // // Repr.: 1		NF-e **Nº 000008289** SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
INDUSTRIAL MULLER E PRE-MOLDADOS LTDA AV. PORTO ALEGRE, 000 - BAIRRO INDUSTRIAL - CEP:85750-000 - PLANALTO - PR TEL: (46)3555-2257	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000008289** FL. 1 /1 SÉRIE 002	CHAVE DE ACESSO 4119 0405 7876 2600 0103 5500 2000 0082 8910 0008 2895 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	141190063806223 10/04/2019 09:54:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9028878734		05.787.626/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A. A. COLUSSI E CIA LTDA [100389]			84.840.503/0001-65	10/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV BRASIL, 00303	CENTRO		85760-000	10/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPANEMA	(46)3552-1102	PR	9033360050	09:53:56

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/05/2019	2.623,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	2.623,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INDUSTRIAL MULLER E PRE-MOLDADOS LTDA	0 - REMETENTE		ALP2278	PR	05.787.626/0001-03
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA PORTO ALEGRE ESQUINA C/ PR-281	PLANALTO			PR	9028878734

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	PC				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000204	TUBO CONCR M. F. C1 0.60X1.00M -	68109100	0101	5101	PC	40,0000	65,5800	0,00	2.623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos Federal 352,82 Fonte: IBPT Valor aproximado dos tributos Estadual 472,18 Fonte: IBPT Cond. Pgto A PRAZO - 30D Fantasia: A. A. COLUSSI E CIA LTDA Ncm 68109100: 2.623,20 Cond. Pgto.: 1 - DINHEIRO/CHEQUE	

000356

RECEBEMOS DE INDUSTRIAL MULLER E PRE-MOLDADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO [100389] A. A. COLUSSI E CIA LTDA // Carga.: 999999 // Valor.: 930,80 // // Repr.: 1		NF-e Nº 000008290 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
INDUSTRIAL MULLER E PRE-MOLDADOS LTDA AV. PORTO ALEGRE, 000 - BAIRRO INDUSTRIAL - CEP:85750-000 - PLANALTO - PR TEL: (46)3555-2257	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000008290** FL. 1 /1 SÉRIE 002	CHAVE DE ACESSO 4119 0405 7876 2600 0103 5500 2000 0082 9010 0008 2900 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	141190063806488 10/04/2019 09:54:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9028878734		05.787.626/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A. A. COLUSSI E CIA LTDA [100389]			84.840.503/0001-65	10/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV BRASIL, 00303	CENTRO	85760-000		10/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPANEMA	(46)3552-1102	PR	9033360050	09:54:10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/05/2019	930,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	292,74	930,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LT	0 - REMETENTE		AXU2906	PR	75.981.993/0001-29
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV INDEPENDENCIA	CAPANEMA			PR	3350075142
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	PC				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000204	TUBO CONCR M. F. C1 0.60X1.00M -	68109100	0101	5101	PC	10,0000	65,5800	0,00	655,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000205	TUBO CONCR M. F. C1 0.80X1.00M -	68109100	0101	5101	PC	2,0000	137,5000	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos Federal 125,20 Fonte: IBPT Valor aproximado dos tributos Estadual 167,54 Fonte: IBPT Cond. Pgto A PRAZO - 30D Fantasia: A. A. COLUSSI E CIA LTDA Ncm 68109100: 930,80 Cond. Pgto.: 1 - DINHEIRO/CHEQUE	

000057

RECEBEMOS DE INDUSTRIAL MULLER E PRE-MOLDADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO [100389] A. A. COLUSSI E CIA LTDA // Carga.: 999999 // Valor.: 524,64 // // Repr.: 51		NF-e Nº 000008363 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
INDUSTRIAL MULLER E PRE-MOLDADOS LTDA AV. PORTO ALEGRE, 000 - BAIRRO INDUSTRIAL - CEP:85750-000 - PLANALTO - PR TEL: (46)3555-2257	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000008363** FL. 1 /1 SÉRIE 002	CHAVE DE ACESSO 4119 0405 7876 2600 0103 5500 2000 0083 6310 0008 3637 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	141190076407879 30/04/2019 17:19:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9028878734		05.787.626/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A. A. COLUSSI E CIA LTDA [100389]			84.840.503/0001-65	30/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV BRASIL, 00303	CENTRO		85760-000	30/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPANEMA	(46)3552-1102	PR	9033360050	17:19:13

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/05/2019	524,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	524,64
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LT	0 - REMETENTE		AXU2906	PR	75.981.993/0001-29
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV INDEPENDENCIA	CAPANEMA			PR	3350075142

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	PC				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRDD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000204	TUBO CONCR M. F. C1 0.60X1.00M -	68109100	0101	5101	PC	8,0000	65,5800	0,00	524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos Federal 70,56 Fonte: IBPT Valor aproximado dos tributos Estadual 94,44 Fonte: IBPT Cond. Pgto A PRAZO - 30D Fantasia: A. A. COLUSSI E CIA LTDA Ncm 68109100: 524,64 Cond. Pgto.: 1 - DINHEIRO/CHEQUE	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 05/02/2020 17:02:40 - ALTAIR

RECEBEMOS DE INDUSTRIAL MULLER E PRE-MOLDADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
[100389] A. A. COLUSSI E CIA LTDA // Carga.: 999999 // Valor.: 393,48 // // Repr.: 51

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000008557
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

INDUSTRIAL MULLER E PRE-MOLDADOS LTDA

AV. PORTO ALEGRE, 000 - BAIRRO INDUSTRIAL -
CEP:85750-000 - PLANALTO - PR
TEL: (46)3555-2257

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000008557 FL. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
4119 0705 7876 2600 0103 5500 2000 0085 5710 0008 5570

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	141190117998677 04/07/2019 15:01:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9028878734		05.787.626/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A. A. COLUSSI E CIA LTDA [100389]			84.840.503/0001-65	04/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV BRASIL, 00303	CENTRO	85760-000		04/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPANEMA	(46)3552-1102	PR	9033360050	15:01:41

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/08/2019	393,48									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	123,75	393,48
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LT	0 - REMETENTE		AXU2906	PR	75.981.993/0001-29
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV INDEPENDENCIA	CAPANEMA			PR	3350075142

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	PC				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000204	TUBO CONCR M. F. C1 0.60X1.00M -	68109100	0101	5101	PC	6,0000	65,5800	0,00	393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos Federal 52,92 Fonte: IBPT Valor aproximado dos tributos Estadual 70,83 Fonte: IBPT Cond. Pgto A PRAZO - 30D Fantasia: A. A. COLUSSI E CIA LTDA Ncm 68109100: 393,48 Cond. Pgto.: 1 - DINHEIRO/CHEQUE	

RECEBEMOS DE INDUSTRIAL MULLER E PRE-MOLDADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO [100389] A. A. COLUSSI E CIA LTDA // Carga.: 999999 // Valor.: 3.575,00 // // Repr.: 1		NF-e **Nº 000009005** SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
INDUSTRIAL MULLER E PRE-MOLDADOS LTDA AV. PORTO ALEGRE, 1680 - BAIRRO INDUSTRIAL - CEP:85750-000 - PLANALTO - PR **TEL:** (46)3555-2257	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000009005** FL. 1 /1 SÉRIE 002	CHAVE DE ACESSO 4119 1005 7876 2600 0103 5500 2000 0090 0513 2907 4421 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE DPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	141190191419522 22/10/2019 14:10:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9028878734		05.787.626/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A. A. COLUSSI E CIA LTDA [100389]			84.840.503/0001-65	22/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV BRASIL, 00303	CENTRO		85760-000	22/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPANEMA	(46)3552-1102	PR	9033360050	14:09:56

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/11/2019	3.575,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,34	3.575,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INDUSTRIAL MULLER E PRE MOLDADOS LTDA	0 - REMETENTE		AYY6295	PR	05.787.626/0001-03
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA PORTO ALEGRE ESQ. RUA QUATRO	PLANALTO			PR	9028878734
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	PC				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000205	TUBO CONCR M. F. C1 0.80X1.00M -	68109100	0102	5101	PC	20,0000	130,0000	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000206	TUBO CONCR M. F. C1 1.00X1.00M -	68109100	0102	5101	PC	5,0000	195,0000	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos Federal 480,84 Fonte: IBPT Valor aproximado dos tributos Estadual 643,50 Fonte: IBPT Cond. Pgto A PRAZO - 30D Fantasia: A. A. COLUSSI E CIA LTDA Ncm 68109100: 3.575,00 Cond. Pgto.: 1 - DINHEIRO/CHEQUE	

RECEBEMOS DE INDUSTRIAL MULLER E PRE-MOLDADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO [100389] A. A. COLUSSI E CIA LTDA // Carga.: 999999 // Valor.: 1.950,00 // // Repr.: 51		NF-e **Nº 000009021** SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
INDUSTRIAL MULLER E PRE-MOLDADOS LTDA AV. PORTO ALEGRE, 1680 - BAIRRO INDUSTRIAL - CEP:85750-000 - PLANALTO - PR TEL: (46)3555-2257	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA I - SAÍDA **1** **Nº 000009021** FL. 1 /1 SÉRIE 002	CHAVE DE ACESSO 4119 1005 7876 2600 0103 5500 2000 0090 2118 8341 0178 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	141190196773171 30/10/2019 08:25:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9028878734		05.787.626/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A. A. COLUSSI E CIA LTDA [100389]			84.840.503/0001-65	29/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV BRASIL, 00303	CENTRO		85760-000	29/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPANEMA	(46)3552-1102	PR	9033360050	08:24:54

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/11/2019	1.950,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	613,27	1.950,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INDUSTRIAL MULLER E PRE-MOLDADOS LTDA	0 - REMETENTE		ALP2278	PR	05.787.626/0001-03
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA PORTO ALEGRE ESQUINA C/ PR-281	PLANALTO			PR	9028878734

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	PC				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000205	TUBO CONCR M. F. C1 0.80X1.00M -	68109100	0102	5101	PC	15,00	130,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos Federal 262,27 Fonte: IBPT Valor aproximado dos tributos Estadual 351,00 Fonte: IBPT Cond. Pgto A PRAZO - 30D Fantasia: A. A. COLUSSI E CIA LTDA Ncm 68109100: 1.950,00 Cond. Pgto.: 1 - DINHEIRO/CHEQUE	

Município de Capanema - PR
Setor de Licitações

DESPACHO

Com relação a Tomada de Preços, nº 12/2018, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. Encaminho esse PA a Fiscal de Contrato para análise e emissão de Parecer técnico a respeito do protocolo nº 432/2020.

Capanema, 17 de fevereiro de 2020

Jeandra Wilmsen
Setor de Licitações

00 002

SOLICITAÇÃO

Com relação a Tomada de preço nº 12/2018, contrato de repasse nº856605/2017 referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ESCHER, no perímetro urbano do Município de Capanema-Pr, informo que:

A obra apresentou diversas dificuldades principalmente na construção de um bueirão, e posteriormente interpretação equivocada do projeto acarretando ainda mais atrasos no atendimento ao contrato e consequentemente o término da obra dentro do prazo estipulado.

Baseado nestas informações, solicito ao setor de licitação que proceda ADITIVO DE PRAZO do referido Contrato por mais 90 dias.

Capanema, 05 de março de 2020.

Paulo Fernando Lazzaretti Orso
Secretário de Planejamento

Paulo Fernando Lazzaretti Orso
Engº Agrônomo - CREA-SC 39552/D
Dec. 6286/2017
Sec. Mun. Planejamento e Projetos

Município de Capanema - PR
Setor de Licitações

DESPACHO

Com relação a Tomada de Preço, nº 12/2018, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.
Encaminho esse PA ao Procurador Jurídico para análise e emissão de Parecer Jurídico a respeito do aditivo de prazo de vigência.

Capanema, 05 dias de março de 2020

Jeandra Wilmsen
Setor de Licitações

Município de Capanema - PR
Procuradoria Jurídica

PARECER JURÍDICO Nº 102/2020

INTERESSADO: Setor de Licitações.

ASSUNTO: Análise do pedido de aditivo de prazo de vigência do contrato nº 222/2019. Tomada de Preços nº 12/2018.

EMENTA: ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCA. SOLICITAÇÃO APRESENTADA PELO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO. OBRA PÚBLICA. CONTRATO DE ESCOPO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO APÓS O SEU TERMO FINAL. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. PARECER JURÍDICO FAVORÁVEL CONDICIONADO.

1. CONSULTA:

O Setor de Licitações encaminha para análise dessa Procuradoria Jurídica o PA para análise da "Solicitação" de fl. 662, subscrita pelo Secretário de Planejamento, Paulo Fernando Lazzaretti Orso, que pugnou pela prorrogação da vigência contratual por 90 dias. É o relatório.

2. PARECER:

Convém destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria, nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei 8.666/93, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico dos documentos apresentados, não cabendo nenhuma consideração acerca do mérito da presente contratação e da discricionariedade da Administração Pública ao traçar os parâmetros dos produtos entendidos como necessários.

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestação jurídica tem o escopo de apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico e recomendar alguma providência para salvaguardar a Administração e o erário público. Assim, parte das observações aqui expendidas se constitui em recomendações e, caso a Administração opte por não acatá-las, recomenda-se motivar o ato, nos termos do art. 50, da Lei nº 9.784/99. O cumprimento ou não das recomendações decorre do exercício da competência discricionária da autoridade administrativa, a qual responde isoladamente no caso de descumprimento das recomendações deste parecer ou pela ausência de fundamentação dos atos administrativos.

Contudo, as questões que envolvem a legalidade, isto é, os requisitos previstos no ordenamento jurídico são de observância obrigatória, os quais, para não serem aplicados, deve haver motivação e justificativa plausível para tanto.

Nesse rumo, forçoso reconhecer que a análise dos aspectos técnicos da Prorrogação contratual pretendida pela Administração não constitui tarefa afeta a este órgão jurídico, o que somente de forma excepcional poderemos adentrar, em razão da omissão grosseira do setor competente na descrição dos objetos ou na justificativa da contratação.

Ante as questões acima suscitadas, passaremos à análise dos aspectos relacionados à legalidade do feito.

2.1. Do Aditivo de Prazo:

O art. 57 da Lei nº 8.666/1993 admite a prorrogação de contratos, desde que observadas determinadas situações, elencadas no citado normativo legal.

Consoante se verifica da Cláusula Quinta do Contrato nº 329/2018, acostado as fls. 269/280, o prazo de vigência inicial era de 12 meses, compreendendo o período de 31/08/2018 a 30/08/2019. Por força do 2º e 3º Termo Aditivo, a vigência contratual foi elastecida até 30/01/2019

Preliminarmente, convém destacar que a presente obra é executada com recursos oriundos do contrato de repasse n. 856605/2017/MCIDADES/CAIXA, que reza que a ordem de início da obra somente pode ser concedida a empresa contratada após a autorização expressa da REGOV.

No caso em questão, o contrato n. 329/2018, foi firmado em 31/08/2018, entretanto, a autorização de inicio da obra somente foi comunicada ao Município de Capanema/PR em 22/11/2018 (Ofício nº 3626/2018/REGOV/CV (fls. 289/292).

Não obstante, constata-se que durante a vigência e execução contratual, ocorreram problemas de interpretação do projeto conforme relatado pelo Secretário de Planejamento, fatos esses que merecem ser considerados na apreciação da solicitação do aditivo de prazo de vigência.

Desse modo, considerando o escopo contratual, bem como que a empresa em nada concorreu para o estrapolamento do prazo, em grau de excepcionalidade[1], este manifesta-se favorável a realização do aditivo contratual para recompor o prazo de vigência em 90 dias.

Outrossim, recomenda-se que seja dado conhecimento formal deste caso ao Sr. Prefeito Municipal, para que implemente rotina e medidas preventivas dentro da Secretaria de Planejamento, a crivo do Secretário, para melhor acompanhamento dos prazos contratuais.

Urge esclarecer, por fim, porque notória a relevância, que a veracidade de todas as informações e documentação apresentadas são de inteira responsabilidade dos contraentes.

Neste ponto, convém chamar atenção para a possibilidade de aplicação de sanções de natureza política, administrativa, civil e penal **em caso de malversação da verba pública,** decorrentes de improbidade administrativa, nos termos da Lei 8.429/92, bem como em desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, complementada pela Lei nº 10.028/2000, que criou outros tipos penais (crimes contra as finanças públicas), de modo a tomar mais efetivos os princípio constitucionais da Administração Pública (art. 37/CF).

3. CONCLUSÃO:

Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta:

a) pela **possibilidade** da celebração do termo aditivo de vigência contratual pelo prazo de 90 dias, **devendo ainda, ser providenciada: i)**Juntada aos autos de toda a documentação de regularidade fiscal prevista no

[1] É sabido que o contrato administrativo é sempre bilateral e, em regra, formal. Assim no que diz respeito a matéria aditamento e importante que a administração pública diligencie para que a assinatura dos termos de aditamento sejam promovidas até o termino da vigência contratual, uma vez que, após o decurso do prazo, numa visão positivista, o contrato considera-se extinto. **Todavia, nesses casos, o Tribunal tem relevado a referida inconsistência, tendo em vista o interesse público em jogo. Não seria razoável penalizar a sociedade em razão da inércia do agente público em adotar uma formalidade, ainda que de importante valor, e sobretudo em razão de tal providencia, embora extemporânea, ter sido implementada.** Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte tem caminhado nesse entendimento: Acórdãos 132/2005, 1727/2004 e 1257/2004, todos do Plenário. Por essa razão, a proposta de encaminhamento segue no sentido de determinar ao órgão que proceda tempestivamente a formalização dos aditamentos, de modo a evitar a execução de serviços sem cobertura contratual ou a própria extinção do contrato. **Acórdão 1808/2008 Plenário (Relatório do Ministro Relator)**

art. 29 da Lei 8.666/93, de modo a comprovar que a contratada ainda satisfaz os requisitos de habilitação, caso a validade dos respectivos documentos apresentados na sessão pública esteja espirada; **ii)** Juntada das declarações do art. 16, I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal; **iii)** O encaminhamento prévio da minuta do aditivo, para aprovação da PGM, conforme preconiza o art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/1993; e, **iv)** A publicação do extrato do termo aditivo em análise na imprensa oficial (art. 61, parágrafo único, Lei 8666), com vistas a conferir-lhe validade e eficácia, em razão do princípio da publicidade, inerente a todos os atos administrativos,

Pelo conhecimento formal deste caso ao Sr. Prefeito Municipal, para que implemente rotina e medidas preventivas dentro da Secretaria de Planejamento, a crivo do Secretário, para melhor acompanhamento dos prazos contratuais.

É o parecer.

Capanema, de 20 de março de 2020.

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Municipal
OAB/PR 56.675

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Jurídico de
Capanema - PR
Dec. nº 6001/2015
OAB/PR 56.675

Município de Capanema - PR

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Com relação a Tomada de Preços nº 12/2018, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. Acato o Parecer Jurídico nº 102/2020 pelo aditivo de Prazo de Vigência

Solicito ao Setor de Licitações para que tome as devidas Providências no sentido da elaboração do Termo Aditivo.

Capanema, 20 de março de 2020

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Município de Capanema - PR

A Sra.

Roselia Kriger Becker Pagani

Pregoeira/Membro da comissão

Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações

Com relação a Tomada de Preços nº 12/2018, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017-OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, informo que há dotação orçamentária para Aditivo conforme orçamento abaixo:

Dotações:

Exercício da Despesa	Conta da Despesa	Funcional Programática	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Grupo da Fonte
2020	1780	08.002.15.451.1501.1151	000	44.90.51.00.00	Do Exercício.

Capanema, 20 de março de 2020

Cleomar Walter

Tec.Cont. CRC: PR 046483/O-2

CPF 723 903.959-53

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A.A. COLUSSI & CIA LTDA
CNPJ: 84.840.503/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:26:40 do dia 11/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/09/2020.
Código de controle da certidão: **7FD6.FF9F.42AD.2FEE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 021685443-18

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **84.840.503/0001-65**
Nome: **A. A. COLUSSI & CIA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 18/07/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (20/03/2020 16:51:42)

0672

Município de Capanema
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **15/05/2020**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

NEGATIVA Nº: 1262/2020

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QET2C4X84EU3

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

Inscrição Municipal	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
12726	84.840.503/0001-65	90333600 - 50	114

ENDEREÇO

AVENIDA BRASIL, 306 - SALA 2 CXPST 21 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR

CNAE / ATIVIDADES

Obras de terraplenagem, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Corretoras de contratos de mercadorias, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Certidão emitida no dia **Capanema, 16 de Março de 2020.**
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: **9ZTMH282QET2C4X84EU3**

0001673

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 84.840.503/0001-65
Razão Social: A A COLUSSI E CIA LTDA
Endereço: AV BRASIL 306 SALA 2 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/03/2020 a 10/04/2020

Certificação Número: 2020031201341133812528

Informação obtida em 20/03/2020 16:53:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Município de Capanema - PR

4.° Termo Aditivo ao Contrato n° 329/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a AVENIDA BRASIL, 306 SALA 2 CXPST 21 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o n° 84.840.503/0001-65, neste ato por seu representante legal, ALDEMIR COLUSSI, CPF:524.947.489-68 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de preços n° 12/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 31/08/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de preços n° 12/2018, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU N° 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO**, em conformidade com o Parecer Jurídico n° 102/2020, fica prorrogado o prazo de Vigência do Contrato n° 329/2018 para mais **90(noventa)** dias corridos a partir da data de término do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 20 de março de 2020

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ALDEMIR COLUSSI
Representante Legal
A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME
Contratada

APROVAÇAO DE MINUTA DE ADITIVO

(X)Aprovo a presente minuta de aditivo na forma que se encontra redigida.

( )Não Aprovo a presente minuta de aditivo na forma que se encontra redigida.

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Municipal
OAB/PR 56.675

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Jurídico de
Capanema - PR
Dec. nº 6001/2015
OAB/PR 56.675

EXPEDIENTE

ORGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA
AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005,
LEI MUNICIPAL Nº 1.648/2018

COORDENAÇÃO/DIREÇÃO: Valdeci Alves dos Santos - Secretaria de Administração

DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO: Caroline Pilati

APOIO TÉCNICO: Pedro Augusto Santana

PREFEITURA DE CAPANEMA
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000
Fone: 46 3552-1321
E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br / adm@capanema.pr.gov.br
Capanema - Paraná
Prefeito Municipal: Américo Bellé
Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer
Secretário de Administração: Valdeci Alves dos Santos
Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski
Secretária de Educação, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz
Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti
Secretário de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso
Secretário de Saúde: Jonas Welter
Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Adelar Kerber
Chefe de Gabinete: Paulo de Souza

Controladora Geral do Município: Arieli Caciara Wons

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA
R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000
Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329
Fax: (46) 3552-3217
E-mail: capanemacamara@gmail.com
Capanema - Paraná
Vereador: Valdomiro Brizola - Presidente
Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente
Vereador: Edson Wilmsen - 1º Secretário
Vereador: Delmar C. Balzan - 2º Secretário
Vereador: Airton Marcelo Barth
Vereador: Gilmar Pontin
Vereador: Ginésio J. Pinheiro
Vereador: Paulo C. Lothermann
Vereadora: Izolete Ap. Walker

ATOS LICITATÓRIOS

AVISO DE SUSPENSÃO DE TOMADA DE PREÇOS

De acordo com a Decisão Administrativa datada de 23/03/2020, ficam suspensas por tempo indeterminado as TOMADAS DE PREÇOS conforme abaixo:

Nº DA TOMADA DE PREÇOS	OBJETO:
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV. PARANÁ, MUNICÍPIO DE CAPANEMA. EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7
02	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA TAMOIOS- EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7
03	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA PARAÍBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. INDEPENDÊNCIA, MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7
04	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA MADRE MARIA SILVINA- EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7
06	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA
07	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA BR 163, ACESSO A LINHA JACARÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA- EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7
08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA LOCALIDA DE PINHEIRO ACESSO A BOM RETIRO, EM ATENDIMENTO AO TAC-M. PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7.
09	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁSTICO, QUE SERÃO FEITOS RUAS GUAIRACAS, ENTRE A RUA DIONISIO WONS E RUA TERRITÓRIO DO ACRE. RUA TERRITÓRIO DO ACRE ENTRE A RUA GUAIRACAS E AV. INDEPENDÊNCIA. RUA GERALDINA MARTINI ENTRE RUA TERRITÓRIO DO ACRE E TRAVESSA MANGABEIRA. RUA OTILIA GUAITANELE ENTRE RUA TERRITÓRIO DO ACRE E TRAVESSA MANGABEIRA. EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7

Capanema, 23 de março de 2020

Américo Bellé
Prefeito Municipal

4.º Termo Aditivo ao Contrato nº 329/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a AVENIDA BRASIL, 306 SALA 2 CXPST 21 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 84.840.503/0001-65, neste ato por seu representante legal, ALDEMIR COLUSSI, CPF:524.947.489-68 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de preços nº 12/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 31/08/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de preços nº 12/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 102/2020, fica prorrogado o prazo de Vigência do Contrato nº 329/2018 para mais 90(noventa) dias corridos a partir da data de término do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
Capanema - PR, 20 de março de 2020

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ALDEMIR COLUSSI
Representante Legal
A.A. COLUSSI & CIA LTDA ME
Contratada

Caderno
Folha de Pérola D'Oeste
A Serviço da Verdade.

Pérola D'Oeste, 25 de março de 2020 — Caderno Jornal Folha de Capanema - Edição 447

Município de Capanema - PR

4 [illegible] Termo Aditivo ao Contrato nº 329/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, **MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor **AMÉRICO BELLÉ**, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a AVENIDA BRASIL, 306 SALA 2 CXPST 21 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 84.840.503/0001-65, neste ato por seu representante legal, ALDEMIR COLUSSI, CPF 524 947 489-68 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de preços nº 12/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 31/08/2018, objeto do Edital de licitação Modalidade Tomada de preços nº 12/2018, entre as partes acima identificadas para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO**, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 102/2020, fica prorrogado o prazo de Vigência do Contrato nº 329/2018 para mais 90(noventa) dias corridos a partir da data de termino do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 20 de março de 2020

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ALDEMIR COLUSSI
Representante Legal
A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME
Contratado

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone: (46)3552-1321
CAPANEMA - PR

Município de Capanema - PR

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2020

Ratifico em todos os seus termos e reconheço a **Dispensa de Licitação** para o AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE SOM E ILUMINAÇÃO DO AUDITÓRIO DE EVENTOS DA CASA DA CULTURA MAURICIA GUERRA, ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR., conforme parecer Jurídico fundamentado no Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93.

Art. 24. É dispensável a licitação:

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

VALOR TOTAL: R$ 15.[illegible](Quinze Mil, Novecentos e Dezenove Reais)

Capanema - PR, 20 de março de 2020

Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº [illegible]
Processo dispensa Nº [illegible]
Data de Assinatura [illegible]
Contratante Município de Capanema-Pr
Contratado [illegible]
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE SOM E ILUMINAÇÃO DO AUDITÓRIO DE EVENTOS DA CASA DA CULTURA MAURICIA GUERRA, ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR
Valor total: [illegible] (Quinze Mil, Novecentos e Dezenove Reais)
Américo Bellé
Prefeito Municipal

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone: (46)3552-1321
CAPANEMA - PR

Município de Capanema - PR

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06/2020

Ratifico em todos os seus termos e reconheço a **Inexigibilidade de Licitação** para o CONTRATAÇÃO [illegible] PALESTRANTE PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE [illegible]AÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR., conforme parecer Jurídico fundamentado no art. 25, incisos I e II da Lei 8.666/93

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;

VALOR TOTAL: R$ 12.575,04 (Doze mil, [illegible] e quatro centavos)

Item	Código	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço total
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL						[illegible]

Capanema - PR, 20 de março de 2020

Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO [illegible]/2020
Processo inexigibilidade Nº [illegible]/2020
Data de Assinatura [illegible]
Contratante Município de Capanema-Pr
Contratado GERALDO PEÇANHA DE ALMEIDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPAN
Valor total: R$12.575,04 (Doze Mil, Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Quatro centavos)
Américo Bellé
Prefeito Municipal

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone: (46)3552-1321
CAPANEMA - PR

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº10/2020
O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:
Modalidade: Tomada de Preços nº 10/2020
Tipo de Julgamento: Menor preço por item.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM NA RUA AMAMBAY, RUA TUPI, RUA TERRITÓRIO DO ACRE, RUA LERCY JOÃO ROMAN E RUA PARÁ, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO PARECER Nº 508/2019/SNDUR/CGOA/MDR E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 59553.001393/2017-11- TERMO DE COMPROMISSO 568/17-SDR
Valor da Licitação: R$ 357.283,85 Trezentos e Cinquenta e Sete Mil, Duzentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Abertura das propostas:13:30 horas do dia 15/04/2020
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de Souza, 1080- Capanema - Paraná - Centro
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br.
Capanema-PR, 19/03/2020.
Américo Bellé- Prefeito Municipal









Município de Capanema - PR

4.º Termo Aditivo ao Contrato nº 329/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a AVENIDA BRASIL, 306 SALA 2 CXPST 21 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 84.840.503/0001-65, neste ato por seu representante legal, ALDEMIR COLUSSI, CPF:524.947.489-68 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de preços nº 12/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 31/08/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de preços nº 12/2018, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO**, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 102/2020, fica prorrogado o prazo de Vigência do Contrato nº 329/2018 para mais **90(noventa)** dias corridos a partir da data de término do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 20 de março de 2020

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ALDEMIR COLUSSI
Representante Legal
A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME
Contratada

Município de Capanema – PR
Secretária de Planejamento

SOLICITAÇÃO

Tomada de Preços nº 12/2018

Senhora Presidente da Comissão Permanente de Licitações,

Sirvo-me do presente expediente para requerer a concessão de aditivo de prazo de vigência e execução do contrato nº 329/2018, tendo em vista que a obra encontra-se em parte final de execução, sendo que os atrasos são motivados pelos reflexos da pandemia do Coronavirus.

Ademais, se faz necessário o prazo adicional par que sejam concluídas as prestações de contas e pagamento dos serviços executados à empresa contratada.

Capanema, 29 de abril de 2020.

Atenciosamente.

Paulo Fernando Lazzaretti Orso
Secretaria Municipal de Planejamento

Município de Capanema - PR
Procuradoria Jurídica

PARECER JURÍDICO Nº 138/2020

INTERESSADO: Setor de Licitações.
ASSUNTO: Análise do pedido de aditivo de prazo do contrato nº 329/2018. Tomada de Preços nº 12/2018

EMENTA: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA. OBRA PÚBLICA. SOLICITAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. PRETENSÃO DE ADITIVO MOTIVADA PELA PARALIZAÇÃO DAS OBRAS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. PARECER FAVORÁVEL.

1. CONSULTA:

O Setor de Licitações encaminha para análise dessa Procuradoria Jurídica "Solicitação" subscrita pelo Secretário Municipal de Planejamento, Paulo Fernando Lazzaretti Orso, manifestando a necessidade da prorrogação de vigência e execução contratual por mais 4 (quatro) meses, em virtude da suspensão de todas as obras públicas (§ 7º, do art. 4º, do Decreto Municipal nº 6.757/2020).

Por meio do despacho do Setor de Licitações, o PA foi encaminhado a Procuradoria. É o relatório.

2. PARECER:

Convém destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria, nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei 8.666/93, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico dos documentos apresentados, não cabendo nenhuma consideração acerca do mérito da presente contratação e da discricionariedade da Administração Pública ao traçar os parâmetros dos produtos entendidos como necessários.

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestação jurídica tem o escopo de apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico e recomendar alguma providência para salvaguardar a Administração e o erário público. Assim, parte das observações aqui expendidas se constitui em recomendações e, caso a Administração opte por não acatá-las, recomenda-se

motivar o ato, nos termos do art. 50, da Lei nº 9.784/99. O cumprimento ou não das recomendações decorre do exercício da competência discricionária da autoridade administrativa, a qual responde isoladamente no caso de descumprimento das recomendações deste parecer ou pela ausência de fundamentação dos atos administrativos.

Contudo, as questões que envolvem a legalidade, isto é, os requisitos previstos no ordenamento jurídico são de observância obrigatória, os quais, para não serem aplicados, deve haver motivação e justificativa plausível para tanto.

Nesse rumo, forçoso reconhecer que a análise dos aspectos técnicos da Prorrogação contratual pretendida pela Administração não constitui tarefa afeta a este órgão jurídico, o que somente de forma excepcional poderemos adentrar, em razão da omissão grosseira do setor competente na descrição dos objetos ou na justificativa da contratação.

Ante as questões acima suscitadas, passaremos à análise dos aspectos relacionados à legalidade do feito.

2.1. Do Aditivo de Prazo:

O art. 57 da Lei nº 8.666/1993 admite a prorrogação de contratos, desde que observadas determinadas situações, elencadas no citado normativo legal.

Consoante se verifica da Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº 329/2018, acostado as fls. 269/280 e Ordem de Início de Serviço de fl. 293, o prazo inicial de execução era de 06 (seis) meses, iniciando-se em 29/11/2018 e encerrando em 28/05/2019. Por força do 1º, 2º e 3º aditivo, o prazo foi elastecido até 29/04/2020.

Considerando a urgência de saúde pública causada pela Pandemia do Coronavirus, em 24/03/2020, o Município de Capanema/Pr editou o Decreto nº 6.757/2020, definindo regras e medidas de enfrentamento em âmbito municipal, entre elas a suspensão das obras públicas, conforme reproduz-se a seguir:

> Art. 7º Ficam suspensas as atividades na Administração Pública, devendo ocorrer, no que couber, o tele trabalho (home office), afim de evitar sobrecarga quando na volta das atividades.

§ 1° Permanecerão as atividades de cunho plantonista e fiscalizatória.
§ 2° O disposto neste artigo não se aplica à Secretaria de Saúde, que deverá manter suas atividades nos termos da Resolução n° 2 do COE-CAPANEMA-COVID-19.
§ 3° O servidor poderá ter seus trabalhos requisitados a qualquer momento por autoridade hierárquica superior, devendo este comparecer nos termos do chamado.
§ 4° Ficam suspensas todas as obras públicas, que incluem as por meio de execução direta ou por processo licitatório. (destaquei)

Apesar da urgência de saúde ter motivado o Decreto de paralização em março de 2020, até a presente data a urgência permanece, inclusive, irradiando efeitos em todos os setores da economia até os dias atuais.

Considerando que a suspensão das obras públicas tem fundamento no Decreto Municipal n° 6.757/2020, a Procuradoria manifesta-se pelo acolhimento do pedido de aditivo de prazo de execução por mais 04 (quatro) meses. De igual forma, manifesta-se favorável a prorrogação do prazo de vigência contratual, pelo mesmo prazo de 04 (quatro) meses, findando em 29/08/2020.

Não obstante, pelo que consta do PA, não traz quaisquer outros ônus à Administração Pública, além dos originariamente previstos. Ademais, tem-se que a prorrogação contratual decorre da contínua necessidade dos serviços prestados, situação autorizada pelo art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666/1993.

Urge esclarecer, por fim, porque notória a relevância, que a veracidade de todas as informações e documentação apresentadas são de inteira responsabilidade dos contraentes.

Neste ponto, convém chamar atenção para a possibilidade de aplicação de sanções de natureza política, administrativa, civil e penal **em caso de malversação da verba pública,** decorrentes de improbidade administrativa, nos termos da Lei 8.429/92, bem como em desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, complementada pela Lei n° 10.028/2000, que criou outros tipos penais (crimes contra as finanças públicas), de modo a tomar mais efetivos os princípio constitucionais da Administração Pública (art. 37/CF).

3. CONCLUSÃO:

Município de Capanema - PR
Procuradoria Jurídica

Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta pela **possibilidade** da celebração do termo aditivo de vigência e execução por 04 (quatros) meses, **devendo ainda, ser providenciada:**

a) Juntada aos autos de toda a documentação de regularidade fiscal prevista no art. 29 da Lei 8.666/93, de modo a comprovar que a contratada ainda satisfaz os requisitos de habilitação, caso a validade dos respectivos documentos apresentados na sessão pública esteja espirada;

b) Juntada das declarações do art. 16, I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal;

c) O encaminhamento prévio da minuta do aditivo, para aprovação da PGM, conforme preconiza o art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/1993;

d) A publicação do extrato do termo aditivo em análise na imprensa oficial (art. 61, parágrafo único, Lei 8666), com vistas a conferir-lhe validade e eficácia, em razão do princípio da publicidade, inerente a todos os atos administrativos.

É o parecer.

Capanema, de 29 de abril de 2020.

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Municipal
OAB/PR 56.675

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Jurídico de
Capanema - PR
Dec. nº 6001/2015
OAB/PR 56.675

Município de Capanema - PR

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Com relação a Tomada de Preços nº 12/2018, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017-OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, acato o Parecer Jurídico pelo aditivo de prazo de Vigência e Execução.

Solicito ao Setor de Licitações para que tome as devidas providências, no sentido da elaboração do Termo aditivo.

Capanema, 29 de abril de 2020

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Município de Capanema - PR

A Sra.

Roselia Kriger Becker Pagani

Pregoeira/Membro da comissão

Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações

Com relação a Tomada de Preços nº 12/2018, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017-OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, informo que há dotação orçamentária para Aditivo conforme orçamento abaixo:

Dotações:

Exercício da Despesa	Conta da Despesa	Funcional Programática	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Grupo da Fonte
2020	1780	08.002.15.451.1501.1151	000	44.90.51.00.00	Do Exercício.

Capanema, 29 de abril de 2020

Cleomar Walter
Tec.Cont. CRC: PR 046483/O-2
CPF 723.903.959-53

Município de Capanema
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO Positiva com efeito de negativa

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **14/09/2020**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

Positiva com efeito de negativa Nº: 3741/2020

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL: A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME
ENDEREÇO:AVENIDA BRASIL, 306 - SALA 2 CXPST 21 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR

CONTROLE	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
12726	84.840.503/0001-65	90333600 - 50	114

CNAE / ATIVIDADES

Obras de terraplenagem, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Corretoras de contratos de mercadorias, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Certidão emitida no dia **Capanema, 16 de Julho de 2020.**
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: **9ZTMH282QET2T4X84UU5**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 84.840.503/0001-65
Razão Social: A A COLUSSI E CIA LTDA
Endereço: AV BRASIL 306 SALA 2 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/06/2020 a 28/07/2020

Certificação Número: 2020062901103136013330

Informação obtida em 16/07/2020 10:43:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A.A. COLUSSI & CIA LTDA
CNPJ: 84.840.503/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:27:04 do dia 15/07/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/01/2021.
Código de controle da certidão: **6E59.D067.A2D4.DAA9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 022257479-50

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **84.840.503/0001-65**
Nome: **A. A. COLUSSI & CIA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 13/11/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (16/07/2020 10:42:02)

Município de Capanema - PR

5.° Termo Aditivo ao Contrato n° 329/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a AVENIDA BRASIL, 306 SALA 2 CXPST 21 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o n° 84.840.503/0001-65, neste ato por seu representante legal, ALDEMIR COLUSSI, CPF:524.947.489-68 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de preços n° 12/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato em 31/08/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de preços n° 12/2018, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU N° 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO**, em conformidade com o Parecer Jurídico n° 138/2020, fica prorrogado o prazo de Execução E Vigência do Contrato n° 329/2018 para mais **4(quatro) meses** a partir da data de término do contrato, ficando seu novo prazo de término em 29/08/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 29 de abril de 2020

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ALDEMIR COLUSSI
Representante Legal
A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME
Contratada

APROVAÇAO DE MINUTA DE ADITIVO

(X)Aprovo a presente minuta de aditivo na forma que se encontra redigida.

( )Não Aprovo a presente minuta de aditivo na forma que se encontra redigida.

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Municipal
OAB/PR 56.675

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Jurídico de
Capanema - PR
Dec. nº 6001/2015
OAB/PR 56.675

EXPEDIENTE

ORGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA
AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005,
LEI MUNICIPAL Nº 1.648/2018

COORDENAÇÃO/DIREÇÃO: Andrea Marize Weschenfelder Paeze - Secretaria de Administração

DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO: Caroline Pilati

APOIO TÉCNICO: Pedro Augusto Santana

PREFEITURA DE CAPANEMA
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000
Fone: 46 3552-1321
E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br / adm@capanema.pr.gov.br
Capanema - Paraná
Prefeito Municipal: Américo Bellé
Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer
Secretária de Administração Interina: Andrea Marize Weschenfelder Paeze
Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski
Secretária de Educação, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz
Secretária da Familia e Desenvolvimento Social interina: Andrea Marize Weschenfelder Paeze
Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti
Secretária da Indústria, Comércio e Turismo: Andrea Marize Weschenfelder Paeze
Secretário de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso
Secretário de Saúde: Jonas Welter
Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Adelar Kerber
Chefe de Gabinete: Paulo de Souza

Controladora Geral do Município: Arieli Caciara Wons

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000
Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329
Fax: (46) 3552-3217
E-mail: capanemacamara@gmail.com
Capanema - Paraná
Vereador: Valdomiro Brizola - Presidente
Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente
Vereador: Edson Wilmsen - 1º Secretário
Vereador: Delmar C. Balzan - 2º Secretário
Vereador: Airton Marcelo Barth
Vereador: Gilmar Pontin
Vereador: Ginésio J. Pinheiro
Vereador: Paulo C. Lothermann
Vereadora: Izolete Ap. Walker

ATOS LICITATÓRIOS

PORTARIA Nº 7.664 DE 16 DE JULHO DE 2020

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 40/2020.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43;

RESOLVE:
Art. 1º Homologar o Processo de Licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 40/2020, objeto AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO CORONAVÍRUS SARS-COV2 (IGG/IGM), REALIZADO ATRAVÉS DE AMOSTRA DE SANGUE OBTIDA POR PUNÇÃO DIGITAL, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA - PR, DECORRENTE DA PANDEMIA CORONAVIRUS.
Art. 2º Em cumprimento ao disposto no Art.109, §1º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando os vencedores pelo critério menor preço Por Item;

Fornecedor	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1	TESTE RÁPIDO CORONAVÍRUS IGG/IGM (COVID-19) COMREGISTRO NO INCQS - INSTITUTO NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE EM SAÚDE/FIO CRUZ	MEDTESTE	1.000,00	59,80

Art. 3º Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Pregão Eletrônico Nº 40/2020, é de R$ 59.800,00 (Cinqüenta e Nove Mil e Oitocentos Reais).
Art. 4º Homologo a presente licitação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná dezesseis dias de julho de 2020

Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 287/2020
Pregão Eletrênico Nº 040/2020
Data da Assinatura: 16/07/2020.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Objeto: AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO CORONAVÍRUS SARS-COV2 (IGG/IGM), REALIZADO ATRAVÉS DE AMOSTRA DE SANGUE OBTIDA POR PUNÇÃO DIGITAL, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA - PR, DECORRENTE DA PANDEMIA CORONAVIRUS...
Valor total: R$59.800,00 (Cinqüenta e Nove Mil e Oitocentos Reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

5.º Termo Aditivo ao Contrato nº 329/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a AVENIDA BRASIL, 306 SALA 2 CXPST 21 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 84.840.503/0001-65, neste ato por seu representante legal, ALDEMIR COLUSSI, CPF:524.947.489-68 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de preços nº 12/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato em 31/08/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de preços nº 12/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRE-

SA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 138/2020, fica prorrogado o prazo de Execução E Vigência do Contrato nº 329/2018 para mais 4(quatro) meses a partir da data de término do contrato, ficando seu novo prazo de término em 29/08/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 29 de abril de 2020

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ALDEMIR COLUSSI
Representante Legal
A.A. COLUSSI & CIA LTDA ME
Contratada

LEIS

LEI Nº 1.743, DE 16 DE JULHO DE 2020.

Institui o Programa Municipal de Incentivo a Saúde Mental e de Prevenção ao Suicídio, denominado "Cuidar da mente é cuidar da vida. Juntos vamos prevenir o suicídio!".

A Câmara Municipal de Capanema, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito do Município de Capanema, sanciono a seguinte:

LEI

Art. 1º Fica instituído, o Programa Municipal de Incentivo a Saúde Mental e de Prevenção ao Suicídio, denominado "Cuidar da mente é cuidar da vida. Juntos vamos prevenir o suicídio!", no âmbito do Município de Capanema/PR.

Art. 2º O programa terá por objetivo ampliar a conscientização sobre os temas relacionados à saúde mental e a prevenção do suicídio.

Art. 3º O referido programa deverá ser desenvolvido no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde e deverá ter como espaço prioritário de atuação as escolas e as demais instituições de ensino, as associações de idosos e de bairros, os clubes de damas (mulheres), a cadeia pública, as igrejas e as comunidades do interior.

§ 1º Para esta finalidade, a Secretaria Municipal da Saúde poderá firmar convênios e parcerias com instituições públicas e de cooperação com instituições privadas e pessoas físicas.

§ 2º Diante da eficácia dos trabalhos do Centro de Valorização da Vida (CVV), dos Alcoólicos Anônimos (AA) e da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) serão construídas e viabilizadas parcerias preferenciais para o sucesso do programa.

Art. 4º O programa deverá ser estruturado para ação continua e anual. Parágrafo único. Contudo, haverá períodos especiais entre os dias 10 de setembro e 10 de outubro e no mês de janeiro.

Art. 5º Para destacar as ações do programa, especialmente, na prevenção do suicídio fica instituído a Campanha "Setembro Amarelo".

Parágrafo único. O dia 10 de setembro será o dia municipal de prevenção ao suicídio.

Art. 6º Também é instituído a Campanha "Janeiro Branco", que contribuirá de modo especial, em todo mês de janeiro, para difusão de ações educativas na área da saúde mental.

Parágrafo único. O dia 10 de outubro será o dia municipal da saúde mental.

Art. 7º O programa, no tocante a prevenção do suicídio, poderá contar com as seguintes iniciativas, sem prejuízo de outras que venham a ser desenvolvidas:

I – informar e sensibilizar a comunidade local, que a tentativa de suicídio e o suicídio são problemas de saúde pública passíveis de prevenção;

II – combater o preconceito sobre o tema, pois o suicídio é grave problema de saúde pública, que fica sem detecção precoce ou prevenção pelos errôneos tabus;

III – discutir, de forma prioritária, os fatores de risco para os suicídios apontados pela ciência médica. De forma especial: 1 – tentativa prévia de suicídio; 2- doença mental; 3 – sentimentos de desesperança, desamparo e impulsividade; 4 – questão etária (jovens e idosos); 5 – doenças clínicas não psiquiátricas; 6 – eventos adversos na infância e na adolescência; e, 7 – histórico familiar e genético; 8 – questões sociais como local, desemprego e etc.

IV – estimular o acolhimento adequado dos familiares e das pessoas próximas das vítimas de suicídio, especialmente, na rede de saúde;

V – promover união de todos os setores sociais, principalmente, das entidades de educação, saúde, imprensa, bombeiros e polícias para prevenção do suicídio;

VI – aperfeiçoar a rede de saúde para garantir atenção psicossocial às pessoas em sofrimento psíquico agudo ou crônico, principalmente, com histórico de tentativa de suicídio;

VII - fornecer capacitação aos servidores da saúde e da educação para notificações da lei 13.819/2019.

VIII – aprimorar a qualificação dos profissionais da rede de saúde, em todos os seus níveis, quanto a problemática da tentativa de suicídio e do suicídio;

IX – acolher o laço de fita da cor amarela e a referida cor como símbolos da campanha setembro amarelo;

X – divulgar o telefone número de telefone 188, que funciona vinte e quatro horas, para apoio emocional e prevenção de suicídio pelo Centro de Valorização da Vida.

Art. 8º O programa, no tocante a difusão da importância da saúde mental, poderá contar com as seguintes iniciativas, sem prejuízo de outras que venham a ser desenvolvidas:

I – defender e promover que a saúde mental é fundamental para vida;

II – propagar a reflexão sobre a vida, o seu sentido e o seu propósito, a qualidade dos relacionamentos (pessoais, familiares e comunitários) e o autoconhecimento (emoções, pensamentos e comportamentos);

08 – Atos Oficiais Capanema 17 de julho de 2020
Edição 492
Jornal Folha de Capanema

Município de Capanema - PR

LEI Nº 1.743, DE 16 DE JULHO DE 2020.

Institui o Programa Municipal de Incentivo a Saúde Mental e de Prevenção ao Suicídio, denominado "Cuidar da mente é cuidar da vida. Juntos vamos prevenir o suicídio!"

A Câmara Municipal de Capanema, Estado do Paraná, aprovou e o Prefeito do Município de Capanema, sanciono a seguinte:

LEI

Art. 1º Fica instituído, o Programa Municipal de Incentivo a Saúde Mental e de Prevenção ao Suicídio denominado "Cuidar da mente é cuidar da vida. Juntos vamos prevenir o suicídio!", no âmbito do Município de Capanema/PR.

Art. 2º O programa terá por objetivo ampliar a conscientização sobre os temas relacionados à saúde mental e a prevenção do suicídio.

Art. 3º O referido programa deverá ser desenvolvido no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde e deverá ter como espaço preferencial de atuação as escolas e as demais instituições de ensino, as associações de idosos e de bairros, os clubes de damas (mulheres), a rádio pública, as igrejas e as comunidades do interior.

§ 1º Para esta finalidade, a Secretaria Municipal da Saúde poderá firmar convênios e parcerias com instituições públicas e de cooperação com entidades privadas e pessoas físicas.

§ 2º Diante da eficácia dos trabalhos do Centro de Valorização da Vida (CVV), dos Alcoólicos Anônimos (AA) e da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) serão consideradas e viabilizadas parcerias preferenciais para o sucesso do programa.

Art. 4º O programa deverá ser implementado para ação continua e anual.
Parágrafo único. Contudo, haverá períodos específicos para ações do dia 10 de setembro e 10 de outubro e no mês de janeiro.

Art. 5º Para destacar as ações do programa especialmente, na prevenção ao suicídio fica instituído a Campanha "Setembro Amarelo".

Parágrafo único. O dia 10 de setembro será o dia municipal de prevenção ao suicídio.

Art. 6º Também é instituído a Campanha "Janeiro Branco", que constituirá de modo especial, em todo mês de janeiro, para difusão de ações educativas na área da saúde mental.

Parágrafo único. O dia 10 de outubro será o dia municipal da saúde mental.

Av. [illegible] Rodovia Antônio Sergio de Souza, 3080 - Centro - 85760-000
Fone (46) 3552-1281
CAPANEMA - PR

Município de Capanema - PR

Art. 7º O programa, no tocante à prevenção do suicídio, poderá contar com as seguintes medidas, sem prejuízo de outras que venham a ser desenvolvidas:

I – informar e sensibilizar a comunidade local, que o tentativa de suicídio e o suicídio são problemas de saúde pública passíveis de prevenção;

II – combater o preconceito sobre o tema, pois o suicídio é grave problema de saúde pública, que fica sem devida atenção e sem prevenção pelos errôneos tabus;

III – discutir, de forma preventiva, os fatores de risco para os suicídios especialmente a ciência médica. De forma especial: a tentativa prévia de suicídio; 2- doença mental; 3- sentimentos de desesperança, desespero e impulsividade; 4 – questão cultural (crenças e costumes); 5 – doenças clínicas não psiquiátricas; 6 – eventos adversos na infância e na adolescência; 7 – histórico familiar e genético; 8 – questões sociais como local, desemprego e etc;

IV – estimular o acolhimento adequado dos familiares e das pessoas próximas das vítimas de suicídio especialmente, na rede de saúde;

V – promover união de todos os setores sociais, principalmente das [illegible] de educação, saúde, imprensa, bombeiros e polícias para prevenção de suicídio;

VI – aperfeiçoar a rede de saúde para garantir atenção psicossocial às pessoas em sofrimento psíquico agudo ou crônico, principalmente, com histórico de tentativa de suicídio;

VII – oferecer capacitação aos trabalhadores da saúde e da educação para a identificação [illegible] risco;

VIII – aprimorar a qualificação dos profissionais da rede de saúde, destinada aos seus [illegible], quanto à problemática da tentativa de suicídio e do suicídio;

IX – acolher o laço de fita na cor amarela e a referência como símbolos da campanha setembro amarelo;

X – divulgar o telefone gratuito do disque 188, que funciona vinte e quatro horas para apoio emocional e prevenção de suicídio do Centro de Valorização da Vida.

Art. 8º O programa, no tocante à difusão da importância da saúde mental, poderá contar com as seguintes iniciativas, sem prejuízo de outras que venham a ser desenvolvidas:

I – defender e promover que a saúde mental é fundamental para a vida;

II – propagar a reflexão sobre a vida, o seu sentido e o seu propósito, a qualidade de vida e os interesses (pessoais, familiares e comunitários) e a sua enriquecimento (emoções, pensamentos e comportamentos);

III – refletir sobre fatores promotores da saúde mental, especialmente, da vida equilibrada, da prática da atividade física, da quantidade e da qualidade do sono e do cuidado espiritual;

Av. [illegible] Rodovia Antônio Sergio de Souza, 3080 - Centro - 85760-000
Fone (46) 3552-1281
CAPANEMA - PR

Município de Capanema - PR

IV – alertar que os pais e mães também são responsáveis pela saúde mental dos filhos. Discutir o consumo de álcool, cigarro e demais drogas na gravidez. Bem como, a alimentação e a prática esportiva na infância e adolescência. Mostrar a presença da importância de brincar com os filhos, de fornecer limites sem violência física e desenvolver o bullying. Prevenir o consumo de álcool e drogas, sempre com diálogo e exemplo. Observar qualquer mudança de comportamento, inclusive, no campo educacional.

V – convidar os pais e os filhos para refletir sobre a qualidade do relacionamento familiar, especialmente, das seguintes características: gentileza, paciência, capacidade de perdoar, cortesia, humildade, generosidade e honestidade.

VI – estimular a sociedade para reflexão e respeito da qualidade das suas emoções no ambiente de trabalho.

VII – conscientizar a sociedade em geral para reflexão sobre a cultura da gentileza e da paz, especialmente, no trânsito, nas escolas e nas festas sociais. E, igualmente, a importância das palavras positivas, de pedir e de cortesia como exemplo muito obrigado, desculpa, com licença, por favor, e etc.;

VIII – divulgar e difundir que a rede de saúde oferece cuidados para problemas de saúde [illegible];

IX – Combater o preconceito contra os portadores de transtornos mentais (psicoses);

X – diminuir a prevenção da automedicação (violência autoprovocada).

XI – acolher o laço de fita da cor branca e a referida cor como símbolos da campanha janeiro branco.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 16 dias do mês de julho de 2020.

Marcio Bellé
Prefeito Municipal

Av. [illegible] Rodovia Antônio Sergio de Souza, 3080 - Centro - 85760-000
Fone (46) 3552-1281
CAPANEMA - PR

Município de Capanema - PR

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 329/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e do outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA – ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.372.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante denominada simplesmente **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, sediada a AVENIDA BRASIL, 306, SALA 2, CNPST 21 - CEP: 85760-000 - BAIRRO CENTRO, inscrito no CNPJ sob o nº 84.840.503/0001-85, neste ato por seu representante legal, ALDEMIR COLUSSI, CPF 024.947.489-05 ao fim assinado, doravante denominada CONTRATADA, celebram as partes signatárias as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital-Tomada de preços nº 12/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato em 31/03/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de preços nº 12/2018, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS [illegible] DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLINAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAÍDES SCHLATO ASCENDE NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017. OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO**, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 135/2020, fica prorrogado o prazo de execução. E Vigência do Contrato nº 329/2018 por mais 4(quatro) meses a partir da data de término do contrato, tendo seu novo prazo de término até 29/08/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do contrato originário, não alteradas por este termo, permanecem inalteradas.

E por estarem assim ajustadas lavrou-se o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema – PR, 29 de abril de 2020

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ALDEMIR COLUSSI
Representante Legal
A.A. COLUSSI & CIA LTDA ME
Contratada

Av. [illegible] Rodovia Antônio Sergio de Souza, 3080 - Centro - 85760-000
Fone (46) 3552-1281
CAPANEMA - PR

5.º Termo Aditivo ao Contrato nº 329/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a AVENIDA BRASIL, 306 SALA 2 CXPST 21 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 84.840.503/0001-65, neste ato por seu representante legal, ALDEMIR COLUSSI, CPF:524.947.489-68 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de preços nº 12/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato em 31/08/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de preços nº 12/2018, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO**, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 138/2020, fica prorrogado o prazo de Execução E Vigência do Contrato nº 329/2018 para mais **4(quatro) meses** a partir da data de término do contrato, ficando seu novo prazo de término em 29/08/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 29 de abril de 2020

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ALDEMIR COLUSSI
Representante Legal
A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME
Contratada

Município de Capanema – PR
Departamento de Engenharia

SOLICITAÇÃO

Com relação ao contrato administrativo nº 329/2018 cujo objeto: CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO NORTE E ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA-PR EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 855505/2017, solicito que responda o pleito feito pela empresa nas folhas nº 0636, 0637 e 0638 do PA.

Capanema, 20 de agosto de 2020

Paulo Fernando Lazzaretti Orso
Engº Agrônomo - CREA-SC 39552/D
Dec. 6286/2017
Sec. Mun. Planejamento e Projetos

PAULO FERNANDO LAZZARETI ORSO
Secretário Municipal de Planejamento e Projetos

Município de Capanema – PR
Departamento de Engenharia

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA

Com relação ao contrato administrativo nº 329/2018 cujo objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TARRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO NORTE E AVENIDA ATAÍDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA-PR EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 856605/2017 – OPERAÇÃO 1041530-91 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO EM CAPANEMA-PR,** oriundo do certame licitatório Tomada de Preço nº 12/2018, no que tange a solicitação do eminente Secretário Municipal de Planejamento e Projetos Paulo Fernando Lazzareti Orso folha nº 0695 do PA, na qual pede que responda sobre o conteúdo dos documentos emitidos pela empresa executora da obra contidos nas folhas nº 0636, 0637 e 0638 do PA.

Quanto a matéria segue alguns esclarecimentos em ordem cronológica dos acontecimentos:

• Foi dada a ordem de início (folha nº 0293 do PA) na data de 28 de novembro de 2018, sendo iniciado as obras, tendo na minha pessoa como fiscal do contrato.

• Dia 25 de abril de 2019 foi feito por mim a primeira medição sendo considerado Serviços Preliminares, Escavação, Reaterro e assentamento de tubos de concreto DN 60 cm, perfazendo um percentual de 14,74% da obra.

000697

• Dia 08 de março de 2019, através do memorando interno nº 04/2019 protocolado sob o número 607/2019 e endereçado ao eminente Secretário Municipal de Planejamento e Projetos, meu superior hierárquico, o relato de um problema, na qual não tinha autonomia para resolver, que foi tubulações de DN 60 cm existentes que não foram consideradas no orçamento original(uma vez que eram existentes) o qual estavam entupidas, com isso coloquei a necessidade de aportarmos mais 60,00 m de tubulação, seguindo um croqui de localização onde seria utilizado as tubulações, conforme segue em anexo a esta manifestação técnica.

• Até a data de 19 de agosto de 2019 permaneci como fiscal do contrato, após essa data por motivos de saúde me afastei da fiscalização da obra, ficando como fiscal do contrato a engenheira Katia B. Gularte.

• Eu , Rubens Luis Rolando Souza, fui responsável técnico pelo Projeto Básico até a aprovação do mesmo feito pelo Ministério detentor dos recursos como assim o fiz, também fiscalizando a referida obra até a data de 19 de agosto de 2019, com isso a partir desta data a atribuição de definir sobre eventos pertinentes a obra, cabe ao Engº Fiscal do Contrato atual que é o Engenheiro Civil Erik Kurogi, nessa entoada para deixar bem claro a situação vou emitir somente a minha opinião técnica sobre a matéria após narrar os fatos, sem poder de decisão nenhuma.

• Vamos nos ater sobre o conteúdo das Folhas nº 636 e 637, na qual a empresa relata e inclusive cita o meu memorando interno explicitado acima, fazendo um demonstrativo de escavação, retirada

e assentamento de tubos com diâmetro DN 60 cm o qual foi relatado por mim e ainda acrescentou sob a ótica da empresa tubulações de DN 80 cm a mais o qual não tive conhecimento. Foi apresentado uma planilha orçamentária dos custos dos serviços e deixaram claro que o **executaram com a justificativa de possibilitar o andamento das obras**. Os dois documentos apresentados não tinham data.

• Na folha nº 638 apenas um relatório explicitando os problemas e sugeriram os quantitativos de tubulações e horas máquina para sanar tais serviços.

• Na data de 15 de janeiro de 2020 a Engenheira fiscal Katia B. Gularte, mediante o conteúdo das folhas supracitadas acima, solicitou a complementação de alguns documentos por parte da empresa executora, para posterior resposta.

• No dia 17 de fevereiro de 2020 através do protocolo nº 432/2020, a empresa apostilou no PA os documentos solicitados e ficou aguardando uma resposta por parte da fiscalização da obra.

• No dia 22 de fevereiro de 2020 findou o contrato da engenheira fiscal katia B. Gularte.

• No dia 06 de março de 2020 o Engenheiro Civil Erik Kurogi assumiu a fiscalização da referida obra estando até o presente momento.

•Cabe observar que na data de hoje foram feitas 04 medições (seguindo em anexo) apresentando um acumulado de 86,97% da obra e em dinheiro um total de R$ 335.523,69.

000699

• Se pegarmos o total da obra que é de R$ 385.806,65 descontando o valor acumulado restará o saldo de **R$ 50.282,96**.

• Tal valor corresponde exatamente ao item do orçamento quantitativo 1.3.4 Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais diâmetro de 800 mm com junta rígida instalado no local, com o quantitativo de 182,00 m perfazendo um valor em dinheiro de **R$ 50.282,96** conforme folha nº 0257 do PA. Constatando se que o saldo da obra é exatamente as tubulações de DN 80 cm.

• Cabe observar que na data de 29 de agosto de 2020 é a data limite para o encerramento da vigência e da execução da obra.

CONCLUSÃO:

Diante todos os fatos narrados acima na minha opinião técnica a empresa alertou essa municipalidade sobre a tal diferença das tubulações pedindo uma resposta sobre o tema. Acontece que a fiscalização não deu essa resposta, entretanto a empresa executora sem qualquer autorização por escrito executou tais serviços sem acompanhamento da fiscalização. Com isso o seu pleito é inconsistente, pois por mais boa vontade da empresa de agilizar o andamento das obras obrigatoriamente tem que ter uma autorização por parte da fiscalização e não teve.

Como sugestão a fiscalização atual, falta medir os tubos de 80 cm que estão no projeto original. Seguindo em anexo a essa

000700

manifestação técnica está um croqui específico das posições e quantitativos somente dos tubos de 80 cm para facilitar a medição.

Sugiro que se proceda a aferição das tubulações no local e confira os quantitativos do projeto que são 182,00 m. Tendo os quantitativos se mede, se não tiver se proceda a glosa definitiva e se encerra o contrato até mesmo porque está findando os prazos da obra.

Capanema, 20 de agosto de 2020

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema PR.
CREA-RS 88.296/D

Rubens Luis Rolando Souza
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho
CREA RS 88.296/D

Município de Capanema – PR
Departamento de Engenharia

MEMORANDO INTERNO 04/2019

Processo: 607/2019
Data: 26/03/2019 Hora: 05:21
Assunto: SOLICITACAO PARA SETOR DE PLANI
Requerente: RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA

A/C:
Srº **PAULO FERNANDO LAZZARETTI ORSO**
Secretário Municipal de Planejamento

Com relação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO NORTE E AVENIDAA ATAÍDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA-PR EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 856605/2017 OPERAÇÃO 1041530-91 PLANEJAMENTO URBANO oriundo do processo licitatório tomada de preço nº 12/2018 e contrato administrativo nº 329/2018 no que diz respeito a execução da referida obra segue o seguinte.

Foi contratado o Profissional Engenheiro Civil Luiz Eduardo Urban com CREA PR 116829/D com a finalidade de fazer o levantamento de campo do sistema de drenagem pluvial existente bem como a terraplenagem a fim de projetar um novo sistema dentro das normas e padrões adotados pelo Ministério das Cidades, cabe observar que assim o referido profissional o fez.

Pois bem na rua Tamoios nas proximidades com a rua Ceará segundo levantamento marcava originalmente 60,00 m de tubulação existente deixando como objeto do orçamento somente as bocas de lobo.

No entanto ao ser mexido no local, para se executar as bocas de lobo projetadas, constatou se que os 60,00 m de tubulação estão na sua totalidade entupidos, os deixando inservíveis para o uso que se propõem, conforme é demonstrado nas fotos abaixo.








000705

Diante o exposto acima coloco ao eminente Secretário Municipal de planejamento a necessidade de aportarmos mais 60 m de tubulação de concreto com DN 60 cm MF, não previsto na fase do projeto básico.

Segue em anexo um croqui com a posição exata da localização dos tubos existentes e entupidos.

Capanema 08 de março de 2019

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 88.296/D

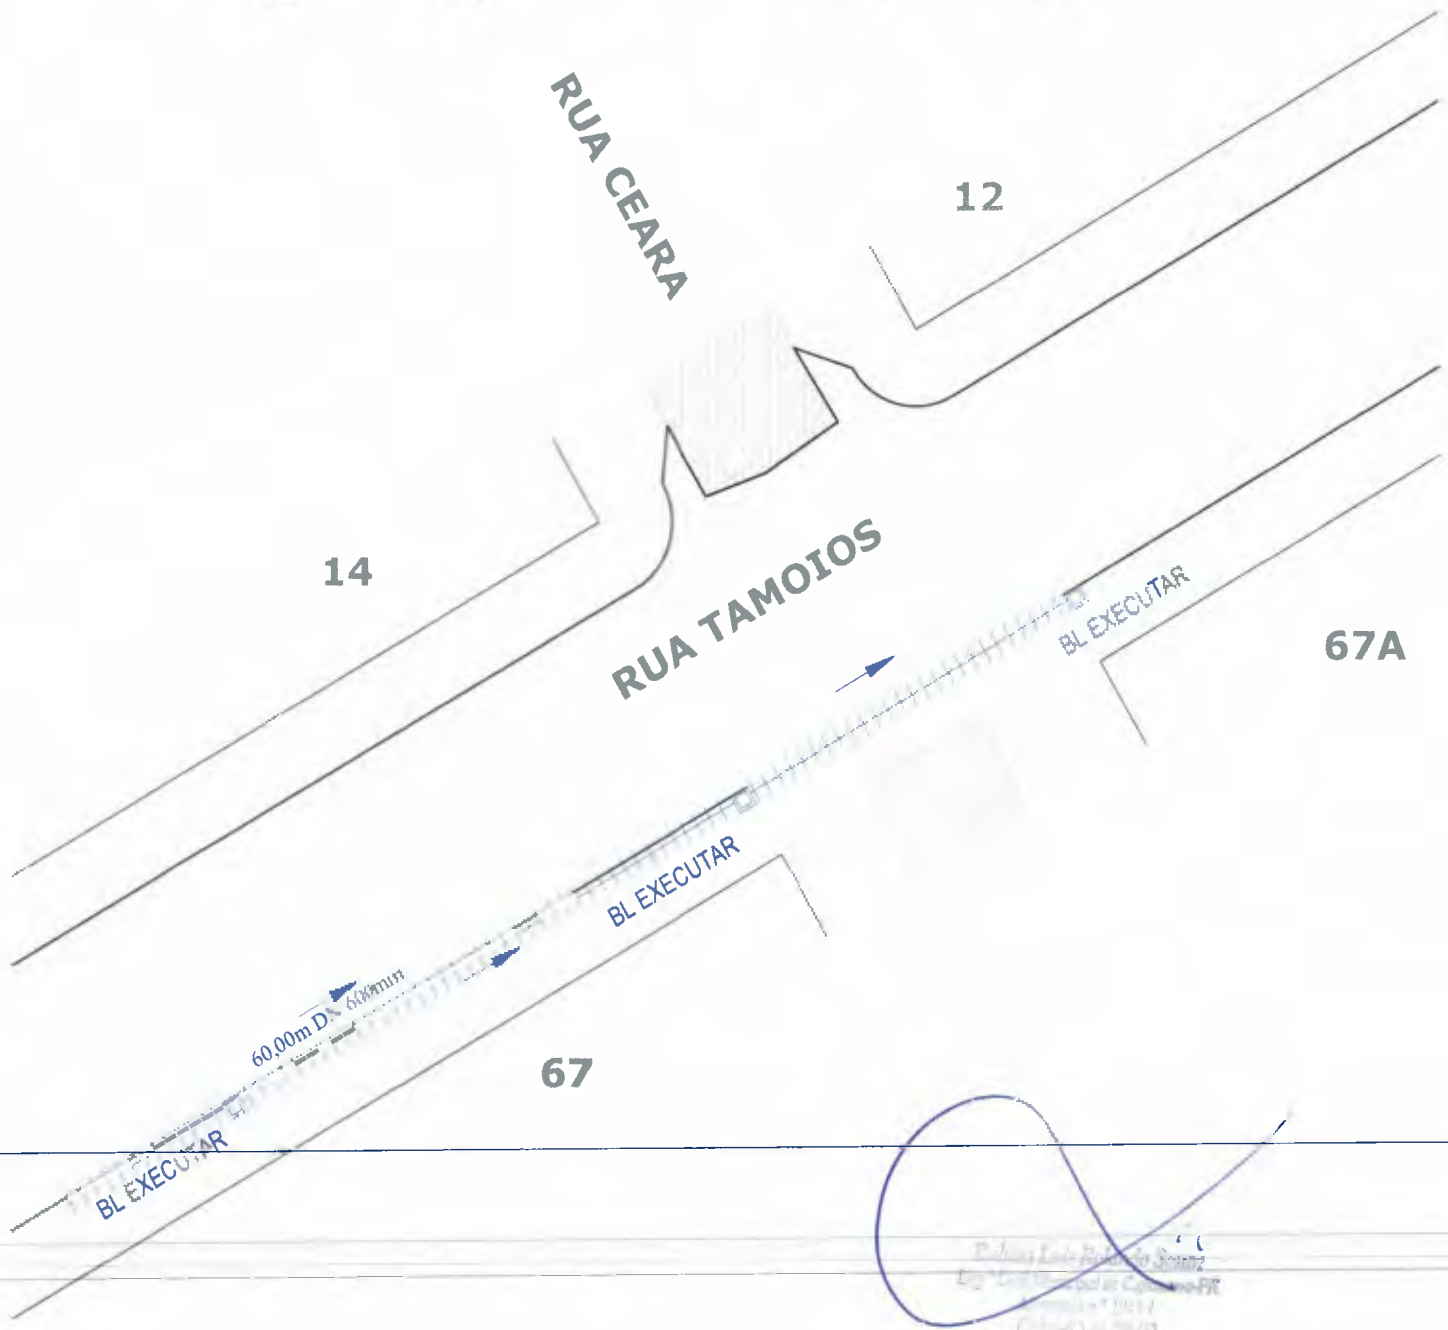
RUA CEARA
12
14
RUA TAMOIOS
BL EXECUTAR
67A
BL EXECUTAR
60,00m D.
67
BL EXECUTAR

00700

CAIXA

PLL PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1041530-91	18271/2017	Prefeitura Municipal de Capanema	Calçamento Tamoios	AA COLUSSI & CIA LTDA - ME	329/2018

Medição: 4 | Período: 05/02/2020 a 23/06/2020 | % Realizado Período: 10,91% | % Realizado Acum.: 86,97%

Nº do Evento	Título dos Eventos	serviços preliminares 1	terraplenagem 2	escavação 3	aterro 4	DN 600 mm 5	DN 800 mm 6	DN 1000 7	Dissipador 8	Bocas de lobo 9	pavimentação 10	Calçadas 11	Sinalização 12	Serviços Complementares 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
3	TERRAPLENAGEM		2																							
4	DRENAGEM			1	1	1		3	3	3				3												
5	PAVIMENTAÇÃO POLIDÉRICA COM PEDR.										2															
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL												3													
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES													3												
8	PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS											4														

Medições		Data das Medições											
		25/04/2019	02/09/2019	04/02/2020	23/06/2020								
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	14,74%	47,74%	13,57%	10,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	56.879,21	184.188,97	52.348,29	42.107,22	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	14,74%	62,48%	76,05%	86,97%	86,97%	86,97%	86,97%	86,97%	86,97%	86,97%	86,97%	86,97%
	R$	56.879,21	241.068,18	293.416,47	335.523,69	335.523,69	335.523,69	335.523,69	335.523,69	335.523,69	335.523,69	335.523,69	335.523,69

Capanema-PR
Local

terça-feira, 23 de junho de 2020
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Erik Takashi Kurogi
Profissão: Engº Civil
CREA/CAU: PR 134.983/D
ART/RRT: 1720202604440

0007708

CAIXA

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
Prefeitura Municipal de Capanema	1041530-91	827/2017	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO	OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	MUNICÍPIO / UF		245.850,00	139.956,65	385.806,65	Nº RRE
Pavimentação Tapoios	Capanema-PR					4

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		Saldo a	Repasse (R$)	Contrapartida (R$)
Atrasada	jun-20	100,00%	Reprogramar	-	-

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado Incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	Licitado / Em Execução	5670,59	m²	329/2018	4	385.806,65	293.416,47	42.107,22	335.523,69	86,97%
					(%)		(100,00%)	(76,05%)	(10,91%)	(86,97%)	
					Repasse		245.850,00	186.975,62	26.832,25	213.807,87	
					Contrapartida		139.956,65	106.440,85	15.274,97	121.715,82	86,97%
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**385.806,65**	**293.416,47**	**42.107,22**	**335.523,69**	

Capanema-PR
Local

terça-feira, 23 de junho de 2020
Data

Representante Tomador
Nome: Américo Belté
Cargo: Prefeito Municipal

Américo Belté
Prefeito Municipal

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Erik Takashi Kurogi
Profissão: Engº Civil
CREA/CAU: PR 134,983/D
ART/RRT: 1720202604440

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsavel Financeiro
Nome:
Cargo:

RUA PIAUI

LEGENDA:

Tubos: (A Executar)

Ø=800 182,00 Metros

RUA TAMOIOS

RUA CEARA

T. CANÁRI

Rubens Luiz Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
CREA-RS 88.206/D

6042090

Município de Capanema - PR
Procuradoria Jurídica

MANIFESTAÇÃO JURÍDICA

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2018

Senhora Presidente da CPL,

01. A pedido do Engenheiro Civil Municipal, Rubens Luis Rolando Souza, encaminhado o caderno processual para análise e atualização de informações.

02. Com informações atualizadas, retorne o PA à PGM.

Atenciosamente.

Capanema, de 07 de dezembro de 2020.

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Municipal
OAB/PR 56.675

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Jurídico de
Capanema - PR
Dec. nº 6001/2015
OAB/PR 56.675

Município de Capanema - PR

DESPACHO

Com relação a Tomada de Preços, nº 12/2018, Contrato Administrativo nº 329/2018, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. Conforme consta da Manifestação Jurídica estou encaminhando esse PA para o Engenheiro da pasta fazer atualizações do processo de informações desse processo.

Capanema, 07 de dezembro de 2020

Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Setor de Licitações

0/0712

rubensengenharia@capanema.pr.gov.br

De: rubensengenharia@capanema.pr.gov.br
Enviado em: terça-feira, 15 de dezembro de 2020 14:26
Para: 'REGOVCV - RE Governo Cascavel/PR'
Cc: 'adm@capanema.pr.gov.br'; 'procuradoria.romanti'
Assunto: RES: REITERA: CR 856605/2017/MDR/CAIXA - Solicita documentação para desbloqueio de recursos - Objeto sem evolução há mais de 90 dias

Caro Miguel,

Com relação ao andamento da obra do contrato de repasse em epigrafe, a fim de melhor elucidar o porquê do atraso do envio da documentação final da obra, segue um breve histórico dos acontecimentos

a) Como Engenheiro Civil Servidor efetivo do município executei o Projeto Básico até a sua aprovação por essa REGOV e como de praxe iniciei a sua fiscalização.

b) Na data de 25/04/2019 fiz a primeira medição sendo considerado 25,30% de execução da obra.

c) Na data de 02/09/2019 fiz a segunda medição, porém a REGOV enviou uma empresa terceirizada para fazer a aferição da minha medição com a realidade no canteiro de obras, trazendo como resultado o ofício nº 2702/2019/REGOV/CV, datado de 30/09/2019, na qual no seu item 3.0 efetua glosas dos serviços de escavação, aterro DN 80 cm e as **bocas de lobo** num valor total de R$ 72.843,76.

d) Por motivos de saúde, tive que me afastar das funções de fiscal de obras do município e consequentemente da obra em questão, com isso foi contratada outra fiscal de obras a Engenheira Civil Katia B. Gularte, sendo que a mesma executou a 3º medição na data de 04/02/2020 atestando um valor acumulado de 76,05% de execução da obra. Cabe observar que na medição é considerada as **bocas de lobo**.

e) Na data de 05/02/2020 mais uma vez foi trocado o fiscal da obra, sendo a partir daquela data o Engenheiro Civil Erik Takaschi Kurogi. O engenheiro

Erik na data de 23/06/2020 fez a última medição da obra atestando um valor acumulado de evolução de 86,97%.

Em campo surgiu um questionamento sobre as tubulações de DN 80 cm e DN 60 cm, por isso o Engº Erik não encerrou a obra com a medição final.

Nesse interim a partir da data de 01 de dezembro de 2020 voltei da minha enfermidade tendo condições de fiscalizar obras do município, com isso foi me repassado pela administração municipal a obra em questão com a finalidade de finalizar o obra e consequentemente o contrato de repasse em epigrafe.

Dito isso, analisei os números acumulados do contrato e a última medição. Constatei que o saldo a medir e a pagar da obra é justamente as tubulações de 80 cm, entretanto antes de resolver tal situação, percebi em vistoria no local algumas inconsistências nas execuções das bocas de lobo, que imediatamente na qualidade de fiscal do contrato determinei a empresa executora que sanasse tais patologias e dei prazo determinado para tal tarefa.

A empresa não se negou a executar os serviços elencados por mim(inclusive já iniciou), entretanto me pediu um prazo maior para executar os trabalhos, com justificativa de que entraremos em período de final de ano, em que a maioria das empresas entram em férias coletivas, como a nossa própria prefeitura, diante disso dilatei o prazo para a conclusão dos serviços das bocas de lobo até no máximo a segunda quinzena de janeiro de 2021, para aí sim resolver a questão das tubulações de DN 80 cm que é o saldo da obra.

Nesse sentido peço a vossas senhorias o entendimento desses atrasos, que não foram propositados, mas uma obra que teve várias trocas de fiscais com interpretações diferentes e glosas naturalmente ocorreram atrasos, todavia estamos dando total prioridade para sanar todas as pendências e finalizarmos o processo como um todo.

Att

Rubens Luis Rolando Souza
Engº Civil Municipal de capanema
CREA RS 88.296/D
Matricula nº 1943-1

De: REGOVCV - RE Governo Cascavel/PR <regovcv@caixa.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 15 de dezembro de 2020 11:44
Para: 'rubensengenharia@capanema.pr.gov.br' <rubensengenharia@capanema.pr.gov.br>
Cc: Paulo Augusto Schade <paulo.schade@caixa.gov.br>; Paulo Vinicius Carvalho Jorge <paulo.jorge@caixa.gov.br>; Marly Mitiko Mon Ma <marly.mitiko@caixa.gov.br>
Assunto: REITERA: CR 856605/2017/MDR/CAIXA - Solicita documentação para desbloqueio de recursos - Objeto sem evolução há mais de 90 dias

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

Bom dia Senhor Rubens

Segue novamente nossa solicitação de envio de nova medição, conforme combinado nesta data.

Att

Miguel

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

De: REGOVCV - RE Governo Cascavel/PR
Enviada em: sexta-feira, 20 de novembro de 2020 10:47
Para: 'rubensengenharia@capanema.pr.gov.br' <rubensengenharia@capanema.pr.gov.br>; 'adm@capanema.pr.gov.br' <adm@capanema.pr.gov.br>; 'tayna@projetoscmm.com.br' <tayna@projetoscmm.com.br>; 'adm@capanema.pr.gov.br' <adm@capanema.pr.gov.br>; 'matheusjareski@outlook.com' <matheusjareski@outlook.com>
Cc: REGOVCV - RE Governo Cascavel/PR <regovcv@caixa.gov.br>; Paul Albert Kopf <paul.kopf@caixa.gov.br>; Marly Mitiko Mon Ma <marly.mitiko@caixa.gov.br>
Assunto: REITERA: CR 856605/2017/MDR/CAIXA - Solicita documentação para desbloqueio de recursos - Objeto sem evolução há mais de 90 dias

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

Ao
Município de Capanema

Assunto: **Solicita documentação para desbloqueio de recursos - Objeto sem evolução há mais de 90 dias**
Ref.: **CR 856605/2017/MDR/CAIXA**

Senhor Prefeito Municipal,

1 Reiteramos nossa solicitação para envio de nova medição do Contrato de Repasse em referência, tendo em vista que a obra encontra-se com 118 dias de paralisação.

2 Diante do exposto, solicitamos que o Município observe as implicações decorrentes de obras paralisadas descritas no ofício anexo e envide esforços para que a obra seja retomada e o objeto concluído, conforme o cronograma vigente.

3 Colocamo-nos à disposição para mais informações.

Respeitosamente,

MIGUEL FIGUEIRÓ
Assistente Júnior
Representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel/PR

PAULO AUGUSTO SCHADE
Coordenador de Filial
Representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel/PR

ANDERSON GIOVANI SIMON OLIVEIRA
Gerente de Filial Substituto Eventual
Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/PR
CAIXA

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

De: REGOVCV - RE Governo Cascavel/PR
Enviada em: terça-feira, 27 de outubro de 2020 19:45
Para: 'rubensengenharia@capanema.pr.gov.br' <rubensengenharia@capanema.pr.gov.br>; 'adm@capanema.pr.gov.br' <adm@capanema.pr.gov.br>; 'tayna@projetoscmm.com.br' <tayna@projetoscmm.com.br>; 'adm@capanema.pr.gov.br' <adm@capanema.pr.gov.br>; 'matheusjareski@outlook.com' <matheusjareski@outlook.com>
Cc: REGOVCV - RE Governo Cascavel/PR <regovcv@caixa.gov.br>; Paul Albert Kopf <paul.kopf@caixa.gov.br>; Paulo Augusto Schade <paulo.schade@caixa.gov.br>
Assunto: CR 856605/2017/MDR/CAIXA - Solicita documentação para desbloqueio de recursos - Objeto sem evolução há mais de 90 dias

E-mail classificado como #PUBLICO

Ao
Município de Capanema

Assunto: **Solicita documentação para desbloqueio de recursos - Objeto sem evolução há mais de 90 dias**
Ref.: **CR 856605/2017/MDR/CAIXA**

Senhor Prefeito Municipal,

1 Em anexo, Ofício referente ao Contrato de Repasse em epígrafe e orientações para continuidade dos trâmites referente a execução do objeto.

2 Colocamo-nos à disposição para mais informações.

Respeitosamente,

090716

MIGUEL FIGUEIRÓ
Assistente Júnior
Representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel/PR

PAULO AUGUSTO SCHADE
Coordenador de Filial
Representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel/PR

ANDERSON GIOVANI SIMON OLIVEIRA
Gerente de Filial Substituto Eventual
Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/PR
CAIXA

000717

CAIXA

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Ofício nº 0108 / 2021 / REGOV/CV

Cascavel, 21 de Janeiro de 2021

A Sua Excelência o Senhor
Américo Bellé
Prefeito Municipal de Capanema

Assunto: Solicita Documentação para Desbloqueio de Recursos - Objeto sem Evolução há mais de 180 dias
Ref.: CR 856605/2017/MDR/CAIXA
Objeto: Pavimentação com Pedras Irregulares em Vias Públicas Urbanas - Rua Tamoios
Vigência: 21/10/2021
Recepção de BM entre o dia 01 e 07 de cada mês

Senhor Prefeito Municipal,

1. Referimo-nos ao Contrato de Repasse nº 856605/2017 celebrado entre a CAIXA e o Município de Capanema em 21/12/2017, no valor de R$ 385.806,65 (trezentos e oitenta e cinco mil e oitocentos e seis reais e sessenta e cinco centavos) tendo como objeto Pavimentação com Pedras Irregulares em Vias Públicas Urbanas - Rua Tamoios.

2. Informamos que a execução do objeto pactuado se encontra com prazo **superior a 180 (cento e oitenta) dias consecutivos sem evolução**, caracterizando-se como paralisada, motivo pelo qual **solicitamos o envio de documentação necessária para a realização do desbloqueio de recursos, no prazo máximo de 30 dias**.

2.1 Caso não seja possível o envio imediato da documentação, favor informar, no mesmo prazo acima, o motivo da ausência de execução financeira.

2.2 Solicitamos que o Convenente observe o cronograma físico-financeiro vigente e apresente evolução compatível com o percentual previsto para a etapa ou solicitação de reprogramação do cronograma físico-financeiro.

3. Conforme previsto na Portaria Interministerial 424/2016, notificamos o tomador quanto as medidas aplicáveis, dentre as quais se destacam:

3.1. Dada a paralisação da execução pelo prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, a CAIXA é obrigada a **promover** o **bloqueio da conta corrente específica** e, a partir deste momento, caso não haja comprovação da retomada de execução dentro de 180 (cento e oitenta) dias, a **rescisão**

CAIXA

do instrumento, caso não se enquadre na exceção do §19 do Art. 41 da PI 424/2016 (alterada pela PI 558/2019).

3.2. Quando o convenente tiver instrumentos apoiados com recursos do Governo Federal sem execução financeira por prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, **é vedada a liberação da primeira parcela de recursos para o início de execução de novos instrumentos**, caso não se enquadre na exceção do §19 do Art. 41 da PI 424/2016 (alterada pela PI 558/2019).

3.3 Caso entenda que há incidência de ressalva do item acima, favor encaminhar a solicitação de enquadramento e respectiva documentação comprobatória no prazo de 30 dias.

4. Destacamos ainda, que todo o recurso de repasse foi creditado pelo MDR.

5. Propondo-se, portanto, à efetiva regularização do contrato de repasse em tela, a CAIXA se coloca à disposição para prestar o apoio necessário à consecução dos objetivos propostos, inclusive com o agendamento de reunião presencial.

6. Estamos a disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

Respeitosamente,

PAULO AUGUSTO SCHADE
Coordenador de Filial
Representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel/PR

CÉLIO AMÉRICO ALVES IZIDORO
Gerente de Filial
Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/PR

Município de Capanema - PR
Secretaria de Planejamento e Gestão de Projetos

Ofício nº 05/2021

Capanema, 27 de janeiro de 2021.

Á
PAULO AUGUSTO SCHADE
Coordenador de Filial
REGOC/CV

Prezado Senhor;

Em atendimento ao ofício nº 0108/2021/REGOV/CV, datado de 21 de janeiro de 2021, referente ao projeto cujo objeto é **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TARRAPLANAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO NORTE E AV ATAÍDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA-PR EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 856605/2017 – OPERAÇÃO 1041530-91 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO**, segue o seguinte.

Chego à conclusão que subsidiado, pelo Parecer Técnico nº 05/2021, Croqui Demonstrativo das Tubulações DN 800 mm, no Projeto Original e o Real Executado bem como a Declaração de Responsabilidade sobre a Funcionalidade da Drenagem Pluvial, assinado pelo responsável técnico do município, solicito a essa REGOV/CV que **se proceda a Glosa definitiva do contrato de repasse em epigrafe que é de R$ 50.282,96 (cinquenta mil duzentos e oitenta e dois com noventa**

e seis centavos). A fim de que se finalize a pendência elencada no ofício supracitado.

Certos de podermos contar com atenção, e pronto atendimento, apresentamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Município de Capanema – PR
Departamento de Engenharia

PARECER TÉCNICO Nº 05/2021

Com relação ao contrato administrativo nº 329/2018 cujo objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TARRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO NORTE E AV ATAÍDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA-PR EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 856605/2017 – OPERAÇÃO 1041530-91 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO,** oriundo do certame licitatório Tomada de Preço nº 12/2018, no que tange ao ofício nº 0108/2021/REGOV/CV datado de 21 de janeiro de 2021, segue o seguinte.

O referido ofício informa a essa municipalidade, que a obra está com prazo superior a 180 dias consecutivos sem evolução, com isso solicita informações sobre o motivo da paralização e a evolução da obra, para trazer como consequência o futuro desbloqueio do recurso.

Salientou que conforme previsto na Portaria Interministerial 424/2016 que o tomador poderá tomar as medidas cabíveis dentre as quais se destacam a **rescisão do instrumento**, caso não se enquadre na execução do §19 do artigo 41 da PI 424/2016(alterada pela PI 558/2019).

DOS FATOS:

000722

Na data de 20 de novembro de 2019 através do parecer técnico nº 20/2019 folhas nº 0610 a 0612 do Processo Licitatório Tomada de Preços nº 12/2018 a então engenheira civil, fiscal do contrato, Katia B. Gularte, alertou sobre dois problemas distintos na obra conforme segue a redação" *além disso, devido a interpretação equivocada do projeto, a rede de drenagem de águas pluviais fora executada em desconformidade com o projeto original. Após fiscalização realizada pelo fiscal da caixa (empresa terceirizada), foi apontado a empresa que deveria refazer todas as bocas de lobo e parte da tubulação que estava com diâmetro inferior ao especificado no projeto".*

Cabe observar que a engenheira Katia apenas informou os problemas, entretanto não tomou nenhuma atitude como fiscal do contrato exigindo da empresa executora a resolução dos problemas.

Na data de 23/06/2020(última intervenção na obra por parte dessa municipalidade), o então fiscal do contrato o Engenheiro Eriki Takaschi Kurogi executou a 4ª medição, verificando que o mesmo mediu apenas as calçadas, restando apenas os tubos de DN 800 mm.

Através de um relatório técnico, o fiscal apontou que na conferência das bitolas dos tubos DN 800 mm para a medição, verificou patologias nas bocas de lobo, sendo que as mesmas não estavam conforme as especificações do projeto (o qual já tinha sido apontada anteriormente pela Engº Katia). Também verificou divergências em locais que deveriam ser tubulações de DN 800 mm e estavam com DN 600 mm, mas não especificou em números, não

0/20723

tomando nenhuma atitude como fiscal do contrato para solucionar tais problemas, apenas os apontou.

No inicio de novembro de 2020 a fiscalização da obra retornou pra mim, com isso a fim de sanar tais problemas vamos resolver os dois problemas distintos da seguinte maneira.

1 – Bocas de Lobo fora da especificação.

Na qualidade de fiscal do contrato, determinei a empresa executora que refizesse todas as bocas de lobo, que são num total de 23 unidades, dando um prazo máximo até a segunda quinzena de janeiro de 2021.

Dito isso a empresa imediatamente começou a executar tal determinação uma a uma, conforme detalhe das locação das bocas de lobo em anexo.

Documentei o andamento dos serviços sendo feitos e como ficaram, através do relatório fotográfico das bocas de lobo em anexo a esse parecer.

Cabe observar que todas as bocas de lobo ficaram dentro das especificações e funcionam a pleno, tornando todas as 23 unidades operacionais e funcionando conforme projetado, fazendo seu papel no escoamento das águas pluviais do projeto.

000724

2 – Divergência das Bitolas de tubos utilizados na Obra

Cabe observar que até a data de hoje foram feitas 04 medições apresentando um acumulado de 86,97% da obra e em dinheiro um total de R$ 335.523,69.

Se pegarmos o total da obra que é de R$ 385.806,65 descontando o valor acumulado restará o **saldo de R$ 50.282,96**.

Tal valor corresponde exatamente ao item do orçamento quantitativo 1.3.4 Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais diâmetro de 800 mm com junta rígida instalado no local, com o quantitativo de 182,00 m perfazendo um valor total em dinheiro de **R$ 50.282,96**.

Dito isso constata se que o saldo da obra é exatamente as tubulações de DN 800 mm.

No intuito de finalizar o problema, em vistoria no local da obra na data de 26 de janeiro de 2021, verificou se que deveria existir 182,00 m de tubulação de DN 800 mm (conforme projeto básico), entretanto existe 70,00 m, sendo utilizado no seu lugar tubulação de DN 600 mm na quantidade de 112,00 m, conforme detalhe específico em anexo a esse parecer.

O método de medição é por evento e não unitário, sendo assim não existe maneira de medir os tubos de 800 mm, uma vez que não

000725

estão assentados na sua totalidade e os tubos de DN 600 mm utilizados não têm como medir, até mesmo porque não teve autorização nenhuma por parte do município a essa alteração.

Nessa entoada mesmo com a divergência nas bitolas e com a execução das bocas de lobo dentro das especificações a Drenagem Pluvial está funcionando a pleno sem problemas de escoamento pluvial.

É O PARECER:

Diante ao explicitado acima, apesar da mudança de bitolas dos tubos a serem utilizados e como as bocas de lobo, após a intervenção da empresa executora da obra, estão usuais, o Micro Sistema de Drenagem Pluvial existente na obra está a contento, **sendo assim sou favorável que se proceda a Glosa definitiva do contrato em epigrafe que é de R$ 50.282,96 (cinquenta mil duzentos e oitenta e dois com noventa e seis centavos).** Nessa entoada finaliza se o contrato administrativo nº 329/2018 junto ao município de Capanema e o Contrato de Repasse nº 856605/2017 – Operação 1041530-91, junto a Caixa Econômica Federal através da REGOC/CV.

Segue em anexo a esse parecer os seguintes documentos:

1 – Croqui de Locação com as numerações das Bocas de Lobo.

2 – Relatório Fotográfico das Bocas de Lobo antes e depois da intervenção.

3 – Declaração do Fiscal do Contrato sobre a operacionalidade da Drenagem Pluvial.

4 – Detalhe explicitando o que deveria ser utilizado com DN 800 mm e o que foi feito na realidade.

Capanema, 27 de janeiro de 2.021

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

Município de Capanema – PR
Departamento de Engenharia


DECLARAÇÃO

Eu Rubens Luis Rolando Souza, Engenheiro Civil CREA RS 88.296/D, fiscal do contrato sob a ART nº 20171998970, **DECLARO QUE A MICROBACIA DE CONTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL, NOS LIMITES DA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO NORTE E AV ATAÍDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA-PR, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 856605/2017 ESTÁ FUNCIONANDO A PLENO, SEM NENHUM PROBLEMA, FAZENDO A SUA FUNÇÃO DOS ESCOAMENTOS DAS ÁGUAS PLUVIAIS.**

Capanema, 27 de janeiro de 2.021

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema
CREA RS-88296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

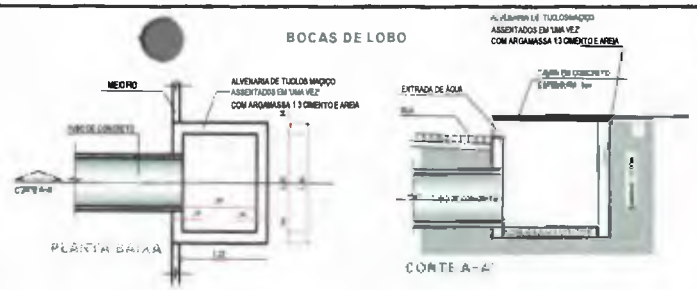

Rubens Luis Eduardo Soares
Eng.º Civil
CREA-RS 38.296/D

PLANTA DRENAGEM

Escala: 1/500

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

PROJETO PAVIMENTAÇÃO
LOCAÇÃO DAS BOCAS DE LOBO

01-01

837/2000

Município de Capanema – PR
Departamento de Engenharia

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BOCA DE LOBO Nº 1



Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone:46-3552-1321 – Fax:46-3552-1122
rubensengenharia@capanema.pr.gov.br



Capanema, 10 de novembro de 2.020

Rubens Luis Rolando de Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
CREA-RS 88.296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

000731



Capanema, 25 de janeiro de 2.021


Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Município de Capanema-PR
CREA-RS 88296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

Município de Capanema – PR
Departamento de Engenharia

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BOCA DE LOBO Nº 2

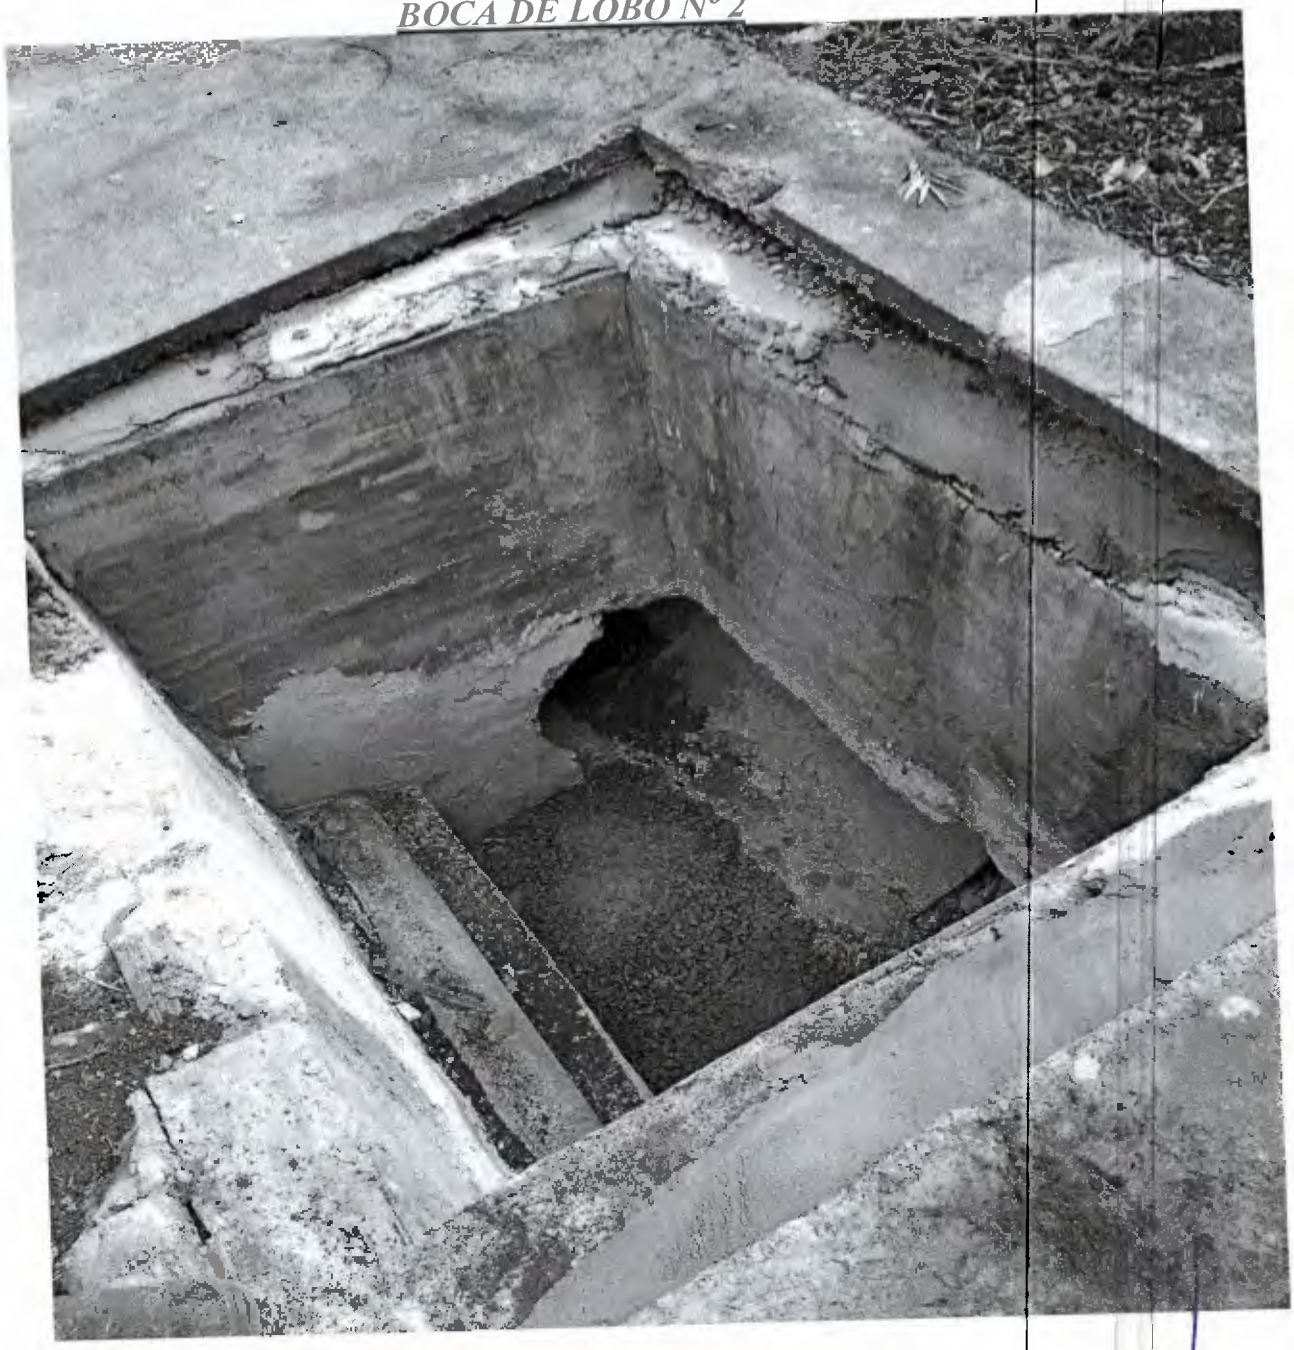

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone:46-3552-1321 – Fax:46-3552-1122
rubensengenharia@capanema.pr.gov.br





00/0735



Capanema, 10 de novembro de 2.020

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Mun. de Capanema-PR
CREA-RS 88296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

090736



Capanema, 25 de janeiro de 2.021

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Município de Capanema-PR
Crea RS 88296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BOCA DE LOBO Nº 3





0009739



Capanema, 10 de novembro de 2.020

Rubens Luis Rolando Souza
Eng° Civil Município de Capanema-PR

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

000740




Capanema, 25 de janeiro de 2.021

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

Município de Capanema – PR
Departamento de Engenharia

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BOCA DE LOBO Nº 4

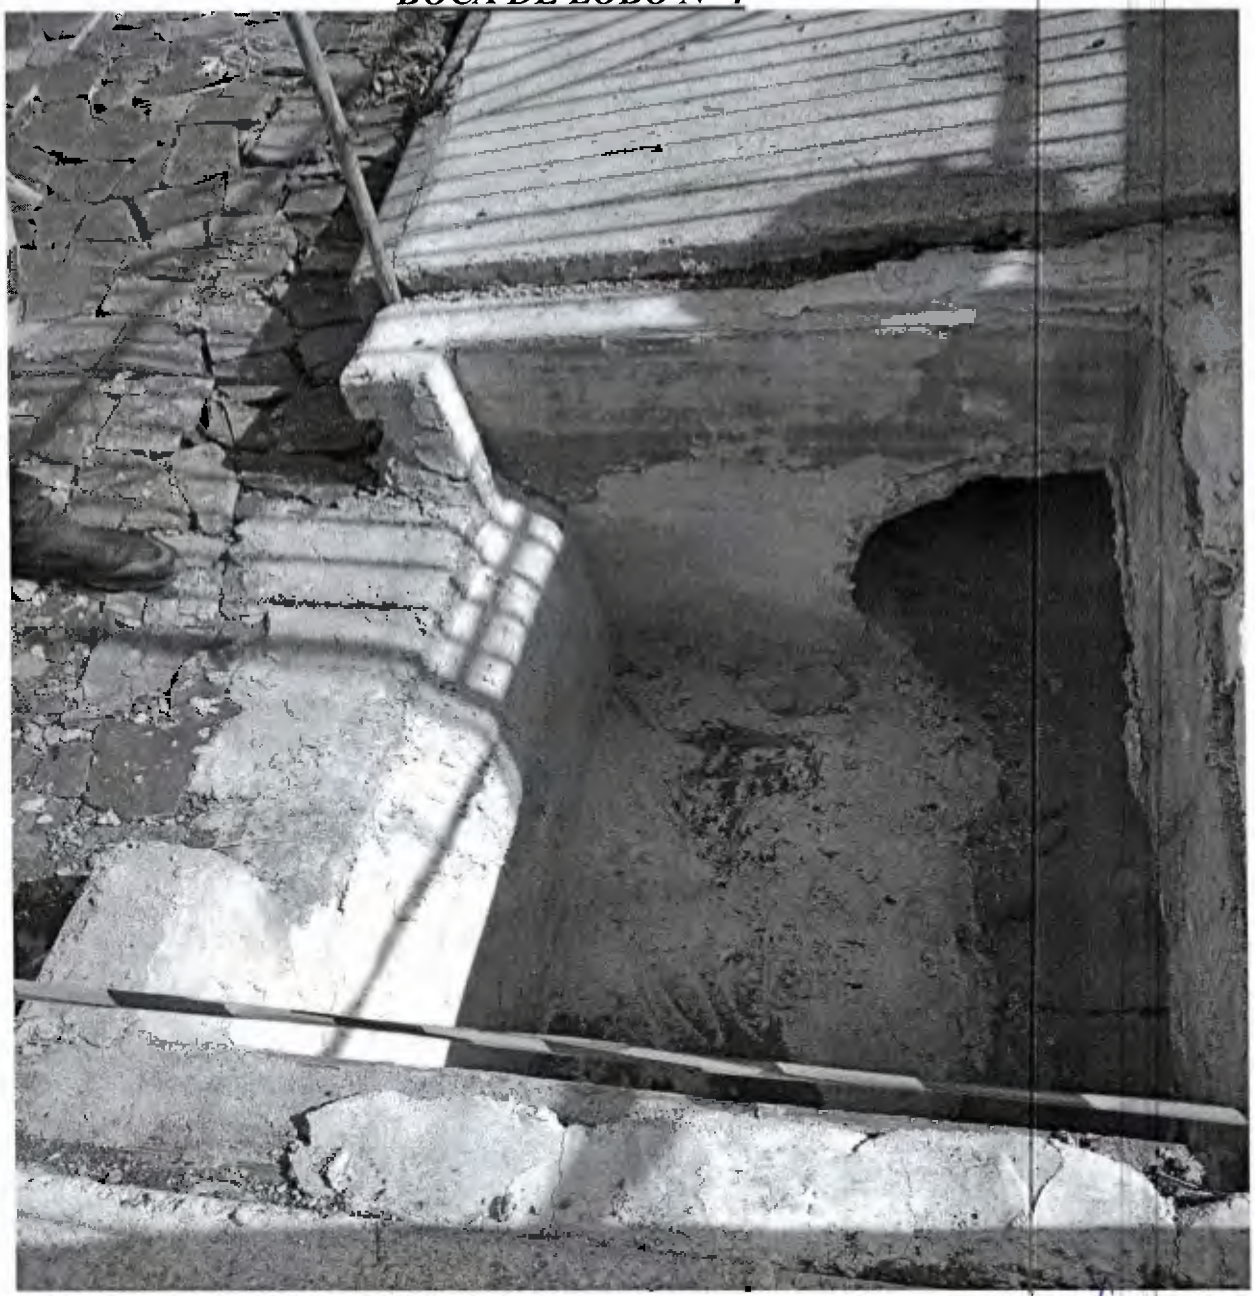



Capanema, 10 de novembro de 2.020

Rubens Luis Rolando Souza
Eng. Civil Município de Capanema-PR
CREA RS 88296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

000743



Capanema, 25 de janeiro de 2.021


Rubens Luis Rolando Souza
Eng° Civil de Capanema-PR

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

Município de Capanema – PR
Departamento de Engenharia

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BOCA DE LOBO Nº 5

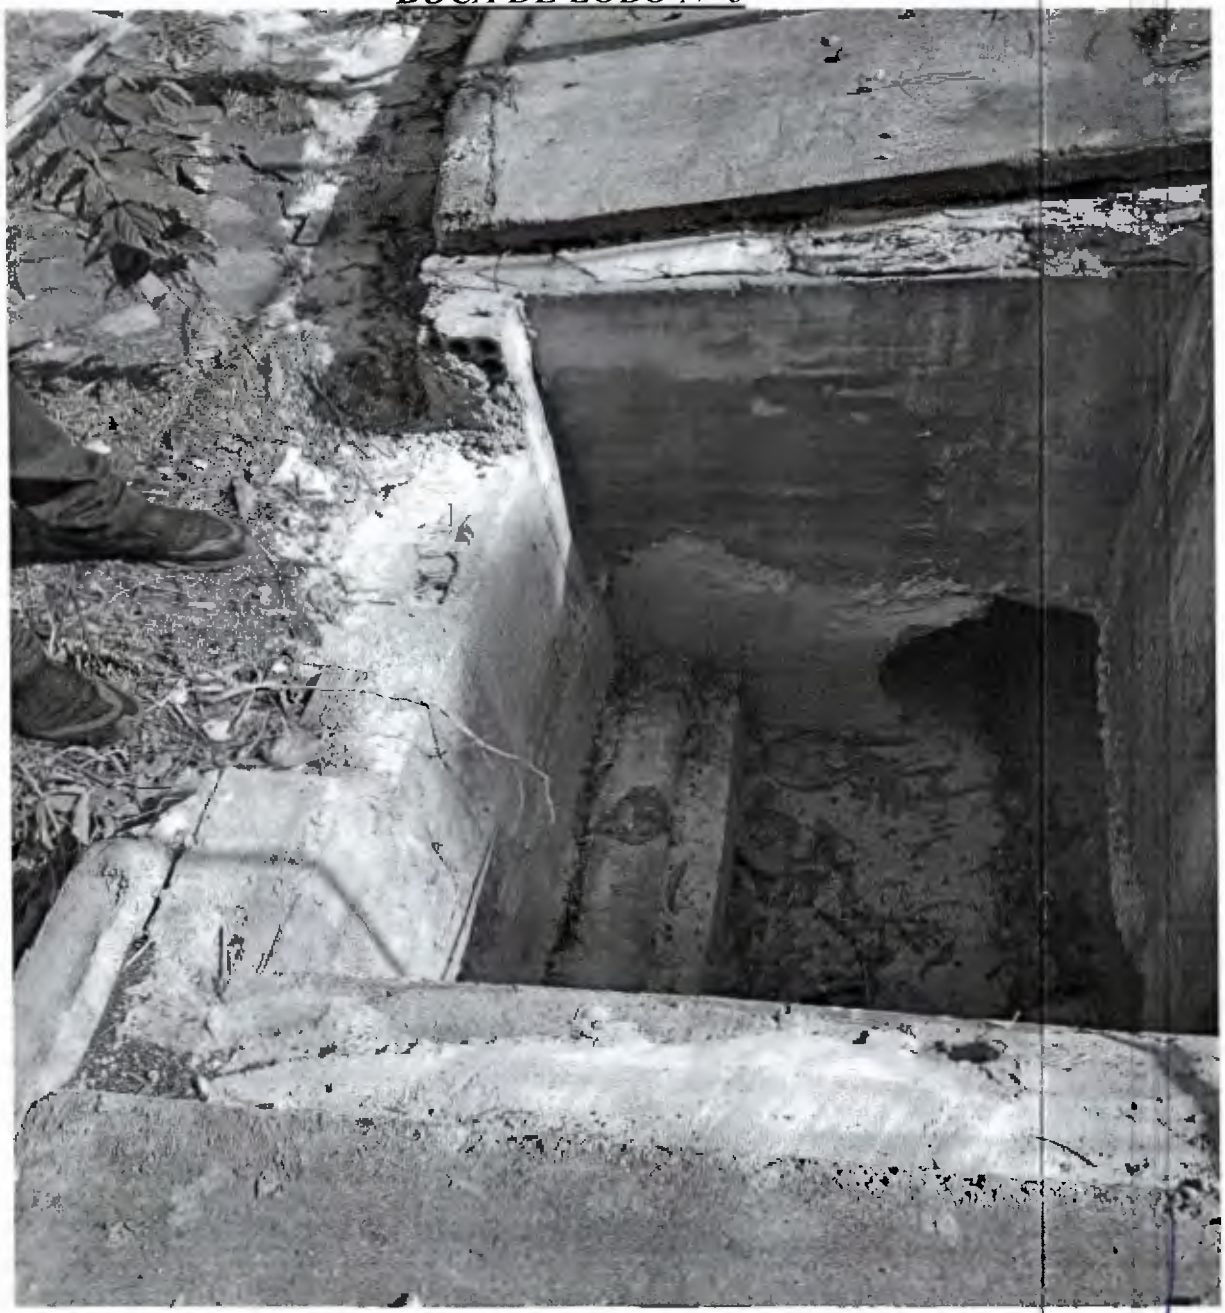

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone:46-3552-1321 – Fax:46-3552-1122
rubensengenharia@capanema.pr.gov.br



Capanema, 10 de novembro de 2.020

Rubens Luis Rolando Souza
Eng° Civil Município de Capanema-PR
CREA RS 88296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D



Capanema, 25 de janeiro de 2.021

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

00747

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BOCA DE LOBO Nº 6



Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone:46-3552-1321 – Fax:46-3552-1122
rubensengenharia@capanema.pr.gov.br

000748



Capanema, 10 de novembro de 2.020

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

000749



Capanema, 25 de janeiro de 2.021

Rubens Luis Rolando Souza
Eng° Civil Município de Capanema/PR

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

000750

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BOCA DE LOBO Nº 7



000751



Capanema, 10 de novembro de 2.020

Rubens Luis Rolando Souza
Eng° Civil Mat. Prof. de Capanema-PR
CREA RS 88296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

00752




Capanema, 25 de janeiro de 2.021

Rubens Luis Rolando Souza
Eng° Civil Município de Capanema PR
CREA RS 88296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BOCA DE LOBO Nº 8

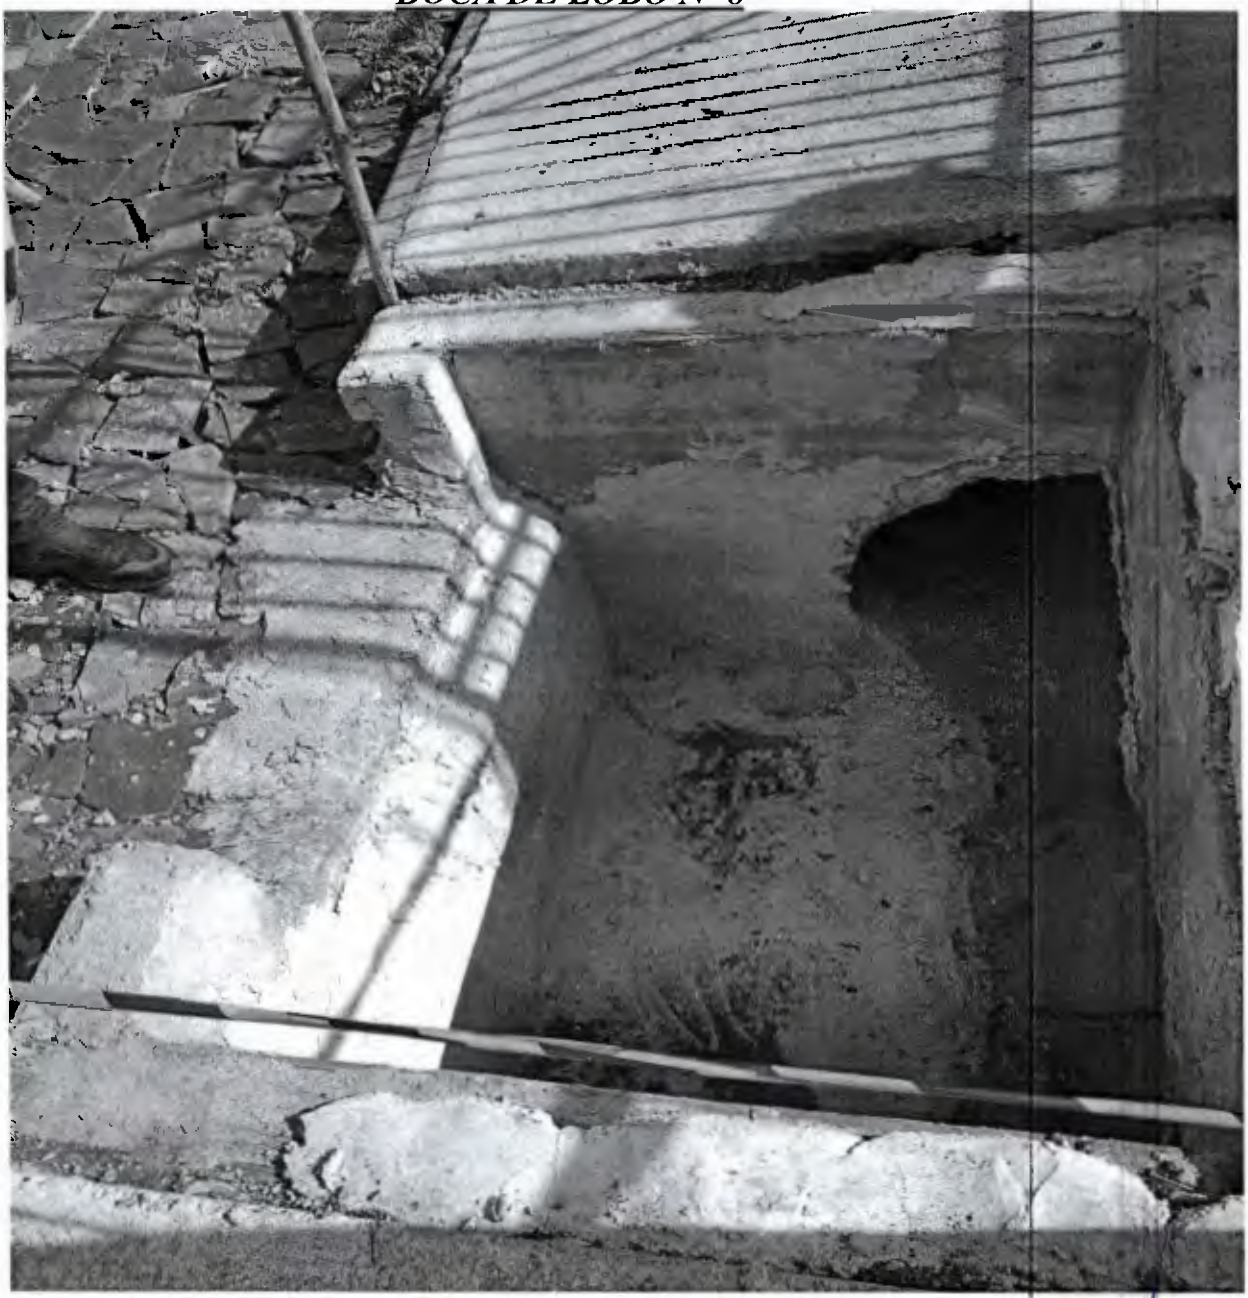

000754



Capanema, 10 de novembro de 2.020

Rubens Luis Rolando Souza

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

00755



Capanema, 25 de janeiro de 2.021

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

000756

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BOCA DE LOBO Nº 9



Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone:46-3552-1321 – Fax:46-3552-1122
rubensengenharia@capanema.pr.gov.br

000757



Capanema, 10 de novembro de 2.020

Rubens Luis Rolando Souza
Eng° Civil Mun. de Capanema - PR

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

060758



Capanema, 25 de janeiro de 2.02

Rubens Luis Rolando Souza
Eng. Civil Municipal de Capanema-PR
CREA RS-88296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

000759

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BOCA DE LOBO Nº 10



000760



Capanema, 10 de novembro de 2.020

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

000761



Capanema, 25 de janeiro de 2.021

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil
CREA RS-88296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

000762

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BOCA DE LOBO Nº 11



0000763



Capanema, 10 de novembro de 2.020

Rubens Luis Rolando Souza

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D



Capanema, 25 de janeiro de 2.021

Rubens Luis Rolando Souza
Eng° Civil Município de Capanema/PR
Crea RS 88296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

000765

ELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BOCA DE LOBO Nº 12



000766



Capanema, 10 de novembro de 2.020

Rubens Luis Rolando Souza
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho
CREA RS-88296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

000767



Capanema, 25 de janeiro de 2.020

Rubens Luis Rolando Souza
Eng° Civil Mat. Segurança do Trabalho

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

Município de Capanema – PR
Departamento de Engenharia

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BOCA DE LOBO Nº 13



000769



Capanema, 10 de novembro de 2.020

Rubens Luis Rolando Souza
Eng° Civil Mun. de Capanema-PR

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

000770



Capanema, 25 de janeiro de 2.021

Rubens Luis Rolando Souza
Eng° Civil Município de Capanema PR
CREA RS 88296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

000771

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BOCA DE LOBO Nº 14



000772



Capanema, 10 de novembro de 2.020

Rubens Luis Rolando Souza
Eng° Civil Mun. de Capanema-PR

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

000773



Capanema, 25 de janeiro de 2.021


Rubens Luis Rolando Souza

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

000774

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BOCA DE LOBO Nº 15

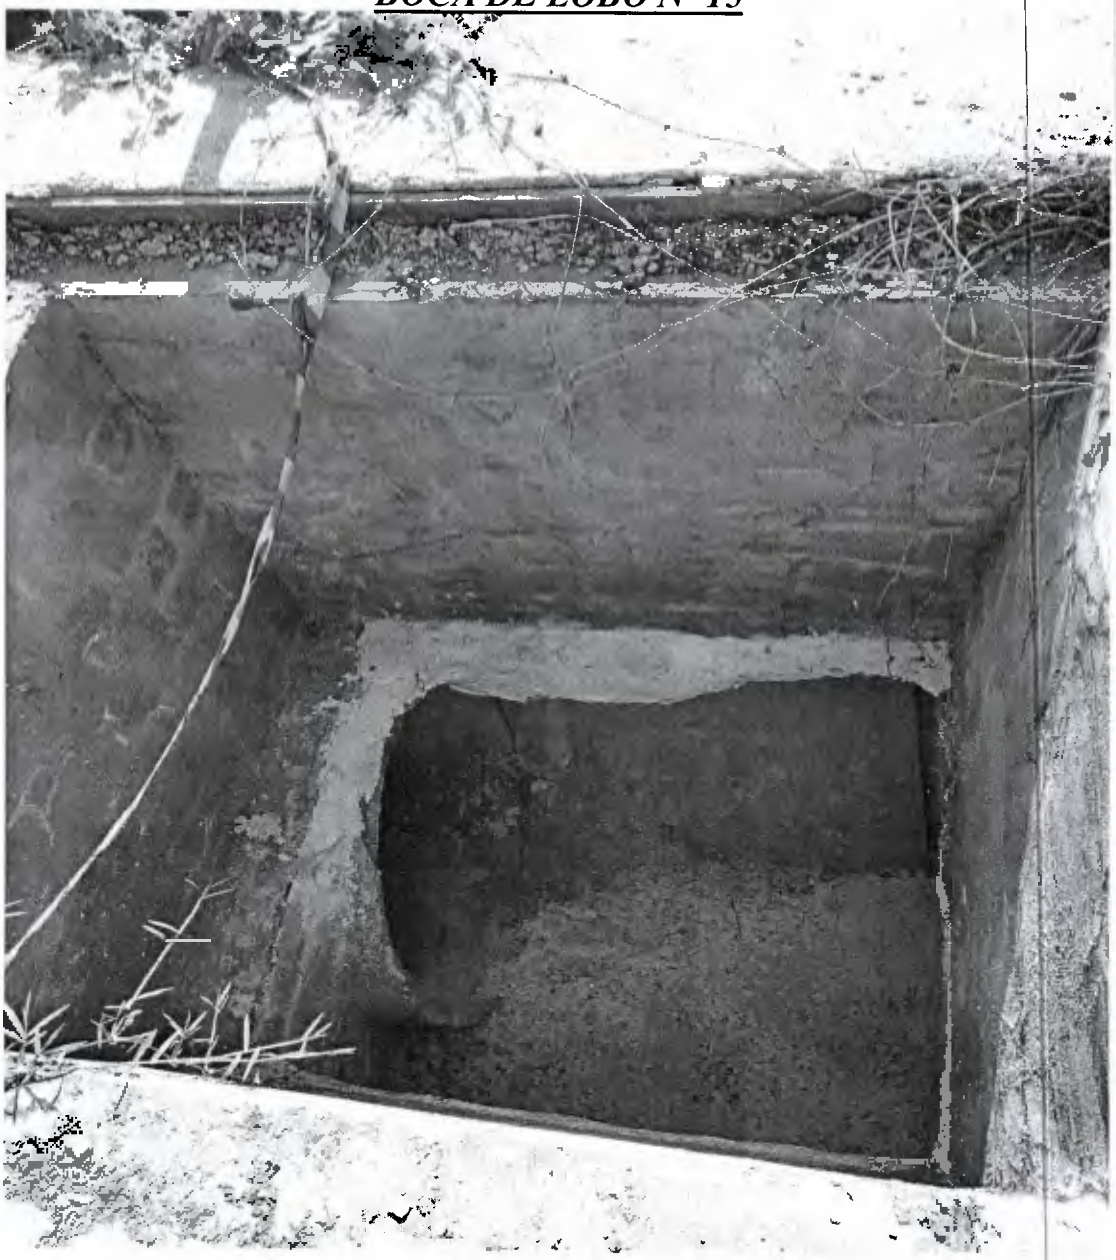

000775





Capanema, 10 de novembro de 2020

Rubens Luis Rolando Souza
Eng° Civil Município de Capanema-PR
CREA RS 88296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

000777



Capanema, 25 de janeiro de 2021

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Município de Capanema PR

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

0040778

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BOCA DE LOBO Nº 16



000779



Capanema, 10 de novembro de 2.020

Rubens Luis Rolando de Souza
Eng.º Civil Municipal

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

0000780



Capanema, 25 de janeiro de 2021


Rubens Luis Rolando Souza

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

000781

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BOCA DE LOBO Nº 17

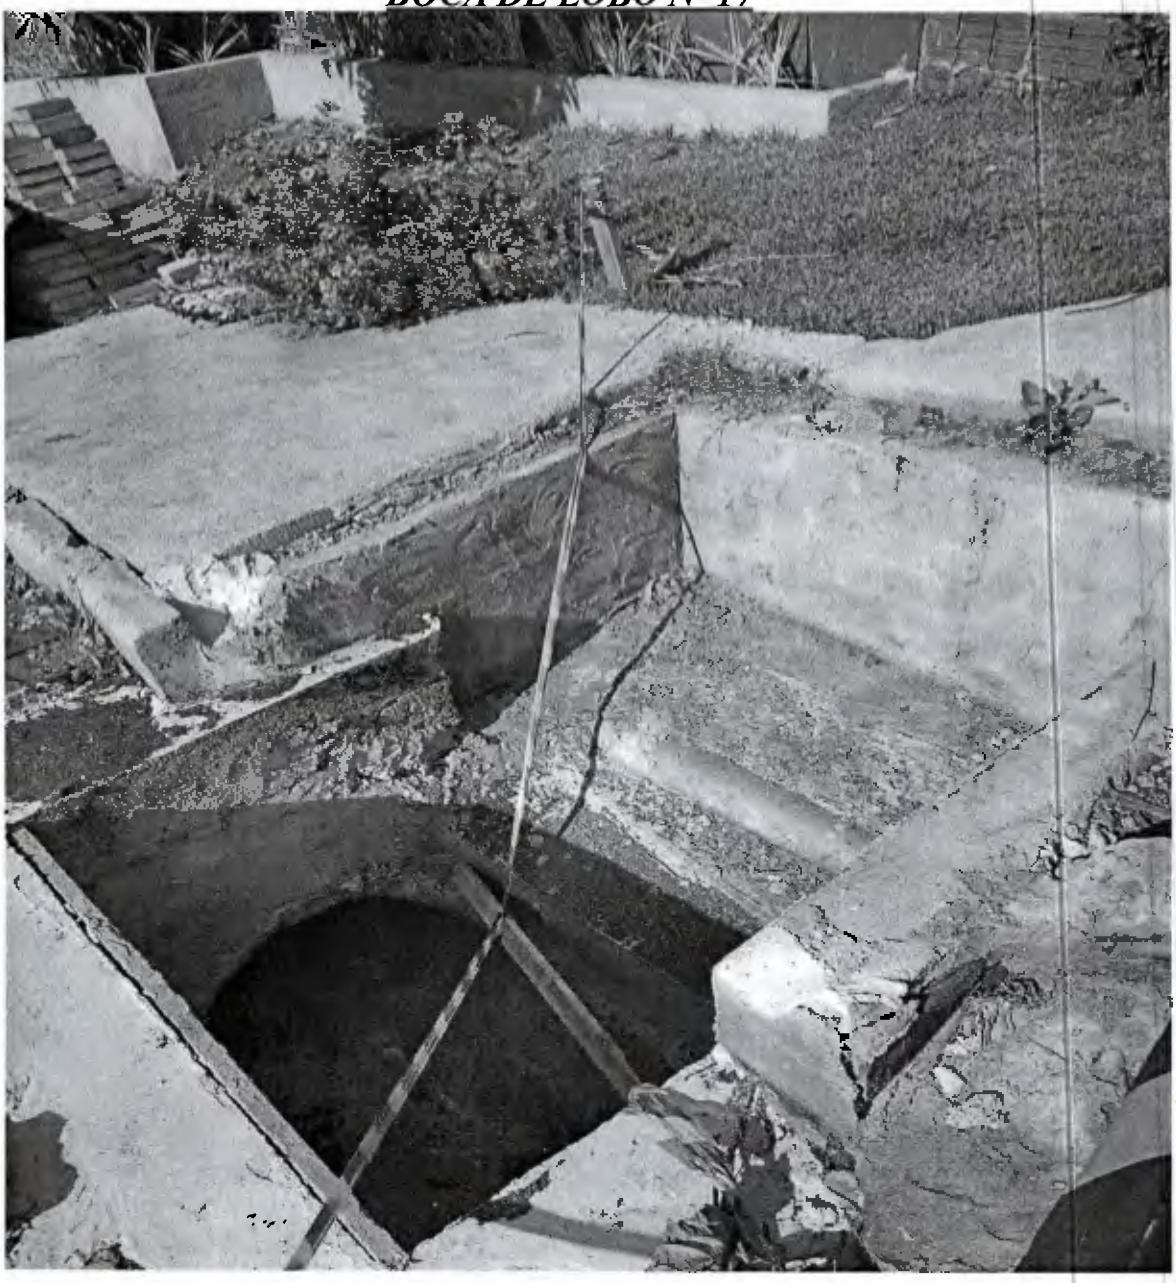

000782



Capanema, 10 de novembro de 2.020

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

000783



Capanema, 25 de janeiro de 2.021

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Mun. Capanema-PR
CREA RS

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

000784

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BOCA DE LOBO Nº 18



Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone:46-3552-1321 – Fax:46-3552-1122
rubensengenharia@capanema.pr.gov.br

0[illegible]0785



Capanema, 10 de novembro de 2.020

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D



Capanema, 25 de janeiro de 2.021

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

006787

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BOCA DE LOBO Nº 19



000788



Capanema, 10 de novembro de 2.020

Rubens Luis Rolando Souza
Eng° Civil Municipal
CREA RS-88296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D



Capanema, 25 de janeiro de 2.021

Rubens Luis Rolando Souza

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BOCA DE LOBO Nº 20



000791



Capanema, 10 de novembro de 2.020

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema PR
CREA RS-88296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

000792



Capanema, 25 de janeiro de 2.021

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil da Prefeitura Municipal de Capanema-PR
CREA RS-88296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

0793

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BOCA DE LOBO Nº 21



Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone:46-3552-1321 – Fax:46-3552-1122
rubensengenharia@capanema.pr.gov.br



Capanema, 10 de novembro de 2.020

Rubens Luis Rolando Souza

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D



Capanema, 25 de janeiro de 2.021

Rubens Luis Rolando Souza

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

Município de Capanema – PR
Departamento de Engenharia

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BOCA DE LOBO Nº 22



Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone:46-3552-1321 – Fax:46-3552-1122
rubensengenharia@capanema.pr.gov.br



Capanema, 10 de novembro de 2.020

Rubens Luis Rolando Souza

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D



Capanema, 25 de janeiro de 2.021

Rubens Luis Rolando Souza
Eng° Civil Município de Capanema-PR
CREA RS-88296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D


0/0799

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BOCA DE LOBO Nº 23



000300

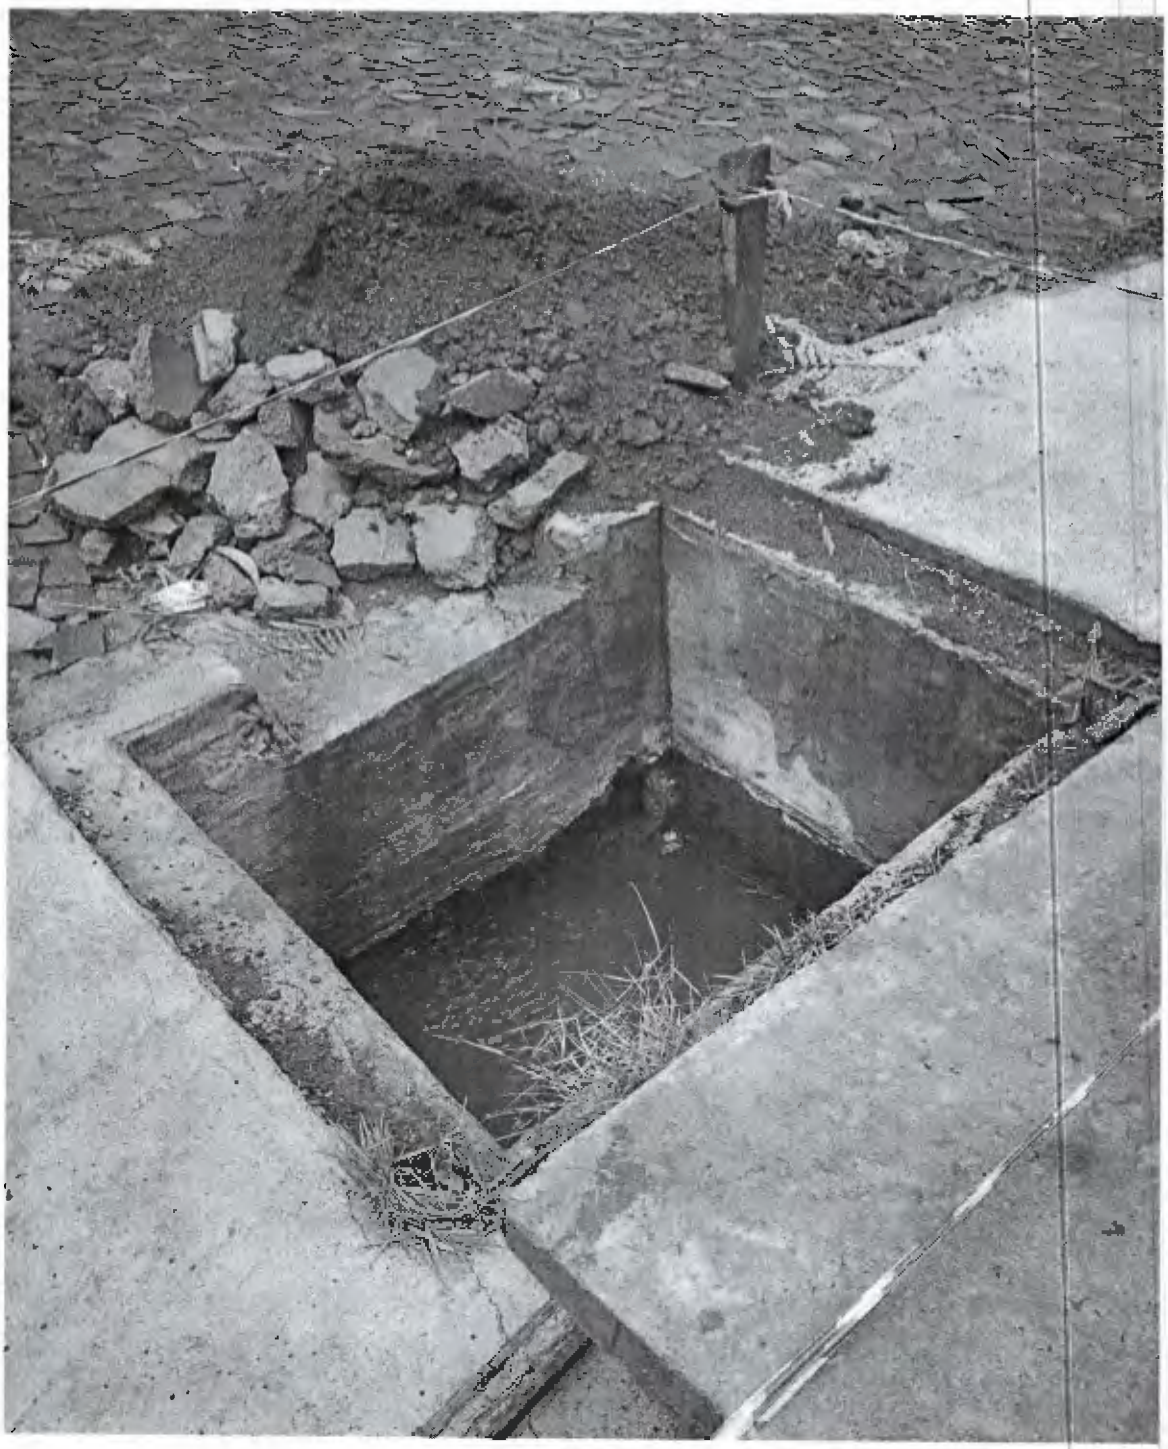





090303



Capanema, 10 de novembro de 2.020

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

005304



Capanema, 25 de janeiro de 2.021

Rubens Luis Rolando Souza

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

0/0305

PROJETO ORIGINAL

LEGENDA:

Tubos: (A Executar)

Ø=800 182,00 Metros



Rubens Luis Rolando Souza

27/01/2021

060806

PROJETO EXECUTADO

LEGENDA:

Tubos: (Executados)

Ø=800	70,00 Metros
Ø=600	112,00 Metros
TOTAL	182,00 Metros



27/01/2021

Município de Capanema - PR
Secretaria de Planejamento e Gestão de Projetos

Capanema, 27 de janeiro de 2021.

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRA
CONTRATO N 329/2018

Tendo em vista o que preceitua o contrato nº 0329/2018, assinado com esta municipalidade, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TARRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO NORTE E AV ATAÍDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA-PR EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 856605/2017 OPERAÇÃO 1041530-91 PROGRAMA PLANEJAMNETO URBANO,** oriundo do certame licitatório Tomada de Preço nº 12/2018 declaro que, mesmo procedendo a glosa definitiva do contrato em epigrafe referente a troca de tubulação conforme parecer técnico nº 05/2021 desta Secretaria Municipal, a obra está dentro das conformidades sem nenhum problema técnico, estando a mesma em condições de uso ao que se foi proposta.

Atenciosamente,

Engenheiro Rubens Luis Rolando Souza
CREA RS 88.296/D
Fiscal da Obra

CAIXA

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel
Rua Souza Naves, 3891 – Bairro Centro
85.810-070 – Cascavel - PR

Ofício nº 0329 / 2021 / REGOV/CV

Cascavel, 1 de Março de 2021

Assunto: Aprova Reprogramação de Valores de Itens de Investimento por Glosa Definitiva
Ref.: CR 856605/2017/MDR/CAIXA
Objeto: Pavimentação com Pedras Irregulares em Vias Públicas Urbanas - Rua Tamoios
Conta corrente: 1256.006.00647240-5
Vigência: 21/10/2021

Senhor Prefeito Municipal,

1. Conforme solicitação desse Convenente, foi procedida análise técnica da reprogramação do contrato em referência, visando à redução do valor de itens de Investimento, devido à glosa definitiva de serviços executados em desconformidade com os projetos.

1.1 Considerando a documentação e justificativas apresentadas pelo Município, entende-se não haver objeções, sob aspectos técnicos de Engenharia, para o aceite da Glosa Definitiva solicitada de **R$ R$ 50.282,96**, ficando o valor do Investimento reduzido para **R$ 335.523,69**.

1.2 Em anexo, guia de ressarcimento de custos no valor de **R$ 744,00**, referente à reanálise e após o recolhimento encaminhar comprovante a esta REGOV Cascavel.

2. Em decorrência da reprogramação e da alteração do valor do investimento, que passou de **R$ 385.806,65** para R$ **R$ 335.523,69**, e considerando que não há valores pendentes de desbloqueio, **o Município deverá emitir todos os relatórios de execução** na Plataforma +Brasil:

a) Físico do Plano de Trabalho;
b) Financeiro do Plano de Trabalho;
c) Receitas e Despesas.

2.1 Assim que enviar os relatórios para análise via Plataforma + Brasil, comunicar esta REGOV por e-mail, e observar que somente após a aprovação dos relatórios de execução o Convenente estará apto a iniciar o módulo prestação de contas.

3. A prestação de contas final será analisada na Plataforma + Brasil mediante comunicação à CAIXA, sendo que o **Convenente tem até 30 dias após a autorização de saque final** e a finalização dos pagamentos para atualizar as informações e o devido registro do(s) documento(s), não sendo necessária a apresentação em meio físico.

4. **Após aprovação dos relatórios de execução pela CAIXA**, solicitar antecipação da vigência do contrato, se for o caso, utilizando a opção "Antecipação de prestação de contas" e concluir a atualização de todas as abas no módulo prestação de contas:

- Resgate de todo saldo remanescente, repasse e rendimentos, por meio da funcionalidade "solicitar resgate saldo aplicação";
- Após constar saldo resgatado solicitar autorização para Devolução – aba Saldo Remanescente – **opção 2 da Devolução** e comunicar o envio por e-mail;
- Após comunicação da REGOV Cascavel, o Tomador deverá incluir corretamente os valores informados e efetuar os procedimentos de inclusão e envio de OBTV, sendo que o valor de saldo de Repasse, se houver, deve ser devolvido integralmente à União e o saldo de rendimentos pode ser devolvido proporcionalmente;
- Incluir na aba Anexos:
  - Declaração do Administrador Municipal de que notificou os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais acerca do repasse liberado de recursos OGU (Lei nº. 9.452, de 20/03/1997);
- Envio da prestação de contas para análise, comunicando o envio por e-mail.

4.1 O não atendimentos ao prazo e a não inclusão dos registros na Plataforma + Brasil referente à prestação de contas poderá propiciar abertura de Tomada de Contas Especial por omissão do dever de prestar contas, de acordo com a legislação vigente - Diretriz MPOG nº 11/2011.

4.2 Após a conclusão do trâmite de Prestação de Contas na Plataforma + Brasil, e após a aprovação pela CAIXA e SIAFI, o Convenente é comunicado por meio de ofício.

5. No caso de evento de inauguração, a Placa de Inauguração de empreendimento com investimento do Governo Federal, deverá ser confeccionada conforme modelo disponibilizado pela CAIXA que segue os padrões publicados pela SECOM (Secretaria Especial de Comunicação Social, da Presidência da República).

5.1 O modelo será enviado pela REGOV mediante solicitação por e-mail, em momento oportuno à confecção.

5.2 As inaugurações de obras deverão ser comunicadas à CAIXA com antecedência de no

mínimo 30 dias, em tempo hábil para participação de representantes governamentais.

6. Estamos a disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

Respeitosamente,

MIGUEL FIGUEIRÓ
Assistente Júnior
Representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel/PR

MARCIA ZWIEREWICZ
Coordenadora de Filial Substituta Eventual
Representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel/PR

CÉLIO AMÉRICO ALVES IZIDORO
Gerente de Filial
Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/PR

000811

MEMORANDO INTERNO 10/2021

A/C:

Drº **ROMANTI EZER BARBOSA**

Procurador Municipal

Utilizando deste instrumento para dar ciência dos acontecimentos, referente ao contrato administrativo nº 329/2018 cujo objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO NORTE E AVENIDA ATAÍDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA-PR EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 856605/2017 OPERAÇÃO 10441530-91 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO**, origem do certame licitatório Tomada de preços nº 12/2018, na qual sagrou se vencedora a Empresa AA Colussi & Cia Ltda, segue os seguintes relatos.

De maneira objetiva resumirei as informações, a fim de que subsidie o conteúdo dos acontecimentos para que a Procuradoria Municipal possa absorver o conteúdo e que possamos ter um **norte jurídico** dos acontecimentos futuros, no intuito de encerrarmos o contrato em epigrafe.

DOS FATOS RELATIVOS À RELAÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL

000812

Os acontecimentos estão explicitados de maneira pormenorizada conforme segue abaixo:

•Na Manifestação Técnico de 20/08/2020 folhas nº 0696 a 0709 do PA.

•Correio eletrônico enviado a Caixa Econômica Federal em 15/12/2020 folhas nº 0712 a 0713 do PA.

•Ofício nº 05/2021 de 27/01/2021 endereçado a Caixa Econômica Federal folhas nº 0719 a 0720.

•Perecer Técnico nº 05/2021 datado de 27/01/2021 folhas nº 0721 a 0726 do PA.

•Declaração de Responsabilidade sobre a Drenagem Pluvial datado de 27/01/2021 folha nº 0727.

•Croqui com todas as bocas de Lobo a serem refeitas folha nº 0728 do PA.

•Relatório Fotográfico de todas as 23 unidades das bocas de Lobo antes e depois da intervenção por parte da empresa executora folhas nº 0729 a 0804 do PA.

•Projeto de Drenagem Original e Drenagem Executada referente as tubulações de DN 80 cm folhas nº 0805 a 0806 do PA.

•Termo de Recebimento Provisório de Obras datado de 27/01/2021 folha nº 0807 do PA.

•Ofício nº 329/2021 datado de 01/03/2021 da Caixa Econômica Federal aprovando a reprogramação dando como finalizado o contrato de repasse em questão com o nosso município.

Resumidamente a Empresa executora por sua conta e risco, sem autorização de qualquer fiscal do contrato que teve na obra, sem autorização pelo Secretário Municipal da Pasta tanto da de Planejamento e Projetos quanto a de Viação e Obras, muito menos do Prefeito Municipal, ao invés de executar 182,00 m de tubulação de DN 80 cm(conforme projeto) executou 70,00 m de DN 80 cm e 112.00 m de DN 60 cm, nesta entoada também obedecendo uma determinação minha como fiscal do contrato realizou uma reforma e ampliação das bocas de lobo projetadas(23 unidades) deixando o Microssistema de Drenagem Pluvial da Intervenção em completa operação sem problema técnico nenhum. Diante de tal feito foi determinada que se proceda a glosa definitiva do valor integral das tubulações de DN 80 cm no valor de R$ 50.282,96 que era exatamente o saldo da obra, uma vez que a Caixa Econômica se manifestou que não poderia utilizar o recurso do convênio para pagar o que foi executado 112,00 m de DN 60 cm e 70,00 m DN 80 cm pois não estava no Projeto original, que deveria ter sido seguido.

Cabe observar que todos os itens elencados acima foram devidamente enviados a Caixa Econômica Federal e verificados em vistoria pelo Engenheiro Fiscal da REGOC/CV na obra, acompanhado por mim, com isso pode se observar que a caixa estava presente em

todos os acontecimentos relatados tornando tudo transparente aos entes envolvidos nessa relação, Ministério Detentor dos Recursos (representado pela Caixa Econômica Federal) e Município de Capanema(representado por mim), bem como a Empresa Executora.

DAS SOLICITAÇÕES POR PARTE DA EMPRESA EXECUTORA

A empresa Executora reivindica três situações que passaremos a pontuar cada uma em separado.

SITUAÇÃO 01:

Empresa:

A empresa executou 70,00 m de tubulação de DN 80 cm e 112,00 m de tubulação de DN 60 cm (conforme folha nº 0806 do PA). Com isso a mesma solicita que se proceda a medição de tais serviços e consequentemente pague por eles.

Os serviços pleiteados a serem medido são

Item 1.3.3 Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais diâmetro de 600 mm, Junta Rígida instalado no local com baixo nível de interferência – fornecimento e assentamento. (código SINAPI 92212)

Item 1.3.4 Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais diâmetro de 800 mm, Junta Rígida instalado no local com baixo nível de interferência – fornecimento e assentamento. (código SINAPI 92214)

Para o cálculo do valor unitário será adotado o mesmo código da tabela do SINAPI, porém com a tabela mais atual, no presente momento é a de fevereiro de 2021, sendo acrescido o BDI adotado pela empresa e aplicado o desconto dado no certame licitatório.

Item	Código SINAPI	Descrição	Unidade	Quantidade	R$/unit sem BDI	BDI 26,85%	Desconto 0,31%	R$/unit com BDI	R$ total
1.3.3	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	112,00	165,52	44,44	6,51	203,45	22.786,77
1.3.4	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	70,00	256,66	68,91	10,09	315,48	22.083,63
TOTAL DA SITUAÇÃO 01									**44.870,40**

Minha Posição como Fiscal:

O projeto Básico e orçamento proposto pela própria empresa, definiria que fosse executado, medido e pago nesse trecho (conforme detalhe na folha 0806 do PA),182,00 m de tubulação DN 80 cm.

Pois bem na qualidade de fiscal do contrato constatei tal anomalia e estudando o processo licitatório mais a pasta da obra, não achei nenhuma autorização, por parte de nenhum dos três fiscais que passaram pela obra, nem do Secretário Municipal de Planejamento ou Viação e Obras, muito menos do Prefeito Municipal, para tal mudança nas bitolas das tubulações, dito isso em decisão conjunta com a fiscalização da REGOC/CV definimos que a empresa não tem direito de receber por tais serviços pois vão em contramão do que foi projetado e orçado, uma vez que a obra é empreitada global e as medições são por eventos e não por unidades.

Verdade seja dita que com a reexecução das 23 unidades de bocas de lobo, sendo reformadas e aumentadas as espessas da empresa executora (por minha determinação) e mesmo com a alteração das bitolas, a obra ficou usual no que tange a drenagem pluvial conforme declaração feita por mim conforme folha nº 0727 do PA.

SITUAÇÃO 02

Empresa:

A empresa alega que no trecho entre as ruas Rio Grande do Norte e Ceará, onde explicita no projeto tubulações existentes com

000817

DN 60 cm no lado direito estavam enterrados, sem condições de uso, conforme Relatório encartado no PA na folha nº 0638. Com isso a empresa executou o serviço para não parar a obra e está cobrando do Municipio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

A/C

RUBENS L. R. SOUZA

RELATÓRIO

Referente Drenagem e Pavimentação, Rua Tamoios

Constatamos que na Rua tamoios,entre o bueno grande e a Rua Ceará, não tem tubulação e no projeto consta como existente

Constatamos também que na Rua Tamoios, entre as Ruas Ceará e Rio Grande do Norte, a tubulação esta toda entupida.

Para estes concertos e reposições, orçamos em 70 (setenta) tubos de 80cm, e 87 (oitenta e sete) tubos de 60cm. Também sera necessário: 20 horas de maquina Escavadeira Hidráulica, para escavação, retirada e reposição. E 12 horas de Pá Carregadeira, e mão de obra para execução.

Solicitamos que nos apresente, uma sugestão para sanarmos este problemas

Agradecemos a sua atenção e ficamos no aguardo

Atenciosamente

Capanema 15 de março de 2019.

A. A. Colussi & Cia Ltda

Aldo Alfredo Colussi

sócio

84.840.503/0001-65

A.A COLUSSI & CIA LTDA

Rua Pedro Cirio, 303
85760-000 Capanema PR

000818

Minha Posição como Fiscal:


Na época do acontecido em 15 de março de 2019 eu não era fiscal do contrato, porém estive na obra quando a empresa executora estava retirando os tubos enterrados de DN 60 cm.

Constatei que os mesmos não tinham condições de uso, sendo necessário a execução da escavação, assentamento de novos tubos de 60 cm e reaterro o qual não estava previsto originalmente no projeto básico.

Diante de tal fato, orientei o empreiteiro para fazer um relatório ao município documentando a situação, e assim o fez conforme encartado nesse memorando.

Sem passar pela autoridade do fiscal do contrato da época, no intuito de ajudar no andamento da obra, elaborei um memorando interno de número 04/2019(folhas nº 0639 a 0642 do PA) sendo encaminhado ao Eminente Secretário Municipal de Planejamento e Projetos na pessoa do senhor Paulo Fernando Lazzaretti Orso cujo protocolo nº 607/2019 datado de 26/03/2019, na qual relata o acontecido e juntamente com fotos para que o mesmo informasse o fiscal do contrato da ocasião, a fim de tomar as devidas providencias que lhe cabem.

Para o melhor entendimento, segue abaixo um croqui da situação supracitada.

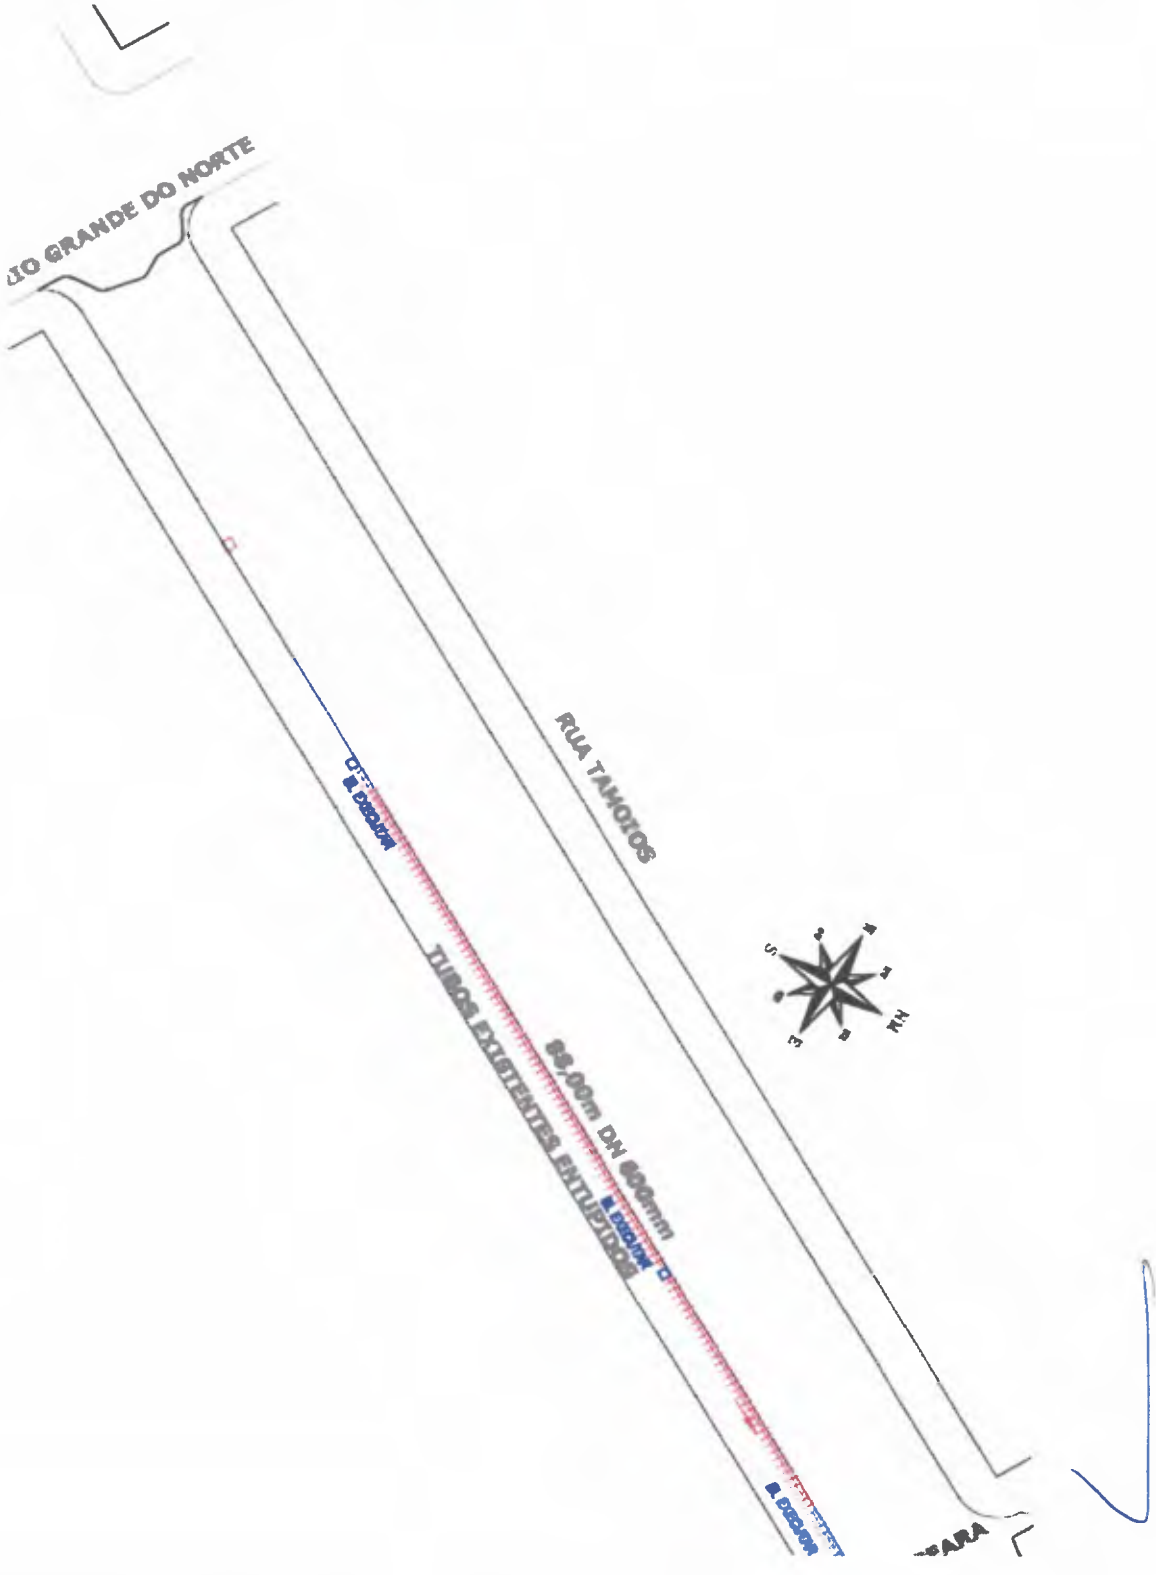
RIO GRANDE DO NORTE
RUA TAMOIOS
TUBOS EXISTENTES ENTUBADOS
88,00m DN 600mm
PARA

Pois bem, das 88,00 unidades de tubo de DN 60 cm utilizadas 30,00 unidades foram fornecidas pelo município através da Secretaria Municipal de Viação e Obras em relato feito pelo próprio empreiteiro a mim, com isso ele executou os seguintes serviços elencados abaixo:

Item 1.3.1 Escavação Mecânica a céu Aberto em material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica capacidade 0,78 m3. (código SINAPI 83338), cabe observar na tabela atual o código do item passa a ser 90091.

Item 1.3.2 Aterro Mecanizado de Vala com retroescavadeira capacidade da caçamba da retro 0,26 m2/potência 88 HP profundidade de 1,50 m a 3,00 m com solo argiloso/arenoso. (código SINAPI 94317)

Item 1.3.3 Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais diâmetro de 600 mm, Junta Rígida instalado no local com baixo nível de interferência – fornecimento e assentamento. (código SINAPI 92212)

Item novo que é o mesmo 1.3.3 somente sem a utilização do Tubo DN 600 mm que será demonstrado o seu custo através de uma composição de custo unitário.

CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS:

1.3.1 Escavação Mecânica:

Volume = C(comprimento) x (largura) x P(profundidade)

Volume = 88,00 m x 0,50 m x 1,00 m

Volume = 44,00 m3

1.3.2 Aterro Compactado

A(Reaterro) = V1(volume escavação) – V2(volume dos tubos)

V2 = (0,60m x 0,60 m x 3,14)/4) x Comprimento

V2 = (0,60 m x 0,60 m x 3,14)/4 x 88,00 m

V2 = 24,87 m3

A = 44,00 m3 – 24,87 m3

A = 19,13 m3

Item 1.3.3 Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais diâmetro de 600 mm

DN 60 cm = 58,00 m

Item Novo Assentamento de Tubo DN 600 mm sem o tubo

DN 60 cm = 30,00 m

Cálculo Dos Custos Unitários

Para o cálculo do valor unitário será adotado o mesmo código da tabela do SINAPI, porém com a tabela mais atual, no presente momento é a de fevereiro de 2021, sendo acrescido o BDI adotado pela empresa e aplicado o desconto dado no certame licitatório.

Somente no item novo que é o Assentamento do Tubo será feito uma composição de custo unitário sem o fornecimento do tubo conforme segue abaixo:

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

ASSENTAMENTO DE TUBOS DN 600 MM SEM O TUBO

Código SINAPI	DESCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT	R$ UNITÁRIO	R$ TOTAL
	EQUIPAMENTOS				
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,10500	143,50	15,07
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,22100	60,84	13,45
	TOTAL DO ITEM				**28,51**
	MÃO DE OBRA				
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,49300	20,78	10,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,98600	17,52	17,27
	TOTAL DO ITEM				**27,52**
	MATERIAIS				
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,00500	479,49	2,40
	TOTAL DO ITEM				**2,40**

Equipamento	R$	28,51
Material	R$	2,40
Mão de Obra	R$	27,52
Total da Composição	**R$**	**58,43 / M2**

De posse dos quantitativos e preços unitários seguiremos o cálculo com a seguinte tabela demonstrativa de custos:

Item	Código SINAPI	Descrição	Unidade	Quantidade	R$/unit sem BDI	BDI 26,85%	Desconto 0,31%	R$/unit com BDI	R$ total
1.3.1	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	44,00	4,27	1,15	0,17	5,25	230,94
1.3.2	94317	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	19,13	21,74	5,84	0,85	26,72	511,20
1.3.3	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	58,00	165,52	44,44	6,51	203,45	11.800,29
	comp	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - SEM FORNECIMENTO DO TUBO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	30,00	58,43	15,69	2,30	71,82	2.154,62
TOTAL									**14.697,05**

Como neste caso específico eu participei de maneira indireta e atesto que os serviços foram feitos, porém sem nenhuma autorização por nenhuma pessoa por parte do município, eu considero que o empreiteiro teria direito a receber pelo montante descrito na última planilha que é o valor de **R$ 14.697,05** (quatorze mil reais com seiscentos e noventa e sete reais com cinco centavos).

SITUAÇÃO 03:

De maneira análoga a situação 02 o empreiteiro alega que na rua Tamoios entre as ruas Ceará e Bueirão a tubulação que originalmente no projeto Básico constava como DN 80 cm existente, não existe, portanto só previa no orçamento a execução das bocas de lobo.


Com isso a Empresa Executora segunda a sua versão, executou os serviços para a obra não paralisar, sendo que os mesmos seguem descritos abaixo.

Item 1.3.1 Escavação Mecânica a céu Aberto em material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica capacidade 0,78 m3. (código SINAPI 83338), cabe observar na tabela atual o código do item passa a ser 90091.

Item 1.3.2 Aterro Mecanizado de Vala com retroescavadeira capacidade da caçamba da retro 0,26 m2/potência 88 HP profundidade de 1,50 m a 3,00 m com solo argiloso/arenoso. (código SINAPI 94317)

Item 1.3.4 Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais diâmetro de 800 mm, Junta Rígida instalado no local com baixo nível de interferência – fornecimento e assentamento.

Para melhor elucidar a situação segue abaixo um detalhe da situação.

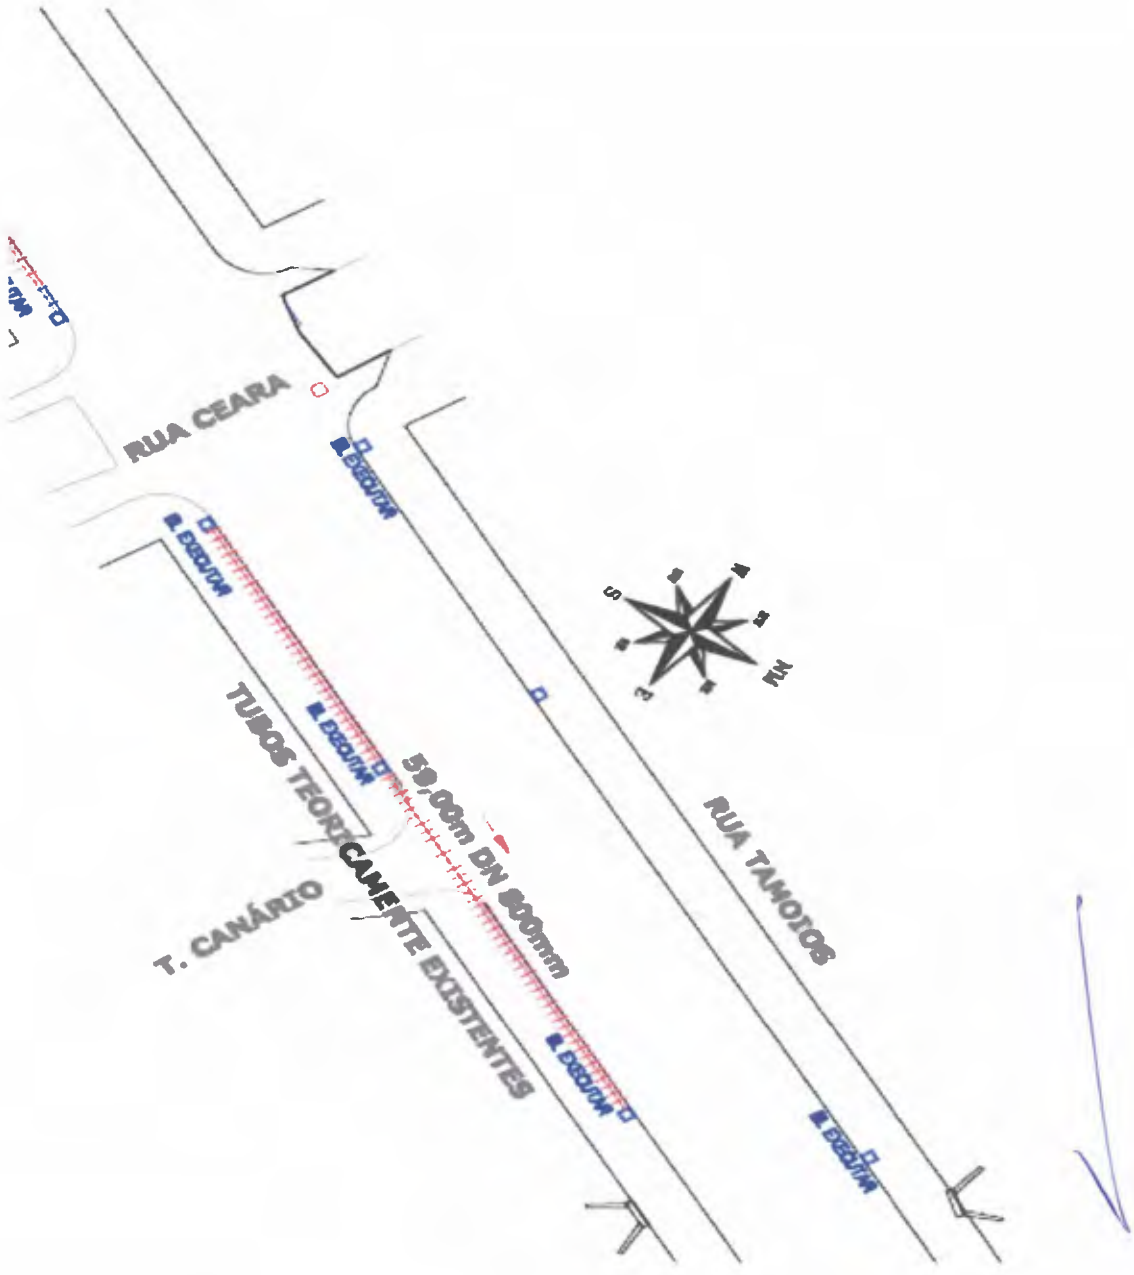

000826

CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS:

Cabe observar que na folha nº 0638 do PA (inclusive está encartado neste memorando) a Empresa Executora alega que o quantitativo é de 87,00 m de tubulação de DN 80 cm, entretanto na realidade, medindo no local é de 59,00 m.

1.3.1 Escavação Mecânica:

Volume = C(comprimento) x (largura) x P(profundidade)
Volume = 59,00 m x 0,50 m x 1,00 m
Volume = 29,50 m3

1.3.2 Aterro Compactado

A(Reaterro) = V1(volume escavação) – V2(volume dos tubos)
V2 = (0,60m x 0,60 m x 3,14)/4) x Comprimento
V2 = (0,60 m x 0,60 m x 3,14)/4 x 59,00 m
V2 = 16,67 m3
A = 29,50 m3 – 16,67 m3
A = 12,83 m3

Item 1.3.4 Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais diâmetro de 800 mm

DN 80 cm = 59,00 m

Ficando o cálculo dos valores resumidamente da seguinte forma abaixo,

Item	Código SINAPI	Descrição	Unidade	Quantidade	R$/unit sem BDI	BDI 26,85%	Desconto 0,31%	R$/unit com BDI	R$ total
1.3.1	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	29,50	4,27	1,15	0,17	5,25	154,83
1.3.2	94317	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	12,83	21,74	5,84	0,85	26,72	342,85
1.3.4	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	59,00	256,66	68,91	10,09	315,48	18.613,35
TOTAL									**19.111,03**

Minha Posição como Fiscal:

Na época do acontecido em 15 de março de 2019 eu também não era fiscal do contrato, porém ao contrário da situação 02, eu tive conhecimento de tal fato pelo relato verbal do responsável legal da Empresa Executora.

Os acontecimentos também da mesma maneira que dá outra situação, não teve autorização por escrito por parte do município.

Não existe nenhum relatório fotográfico das tubulações sendo executadas, ficando somente na palavra da empresa executora.

Diante disso deixo claro que o valor que teoricamente a empresa executora teria direito se provasse que realmente fez o serviço é de **R$ 19.111,03** (dezenove mil com cento e onze reais com três centavos.

RESUMO DOS VALORES DAS TRÊS SITUAÇÕES:

SITUAÇÃO 01	R$ 44.870,40
SITUAÇÃO 02	R$ 14.697,05
SITUAÇÃO 03	R$ 19.111,03
TOTAL PLEITEADO	R$ 78.678,48

000829

CONCLUSÃO:

Com relação a Situação 01, sou desfavorável ao pleito, uma vez que foi decidido em conjunto com a fiscalização da REGOV/CV para a devolução dos recursos não sendo medido e o mesmo modificou as bitolas sem autorização por parte do município.

Com relação a Situação 02 sou favorável ao pleito, mesmo não tendo autorização para execução dos serviços, pois a empresa executora solicitou por escrito uma providencia e foi relatado por mim a execução dos serviços e o município através da fiscalização não se pronunciou sobre o fato até o presente momento.

Com relação a Situação 03 sou desfavorável ao pleito pois não existe nenhuma prova de que realmente foi feito a não ser que a empresa prove de alguma maneira que foi executado, para aí sim eu ser favorável ao pleito.

Solicito a Comissão Permanente de Licitações que encaminhe essa Processo Licitatório, juntamente com esse memorando interno encartado, a Procuradoria Municipal de Capanema, a fim de que tome conhecimento sobre a matéria, para procedimentos administrativos e jurídicos que achar necessário no intuito de sanarmos as questões abordadas e finalizarmos o contrato administrativo em epigrafe uma vez que o contrato de repasse envolvendo o Município e o Ministério do Desenvolvimento Regional já foi feito.

Capanema, 29 de março de 2021

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 88.296/D

Município de Capanema - PR
Setor de Licitações

D E S P A C H O

Com relação ao Pregão Eletrônico Presencial, nº 12/2018, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. Encaminho esse PA ao Procurador Jurídico para **análise** e emissão de Parecer Jurídico a respeito da solicitação do Fiscal de Contrato.

Capanema, 30 de março de 2021

Jeandra Wilmsen
Setor de Licitações

050831

MANIFESTAÇÃO JURÍDICA

Tomada de Preços nº 12/2018

Senhora Presidente da CPL,

01. O PA foi encaminhado à PGM para análise do "Memorando Interno nº 10/2021", subscrito pelo Engenheiro Civil Municipal, Rubens Luís Rolando Souza, no qual relata em 03 situações a execução de serviços envolvendo a presente obra pública. Ao final, submete as conclusões e análise a este Órgão Jurídico. É o relatório.

02. Inicialmente, convém registrar que a situação exposta pelo Engenheiro Civil, no Memorando Interno nº 10/2021, não apresenta dúvida jurídica, mas sim situação intrínseca a fiscalização e execução contratual afeta a área de engenharia civil.

Sobre tal ponto, convém a Procuradoria contribuir que, via de regra, cabe ao Município proceder ao pagamento dos serviços efetivamente executados, desde que bem realizados e executados em conformidade com a planilha e memorial descritivo.

A situação 01 apresentada no Memorando Interno nº 10/2021, reproduzem caso em que houve serviço executado de forma diversa daquela licitada sem qualquer autorização dos agentes públicos municipais.

A situação 02 apresentada no Memorando Interno nº 10/2021, traz hipótese em que serviço foi executado em situação diferente, mas como medida necessária para atingir o escopo da obra, situação, inclusive, com comprovação de execução do fiscal do contrato. Já a situação 03, traz caso semelhante a situação 02, porém sem a comprovação que o serviço relatado efetivamente fora executado.

03. Pelo exposto, como dito alhures, não se apresenta dúvida jurídica no caso em questão, motivo pelo qual se mostra prescindível a manifestação da PGM nestas situações.

Não obstante, a PGM não se opõe ao acolhimento das sugestões apresentadas no Memorando Interno nº 10/2021, pois estão embasadas com cálculos e demonstração subscritos por profissional tecnicamente habilitado (Engenheiro Civil Municipal) e com competência administrativa (Fiscal do Contrato).

É o parecer.

Capanema, 01 de junho de 2021.

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Municipal

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Jurídico de
Capanema - PR
Dec. nº 6001/2015
OAB/PR 56.675

TERRAPLENAGEM COLUSSI

000832

SOLICITAÇAO DE REANÁLISE E PAGAMENTO

Capanema, 26 de agosto de 2021

Ao Excelentíssimo Senhor Américo Belle
Digníssimo Prefeito do Município de Capanema
Referente: Tomada de Preços n. 12/2018

1) INTRODUÇÃO

A. A. Colussi & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 84.840.503/0001-65, com sede à Rua Otavio Kischner, 1339, município de Capanema-PR, vem mui respeitosamente à presença de vossa Excelência expor e requerer o que segue.

Após a empresa ganhar o processo licitatório da Tomada de preços n. 12/2018, deu-se início aos trabalhos no trecho **(Figura 1)**, este compreendido na Rua Tamoios entre a Rua Rio Grande do Norte e Avenida Ataides Roberto Escher.



Figura 1: Localização da obra
Fonte: Autor, 2021

Contudo, durante a execução da obra ocorreram algumas divergências entre o projeto apresentado pela Prefeitura Municipal de Capanema e o que realmente estava presente in loco, sendo o autor responsável pelo desenho o Sr. Evandro C. Malinski.

Os três erros encontrados durante a execução serão elencados abaixo, conforme foram apresentados em um relatório e entregue em mãos ao Eng. Civil Rubens L. R. Souza no dia 15 de março de 2019, estando o referido relatório na página 638 do arquivo "TP 12/2018 Processo Licitatório na Integra", disponível no site da Prefeitura Municipal de Capanema na página da Tomada de Preços 12/2018 para acesso público.

a. Tubulação Entupida na Rua Tamoios

No trecho entre as Ruas Rio Grande do Norte e Rua Ceará, sentido estádio municipal no lado direito, consta em projeto uma tubulação existente **(Figura 2)** entretanto, durante a execução do trecho foi constatado que esta tubulação estava inutilizável, em vista do entupimento causado pelo solo local. Este ocorrido foi registrado pelo Eng. Civil Rubens L. R. Souza e entregue ao Secretário municipal de planejamento o Sr. Paulo F. L. Orso, através do Memorando Interno 04/2019 e protocolo n. 607/2019.

O trecho especificado acima possui uma extensão de 60m, conforme o Memorando Interno 04/2019 e medição realizada in-loco pelo Eng. Civil Rubens L. R. Souza, observa-se também que durante a execução da obra foi escrito sobre o projeto o texto "Entupido" sobre o trecho em questão. Devido a este trecho estar inutilizável, a empresa prontamente se dispôs a executar o trecho, com autorização verbal concedida pelo Sr. Paulo F. L. Orso e a fiscal do contrato, Sra. Katia Brunhera Gularte, com o objetivo de acelerar a obra e sanar futuros problemas que poderiam causar aos moradores e a nova rede.

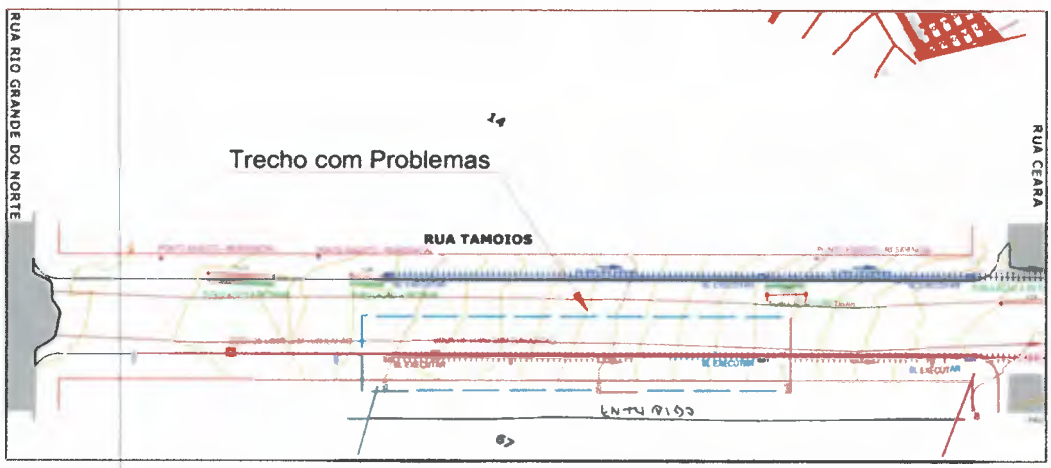


Figura 2: Trecho com problemas.
Fonte: Secretaria de Planejamento e Projetos, 2018

b. Tubulação Inexistente

No trecho entre a Rua Ceará e o Bueiro foi constatado que o projeto era incompatível com a obra, tendo em vista que no projeto consta o trecho apresentado abaixo com 60m de tubulação existente **(Figura 3)** quando na verdade não existia tubulação alguma no local.

Este problema não foi fotografado à época, pois a empresa com intuito de dar andamento a obra, prontamente executou a tubulação, após obter autorização verbal

concedida pelo Sr. Paulo F. L. Orso e a fiscal do contrato, Sra. Katia Brunhera Gularte. Este problema também foi apresentado em um relatório no dia 15 de marco de 2019 e entregue ao Eng. Civil Rubens L. R. Souza para dar as devidas providencias.

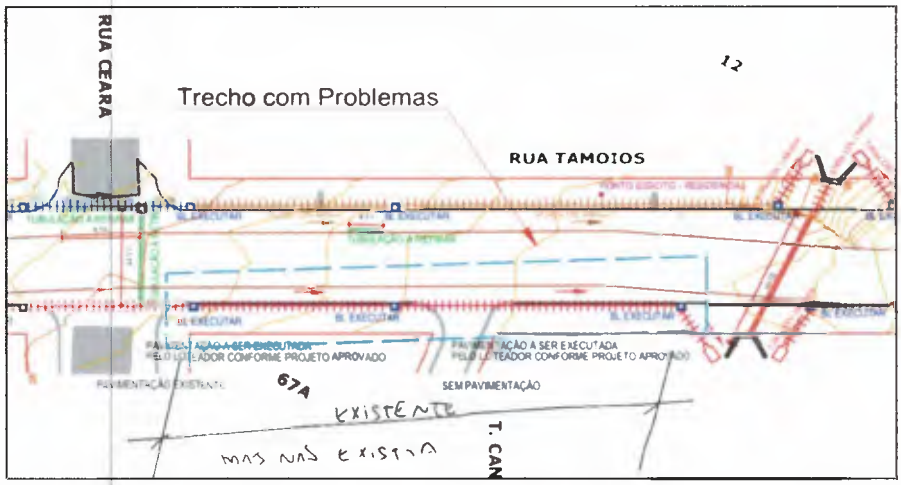


Figura 3: Trecho com tubulação inexistente.
Fonte: Secretaria de Planejamento e Projetos, 2018

c. Projeto Incompatível com a Legenda

Durante **a** execução do trecho entre a Rua Piauí e o bueiro, em ambos os lados foi observado **uma** inconsistência no projeto, onde na planta do projeto constava tubulação a executar com a cor da tubulação DN800 e texto informando DN600 conforme apresentado nas **Figuras 4 e 5**. Tal inconsistência acabou causando que 115m de tubulações DN600 fossem executadas, contudo estas deveriam ter sido executadas com DN800.

Esta inconsistência também não foi fotografada, porem estava presente junto com os itens "a" e "b" no relatório citado no item anterior.

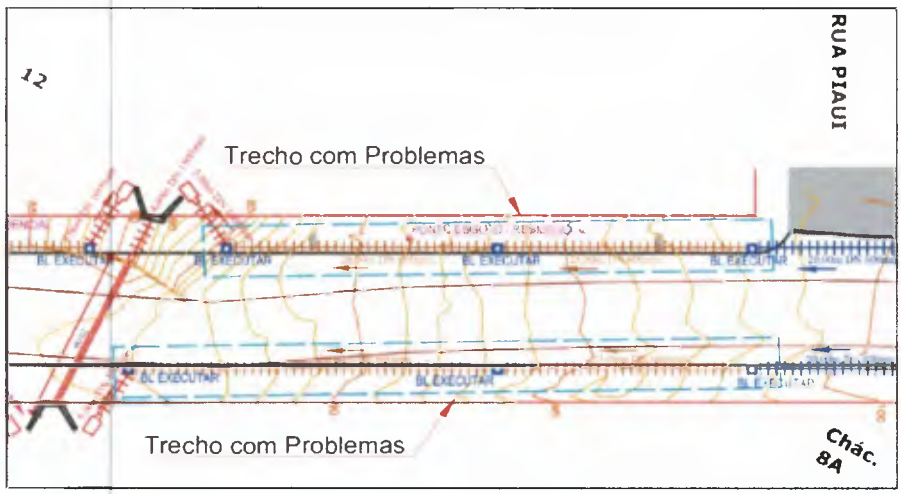


Figura 4: Trecho com projeto incompatível com a legenda.
Fonte: Secretaria de Planejamento e Projetos, 2018

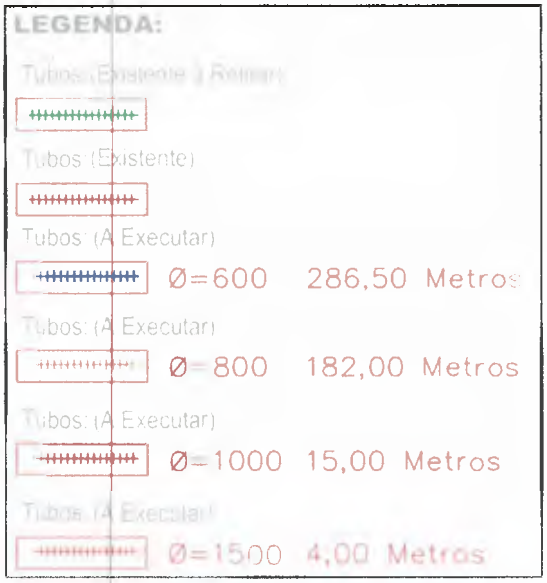


Figura 5: Legenda inconsistente com o projeto.
Fonte: Secretaria de Planejamento e Projetos, 2018

2) COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Conforme apresentado nos itens "b" e "c" a empresa quando descobriu a incompatibilidade do projeto com a obra não fotografou o local, somente apresentou um relatório ao **Eng**. Civil Rubens L. R. Souza no dia 15 de marco de 2019 e deu seguimento a obra, tendo isso em vista, para a comprovação de fornecimento do material e serviços prestados, a empresa A. A. Colussi & CIA LTDA optou por apresentar declaração dos moradores lindeiros a obra executada **(Anexos 1, 2 e 3)**.



Figura 6: Localização dos moradores lindeiros.
Fonte: Autor, 2021.

3) SERVIÇOS PRESTADOS E VALORES A RECEBER

Após leitura das declarações dos moradores lindeiros, fica comprovado que a empresa A. A. Colussi & CIA LTDA executou os serviços descritos acima, portanto pedimos encarecidamente o pagamento dos respectivos valores. Abaixo serão relacionados os erros "a" até "c" conforme dispostos anteriormente e com seus respectivos valores, estes retirados do Memorando Interno 10/2021 e presentes no arquivo "TP 12/2018 Processo Licitatório na Integra".

Os valores propostos para o fornecimento de materiais e serviços foram levantados pelo Eng. Civil Rubens L. R. Souza e serão mantidos sem alteração, tendo em vista que este realizou as medições in loco e a empresa concorda plenamente com os valores apresentados.

a. Tubulação Entupida na Rua Tamoios

Este item é apresentado na página 816 do arquivo "TP 12/2018 Processo Licitatório na Integra" com o título "Situação 02", sendo apresentado abaixo os valores propostos pelos serviços e materiais fornecidos.

Tabela 1 – Composição da Instalação de Tubos DN800mm sem fornecimento de tubos

CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	R$ UNITÁRIO	R$ TOTAL
EQUIPAMENTOS					
5631	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80M³, PESO OPERACIONAL 17TON, POTENCIA BRUTA 111HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,11	R$ 143,50	R$ 15,07
5632	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80M³, PESO OPERACIONAL 17TON, POTENCIA BRUTA 111HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,22	R$ 60,84	R$ 13,45
SUBTOTAL					**R$ 28,51**
MÃO DE OBRA					
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,49	R$ 20,78	R$ 10,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,99	R$ 17,52	R$ 17,27
SUBTOTAL					**R$ 27,52**
MATERIAIS					
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	M³	0,01	R$ 479,49	R$ 2,40
SUBTOTAL					**R$ 2,40**

Fonte: Rubens L. R. Souza, **TP 12/2018 Processo Licitatório na Integra**, 2021. p. 822.

Tabela 2 – Somatório da composição da Instalação de Tubos DN800mm sem fornecimento de tubos

EQUIPAMENTOS	R$ 28,51
MAO DE OBRA	R$ 27,52
MATERIAIS	R$ 2,40
TOTAL DA COMPOSICAO	**R$ 58,43/m**

Fonte: Rubens L. R. Souza, **TP 12/2018 Processo Licitatório na Integra**, 2021. p. 822.

Tabela 3 – Relação de serviços prestados e materiais fornecidos

ITEM	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	R$ UNITÁRIO (SEM BDI)	BDI 26,85%	Desconto 0,31%	R$ UNITÁRIO (COM BDI)	R$ TOTAL
1.3.1	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M³	44,00	R$ 4,27	R$ 1,15	R$ 0,17	R$ 5,25	R$ 230,94
1.3.2	94317	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE D CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016-	M³	19,13	R$ 21,74	R$ 5,84	R$ 0,85	R$ 26,72	R$ 511,20
1.3.3	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LDCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	58,00	R$ 165,52	R$ 44,44	R$ 6,51	R$ 203,45	R$ 11.800,29
	COMP.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - SEM FORNECIMENTO DO TUBO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	30,00	R$ 58,43	R$ 15,69	R$ 2,30	R$ 71,82	R$ 2.154,62
TOTAL									R$ 14.697,05

Fonte: Rubens L. R. Souza, **TP 12/2018 Processo Licitatório na Integra**, 2021. p. 823.

b. Tubulação Inexistente

O segundo item é apresentado na página 824 do arquivo "TP 12/2018 Processo Licitatório na Integra" com o título "Situação 03", sendo apresentado abaixo os valores propostos pelos serviços e materiais fornecidos.

Tabela 4 – Relação de serviços prestados e materiais fornecidos

ITEM	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	R$ UNITÁRIO (SEM BDI)	BDI 26,85%	Desconto 0,31%	R$ UNITÁRIO (COM BDI)	R$ TOTAL
1.3.1	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M³	29,50	R$ 4,27	R$ 1,15	R$ 0,17	R$ 5,25	R$ 154,83
1.3.2	94317	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016-	M³	12,83	R$ 21,74	R$ 5,84	R$ 0,85	R$ 26,72	R$ 342,85
1.3.4	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 8 00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	59,00	R$ 256,66	R$ 68,91	R$ 10,09	R$ 315,48	R$ 18.613,35
TOTAL									R$ 19.111,03

Fonte: Rubens L. R. Souza, **TP 12/2018 Processo Licitatório na Integra**, 2021. p. 827.

c. Tubulação Inexistente

Para finalizar, o último item é apresentado na página 814 do arquivo "TP 12/2018 Processo Licitatório na Integra" com o título "Situação 01", sendo apresentado abaixo os valores propostos pelos serviços e materiais fornecidos.

Tabela 5 – Relação de serviços prestados e materiais fornecidos

ITEM	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	R$ UNITÁRIO (SEM BDI)	BDI 26,85%	Desconto 0,31%	R$ UNITÁRIO (COM BDI)	R$ TOTAL
1.3.3	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	112,00	R$ 165,52	R$ 44,44	R$ 6,51	R$ 203,45	R$ 22.786,77
1.3.4	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 8 00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	70,00	R$ 256,66	R$ 68,91	R$ 10,09	R$ 315,48	R$ 22.083,63
TOTAL									R$ 44.870,40

Fonte: Rubens L. R. Souza, **TP 12/2018 Processo Licitatório na Integra**, 2021. p. 815.

4) CONCLUSÃO

Com o exposto acima tem-se clareza de que a empresa A. A. Colussi & CIA LTDA executou os serviços, possuindo assim o direito de receber os devidos valores. O total a receber pode ser obtido somando os valores apresentados no item n. 3, que totalizam **R$ 78.678,48** (Setenta e oito mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

A empresa se coloca à disposição para tirar quaisquer dúvidas que possam surgir no decorrer deste processo.

Atenciosamente,

Aldo Alfredo Colussi
Sócio Proprietário

Sascha Ian Manica Colussi
Eng. Civil – CREA 184.665-D / PR

TERRAPLENAGEM COLUSSI

000839

TERMO DE DECLARAÇÃO - 1

Por meio do presente, eu, Teresa de Lurdes Wolf, brasileira, estado civil ignorado, inscrita no CPF/MF sob o nº 062.851.289-95, declaro que resido na Rua Tamoios, nº 1545, bairro São Cristóvão, em Capanema/PR, e que por volta dos meses de novembro/18 a julho/19 testemunhei funcionários da empresa A. A. Colussi & CIA LTDA realizando obras de pavimentação poliédrica, pavimentação de calcadas e rede de drenagem pluvial perto da minha casa, especificamente a instalação de tubos em concreto para a rede de drenagem.

Declaro, ainda, que após a conclusão dessa obra eu e os demais moradores não tivemos nenhum problema relacionado às referidas tubulações, sendo que os serviços foram prestados de maneira satisfatória, sem transtornos.

Por fim, estou ciente de que estarei sujeito às penas da lei caso sejam inverídicas as informações prestadas.

E por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Capanema - PR, 30 de agosto de 2021.

Teresa de Lurdes Wolf

Teresa de Lurdes Wolf
CPF: 062.851.289-95

TERRAPLENAGEM COLUSSI

TERMO DE DECLARAÇÃO - 2

060840

Por meio do presente, eu, Soeli Maria Pilatti Pedron, brasileira, estado civil ignorado, inscrita no CPF/MF sob o nº 086.267.199-06, declaro que resido na Rua Tamoios, nº 2555, bairro São Cristóvão, em Capanema/PR, e que por volta dos meses de novembro/18 a julho/19 testemunhei funcionários da empresa A. A. Colussi & CIA LTDA realizando obras de pavimentação poliédrica, pavimentação de calcadas e rede de drenagem pluvial perto da minha casa, especificamente a instalação de tubos em concreto para a rede de drenagem.

Declaro, ainda, que após a conclusão dessa obra eu e os demais moradores não tivemos nenhum problema relacionado às referidas tubulações, sendo que os serviços foram prestados de maneira satisfatória, sem transtornos.

Por fim, estou ciente de que estarei sujeito às penas da lei caso sejam inverídicas as informações prestadas.

E por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Capanema - PR, 30 de agosto de 2021.

Soeli Maria Pilatti Pedron
CPF: 086.267.199-06

TERRAPLENAGEM COLUSSI

040841

TERMO DE DECLARAÇÃO - 3

Por meio do presente, eu, Valmor Piovesan, brasileiro, estado civil ignorado, inscrito no CPF/MF sob o nº 275.886.648-00, declaro que sou proprietário da residência situada na Rua Tamoios, nº 2544, bairro São Cristóvão e residente em Rua Tupinambas, nº 1013, Centro em Capanema/PR, e que por volta dos meses de novembro/18 a julho/19 testemunhei funcionários da empresa A. A. Colussi & CIA LTDA realizando obras de pavimentação poliédrica, pavimentação de calcadas e rede de drenagem pluvial perto da minha casa, especificamente a instalação de tubos em concreto para a rede de drenagem.

Declaro, ainda, que após a conclusão dessa obra eu e os demais moradores não tivemos nenhum problema relacionado às referidas tubulações, sendo que os serviços foram prestados de maneira satisfatória, sem transtornos.

Por fim, estou ciente de que estarei sujeito às penas da lei caso sejam inverídicas as informações prestadas.

E por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Capanema - PR, 30 de agosto de 2021.

Valmor Piovesan
CPF: 275.886.648-00

KAFER
ADVOGADOS ASSOCIADOS

00842

PARECER JURÍDICO Nº 025/2021

1. OBJETO

Trata-se de proposta de consulta formulada pela empresa **A.A COLUSSI & CIA LTDA. – ME** (CNPJ/MF nº 84.840.503/0001-65), acerca da possibilidade de pleitear junto à Prefeitura Municipal de Capanema/PR valores dispendidos para execução de serviços de engenharia não previstos especificamente no contrato administrativo originário, mas que foram autorizados verbalmente pela Administração durante a execução do objeto.

2. CONTEXTO

Em 31 de agosto de 2018, a Consulente firmou com o Município de Capanema/PR o Contrato Administrativo nº 329/2018, cujo objeto era a execução de pavimentação poliédrica com pedras irregulares, drenagem pluvial e terraplenagem na Rua Tamoios entre a Rua Rio Grande do Norte e Avenida Ataides Roberto Escher, na zona urbana do município, com preço global contratado de R$ 385.806,65.

De acordo com o relato da Consulente, uma vez iniciada a execução do objeto, passou a surgir a necessidade de realização de serviços não especificados no projeto inicial – serviços sem os quais se tornaria impossível a consecução do objeto principal.

Ato contínuo, a Consulente teria protocolado documentos explicando a situação e solicitado autorização verbal para realização dos serviços extraordinários, ao que servidores da administração municipal teriam dado confirmação.

Uma vez prestados os serviços e concluída a obra, os serviços extraordinários foram decotados da medição final, inexistindo o respectivo pagamento.

Desde então, a Consulente relata ter apresentado diversas solicitações de pagamento ao ente municipal, sem sucesso até o momento.

Capanema/PR
Avenida Brasil nº 708, Sala nº 06
Caixa Postal nº 60

contatos.kafer.adv.br
www.kafer.adv.br
(46) 9 9975-0152
CNPJ 43.134.044/0001-24

3. ANÁLISE

Como se vê, a controvérsia colocada em xeque se resume a saber se há possibilidade jurídica de cobrar da Administração Pública valores referentes à serviços prestados em favor desta, sem que tenha havido previsão expressa em contrato administrativo em documento equivalente.

A resposta me é positiva.

De acordo com o art. 60, p. ún., da Lei n. 8.666/93, a Administração Pública direta e indireta, via de regra, está proibida de efetuar contratos verbais.

Ocorre que, também via de regra, a declaração de nulidade do contrato administrativo tem eficácia ex tunc, o que impede a irradiação dos efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos (art. 59, caput, da Lei 8.666/1993).

Sem embargo, o parágrafo único do art. 59 da Lei 8.666/1993 contempla exceção, no sentido de que *"a nulidade não exonera a Administração do* ***dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado*** *até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa"*.

Com fundamento nessa norma e nos princípios da boa-fé objetiva e da vedação do enriquecimento sem causa, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que, mesmo em caso de nulidade do contrato administrativo, o ente público é obrigado a efetuar o pagamento pelos serviços prestados e pelos prejuízos aos quais deu causa, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade, quando o particular somente tem direito ao ressarcimento pela vantagem auferida pela Administração.

Se o Poder Público, embora obrigado a contratar formalmente, opta por não fazê-lo, não poderia, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, porque isso configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico por conta do prestígio da boa-fé objetiva (orientadora também da Administração Pública).

Por isso, na ausência de contrato formal entre as partes - e, portanto, de ato jurídico perfeito que preservaria a aplicação da lei à celebração do instrumento -, deve prevalecer o princípio do não enriquecimento ilícito.

Na esteira da doutrina de Celso Bandeira de Mello, é possível extrair que, estando de boa-fé o prestador de serviço, este deve ser:

a) indenizado, "nos termos do contrato" (ainda que verbal), pelas prestações que realizou, ou seja, deve receber o que foi convencionado pelos serviços prestados até a data da invalidação do contrato;
b) ressarcido pelas despesas em que teve que incorrer por força do contrato viciado; e
c) indenizado pelos prejuízos indiretos, ou seja, os proveitos que deixou de captar em outra relação jurídica, por força da vinculação contratual.

Se estiver de má-fé, ou em conluio com a Administração, terá direito, apenas, ao exato valor, a ser pericialmente apurado, correspondente à vantagem auferida pela Administração, ainda que o dispêndio do contratado haja sido maior. Nesse caso, não faz jus a qualquer lucro ou remuneração por aquilo que empreendeu, nem será resguardado dos prejuízos indiretos.

Para demonstrar a pacificação do tema no Superior Tribunal de Justiça, cito o seguinte precedente, que remete a outros tomados pela corte superior:

> PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SEM LICITAÇÃO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
>
> **Embora a Administração Pública esteja proibida de celebrar contratos verbais, excetuadas as hipóteses da Lei 8.666/93, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal circunstância não desonera o Poder Público de efetuar o pagamento de serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.** Nesse sentido: STJ, REsp 1.111.083/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2013.
>
> (STJ, AgRg no AREsp 423.717/PI, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015)

Este também é o entendimento pacífico do Tribunal de Justiça do Paraná:

> AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VERBAL COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - NEGATIVA DE PAGAMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A ENTREGA DO OBJETO CONTRATADO - PRINCÍPIO DA BOA FÉ DO PARTICULAR - APLICAÇÃO DA LEGALIDADE AMPLA - APELO CONHECIDO E PROVIDO.
>
> A aplicação da Lei nº 8429/92 deve ocorrer à luz do princípio da razoabilidade, de modo a evitar sanções desarrazoadas em relação ao terceiro de boa-fé que contrata com a Administração Pública, quando esta age de forma irregular. No caso, não foi observada

> a previsão trazida pelo art. 62, da Lei 8.666/93. **O contrato verbal firmado entre o Poder Público e o particular não poderá ser causa de justificativa para a falta de pagamento**, ainda que, sob fundamento de se estar aplicando o princípio da legalidade estrita. Tal princípio deve incidir, não para negar proteção ao direito do particular, mas sim, no sentido de **responsabilizar a Administração pelo pagamento comprovadamente devido**, de acordo com a interpretação ampla deste princípio constitucional.
>
> (TJ-PR - AC: 3965906 PR 0396590-6, Relator: Anny Mary Kuss, Data de Julgamento: 20/11/2007, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7507)

Nesse caminho de ideias, o relato da Consulente e os documentos apresentados parecem dar adequado grau de certeza que: **1.** Os serviços extraordinários foram efetivamente prestados; **2.** A empresa informou, por mais de uma vez, de forma escrita e verbal, a respeito da imprescindibilidade de tais serviços para continuação da execução do objeto principal; **3.** Inexistem indícios de que a Consulente tenha contribuído para o aparecimento da necessidade de prestação de outros serviços, ou de que tenha agido em qualquer momento de má-fé.

A última manifestação do Fiscal do Contrato, Memorando Interno nº 10/2021, juntado às fls. 811 e seguintes do P.A, traz parcial concordância de seu subscritor quanto ao pleito de pagamento formulado pela empresa.

No documento, os pleitos foram fracionados em três "situações" diferentes. Houve pleito favorável para pagamento do serviço executado quanto à "**situação 2**".

Quanto à "**situação 3**", o parecer desfavorável se escorou na ausência de provas da prestação do serviço. Nesse particular, considerando a natureza do serviço prestado (instalação de tubulação subterrânea), a impedir a comprovação atual dos serviços prestados sem que seja necessária escavação invasiva e onerosa, recomenda-se a **colheita de termos de declaração de eventuais testemunhas** que presenciaram a realização dos serviços à época.

Quanto à "**situação 1**", houve manifestação desfavorável, já que o Fiscal imputa à empresa a responsabilidade pela instalação de tubos com bitolas maiores do que o supostamente previsto no projeto originário.

Neste ponto, conforme relato repassado pela empresa Consulente, referido projeto originário possuía informações divergentes quanto a bitola correta a ser utilizada. As imagens do projeto traziam a inserção "*DN 800mm*", ao passo que a legenda do projeto previu "*DN 600mm*".

Salvo melhor juízo, inexiste previsão legal que estabeleça hierarquia ou predominância entre a legenda de um projeto de engenharia e a sua representação visual.

A responsabilidade na elaboração do projeto básico a ser executado em um contrato administrativo recai inteiramente sob os ombros do ente público contratante. A inserção de informação divergente em documento público é, na melhor das hipóteses, conduta que atenta contra o princípio administrativo da eficiência e, na pior das hipóteses, equívoco que pode comprometer a integridade e segurança do serviço a ser executado.

Independente de tudo isso, em atenção ao retrocitado princípio da vedação do enriquecimento ilícito, não é admissível que a Administração Pública se beneficie da própria torpeza e goze de serviço prestado por particular sem repassar a devida contraprestação.

Desse modo, entendo como juridicamente possível o pagamento do serviço nos moldes em que executado ou, ao menos, a realização de cálculo para apurar o que seria ordinariamente devido à empresa na hipótese da utilização da tubulação DN 600mm, procedendo o pagamento.

4. Conclusão

Do exposto, opina-se no sentido da possibilidade de cobrança administrativa ou judicial dos serviços extraordinários prestados com anuência (ainda que verbal) da Administração no bojo do Contrato nº 329/2018.

Capanema/PR, 23 de agosto de 2021.

Gabriel F. Käfer
OAB/PR 97.780

DESPACHO

Com relação à Tomada de Preços, nº 12/2018, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. Encaminho esse PA ao Fiscal de Contrato para análise a respeito da solicitação.

Capanema, nove dias de setembro de 2021

Amanda Machado
Setor de Licitações

A 0848

PARECER TÉCNICO Nº 38/2021

Com relação ao contrato administrativo nº 329/2018 cujo objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO NORTE E AVENIDA ATAÍDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA-PR EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 856605/2017 OPERAÇÃO 10441530-91 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO**, origem do certame licitatório Tomada de preços nº 12/2018, na qual sagrou se vencedora a Empresa AA Colussi & Cia Ltda, na qual a empresa executora solicita uma nova reanálise e pagamento segue as seguintes constatações.

Após a reanálise do novo pedido dos seus pleitos (por parte da empresa executora) e em consonância ao memorando interno nº 10/2021 folhas nº 0811 a 0829 do PA, encaminhado ao Senhor Procurador Municipal Romant Ezer Barbosa, faço os seguintes esclarecimentos no ponto de vista técnico a seguir.

No material constante no memorando interno supracitado por questões didáticas separei em três situações para melhor entendimento.

SITUAÇÃO 01:

Empresa:

A empresa executou 70,00 m de tubulação de DN 80 cm e 112,00 m de tubulação de DN 60 cm (conforme folha nº 0806 do PA). Com isso a mesma solicita que se proceda a medição de tais serviços e consequentemente pague por eles.

Na minha avaliação o material enviado neste momento com as suas justificativas fundamentadas mudou nada o cenário, ou seja, a empresa executou com bitolas diferentes do projeto básico sem a devida autorização formal por parte do fiscal do contrato da época, entretanto com a nova fundamentação ficou comprovada que existiu uma inconsistência no projeto de Drenagem Pluvial prancha 01/03 folha nº 069 do PA.

O desenvolvimento do projeto foi do servidor Evandro Malinski, o qual se equivocou na edição do desenho, trazendo como consequência uma incompatibilidade da legenda com o projeto, onde na planta constava tubulação a executar com cor de tubulação DN 800 mm e o texto informado era de DN 600mm, causando tal celeuma.

O responsável pelo projeto sou eu como engenheiro responsável técnico e passou por mim desapercebido bem como o engenheiro responsável pela fiscalização da caixa Econômica Federal, todavia com a nova fundamentação exposta pelo requerente comprova o erro.

Na época em que aconteceu a execução das referidas tubulações não era eu o fiscal do contrato, a empresa deveria dar ciência ao fiscal da epoca a fim de que tomasse as devidas providencias para que se procedesse um as buidl e formalizasse a situação.

Quando observei as tubulações com DN 600mm solicitei a empresa executora que não retirasse os tubos e sim alargasse as bocas de lobo e assim a mesma o fez. Com isso o Micro Sistema de Drenagem Pluvial da Bacia de Contribuição de Águas da rua Tamoios funciona em maneira plena sem nenhum problema de alagamentos.

Desta feita, diante tal situação me manifesto em favor de que se proceda o pagamento dos valores calculados da diferença das bitolas executadas conforme folha nº 0815 do PA que é de R$ 44.870,40.

SITUAÇÃO 02

Empresa:

A empresa alega que no trecho entre as ruas Rio Grande do Norte e Ceará, onde explicita no projeto tubulações existentes com DN 60 cm no lado direito estavam enterrados, sem condições de uso, conforme Relatório encartado no PA na folha nº 0638. Com isso a empresa executou o serviço para não parar a obra e está cobrando do Municipio.

Na minha avaliação eu continuo dando anuência para que seja paga tal pleito uma vez que foi explicitado no memorando interno supracitado o valor de R$ 14.697,05.

SITUAÇÃO 03:

Empresa:

De maneira análoga a situação 02 o empreiteiro alega que na rua Tamoios entre as ruas Ceará e Bueirão a tubulação que originalmente no projeto Básico constava como DN 80 cm existente, não existe, portanto só previa no orçamento a execução das bocas de lobo.

Com isso a Empresa Executora segunda a sua versão, executou os serviços para a obra não paralisar.

Na ocasião em que relatei os fatos, deixei claro que não havia nenhuma prova documental de que a empresa teria executado tais serviços, porém neste momento a empresa apresentou nas folhas nº 0839, 0840 e 0841 do PA , declarações dos seguintes moradores da rua Tamoios os senhores Valmor Piovesan CPF nº 275.886.648-00, a senhora Teresa de Lurdes Wolf CPF nº 062.851.289-95 e a senhora Soeli Maria Pilati Pedron CPF 086.267.199-06 contendo afirmações da execução dos serviços pleiteados pela empresa.

Na minha opinião as declarações dos proprietários das edificações não possuem lastro comprobatório para o pleito e além do mais, caso nos fossemos fazer uma sondagem no local, que é desnecessário pois os tubos existem, acharíamos as tubulações já gastas pelo tempo e como teríamos certeza que os tubos já existiam lá antes ou foram assentados pela empresa.

Talvez se a empresa apresentasse as notas fiscais de compra dos tubos com aquela tubulação sendo entregue no endereço da obra e na quantidade assentada e principalmente na época do acontecido.

O valor pleiteado é de R$ 19.111,03.

É O PARECER:

Me manifesto pelo pagamento das **situações 01 e 02**, já a 03 falta provas para o solicitado, desta forma solicito a Comissão Permanente de Licitações que encaminhe tal PA para a Procuradoria Municipal para emissão de parecer final.

Capanema, 05 de outubro de 2.021

Rubens Luis Rolando Souza
Eng. Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1043-1
CREA-RS 88296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

D E S P A C H O

Com relação a Tomada de Preços, nº 12/2018, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. Encaminho esse PA ao Procurador Jurídico para análise e emissão de Parecer Jurídico a respeito do Parecer Técnico

Capanema, 05 de outubro de 2021

Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Setor de Licitações

00853

MANIFESTAÇÃO JURÍDICA

Tomada de Preços nº 12/2018

Senhora Presidente da CPL,

01. O PA foi encaminhado à PGM para exame da "Solicitação de Reanálise e pagamento" apresentada pela empresa A. A. Colussi & Cia Ltda., no qual pormenoriza a execução da obra, discorrendo sobre tubulação entupida na rua Tamoios entre a ruas Rio Grande do Norte e Ceará; tubulação inexistentes na rua Tamoios entre rua Ceará e Bueiro"; projeto incompatível com a legenda no trecho da Rua Tamoios entre a rua Piauí e o Bueiro. Ao final, o Requerente sustenta que os serviços reclamados foram efetivamente prestados, pugnado pelo seu pagamento no valor de R$ 76.678,48.

Através do Parecer Técnico nº 38/2021, o Engenheiro Civil Municipal, manifestou-se favorável ao pagamento do valor de R$ 59.567,45, relativos as situações "01" e "02" descritas no citado parecer técnico, colocando-se a disposição para nova apreciação da situação descrita como "03", mediante a complementação probatória.

É o relatório.

02. Como manifestado na manifestação de fl. 831, convém registrar que a situação exposta pelo Engenheiro Civil, no Memorando Interno nº 10/2021, não apresenta dúvida jurídica, mas sim situação intrínseca a fiscalização e execução contratual afeta a área de engenharia civil.

Sobre tal ponto, convém a Procuradoria contribuir que, via de regra, cabe ao Município proceder ao pagamento dos serviços efetivamente executados, desde que bem realizados e executados em conformidade com a planilha e memorial descritivo.

03. Nesse sentido, a PGM não se opõe ao acolhimento das sugestões apresentadas pelo Engenheiro Civil Municipal, no Parecer Técnico nº 38.2021, possibilitando o pagamento do valor de R$ 59.567,45 por meio de procedimento de indenização administrativa, pois estão embasadas com cálculos e demonstração subscritos por profissional tecnicamente habilitado (Engenheiro Civil Municipal) e com competência administrativa (Fiscal do Contrato).

É o parecer.

Capanema, 10 de dezembro de 2021.

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Municipal

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Jurídico de
Capanema - PR
Dec. nº 6001/2015
OAB/PR 56.675

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br 00085

De: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: sexta-feira, 10 de dezembro de 2021 14:11
Para: GUILHERME (planejamento.alexandre@capanema.pr.gov.br)
Assunto: NOTIFICICAÇÃO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2018
Anexos: MANIFESTAÇÃO JURÍDICA 10-12-2021.pdf

BOA TARDE
PARA VOSSO CONHECIMENTO.

Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Setor de Licitações
Município de Capanema-PR
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080
Capanema – PR cep 85760-000
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549
roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
licitacao@capanema.pr.gov.br

Recebido para o Governo dia 10/12/2021
